

# Estado de México

## Atizapán-Atlacomulco



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Descripción	
1	Entronque Chiluca 15.00%, sin actividad, falta de recursos
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 53.20%
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 53.32%
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 38.58%
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00 95.00%
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 46.35%
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 34.62%
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00 95.00%
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 25.59%,
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 00.22%, sin actividad, problemas sociales
11	Viaducto El Llano km 51+016.00 00.90%, sin actividad, problemas sociales
12	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 03.80%, sin actividad, problemas sociales
13	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
14	Viaducto El Pescado km 75+482.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
15	Viaducto El Salto km 91+874.00 16.80%, sin actividad, problemas sociales
16	Entronque Atlacomulco

Simbología	
	Por construir
	En proceso de modernización
	Modernizado



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**

- Inversión:** 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)
- Meta:** 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG

- Inicio:** 01 marzo 2016  
**Término:** 30 junio 2027
- Avance físico:**
  - Programado: 82.50%
  - Real: 43.26%
  - Financiero: 23.95%
  - Semanal: 00.20%


- 29,598 empleos generados (9,866 empleos directos y 9,732 empleos indirectos)
- 1 millón 244 mil** habitantes beneficiados
- 60 minutos** de ahorro en tiempo

# Estado de México

## Atizapán-Atlacomulco

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	10/10/25 al 16/10/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	186	158	2	0.72	• La mano de obra se aumentó y se han alcanzado las expectativas correspondientes.
Zapatas	86	41	45	1	0.53	
Columnas	96	19	77	1	0.44	
Cabezales	76	8	68	1	0.66	
Caballetes	24	4	20	1	0.54	
Trabes de concreto	395	0	395	0	0	
Trabes metálicas	29	0	29	1.0	0.82	

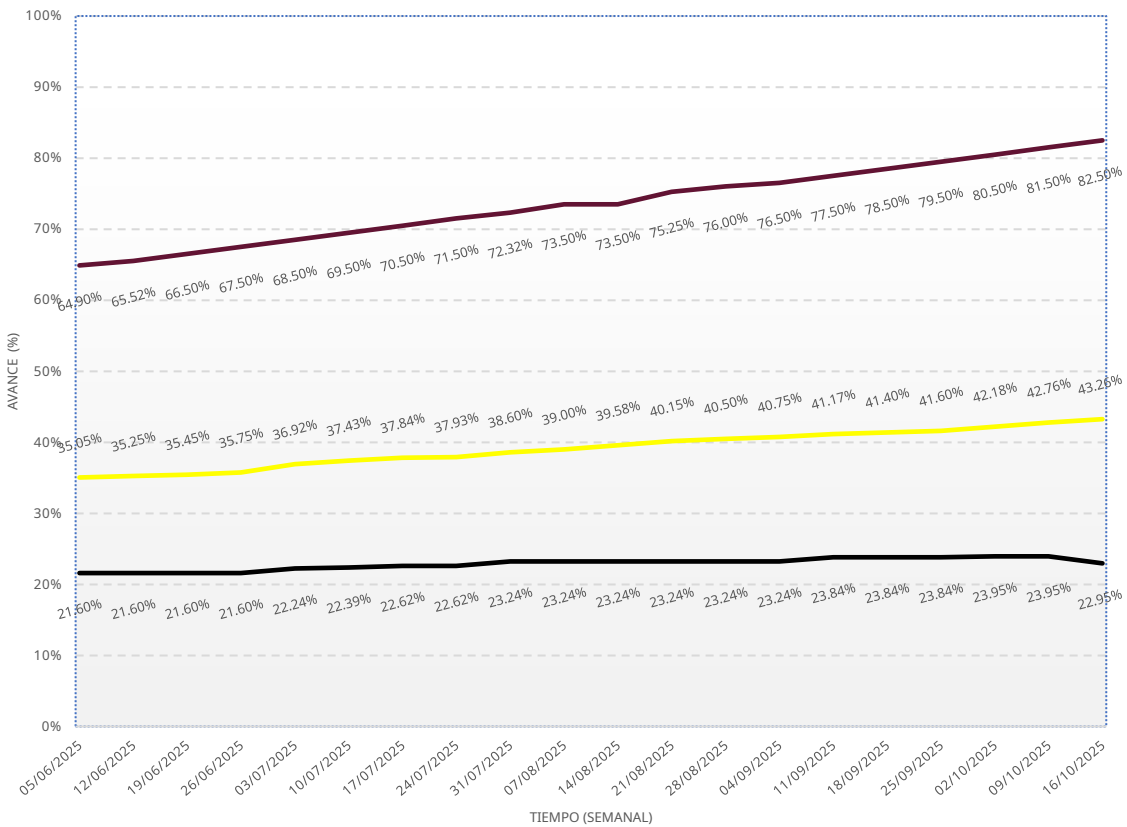

	03 de octubre al 09 de octubre	10 de octubre al 16 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	1,892	1,871
Maquinaria	495	497



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena
