


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance físico

- Programado: 87.12%
- Semanal: 2.80 %
- Real: 27.54 %
- Financiero: 20.79%

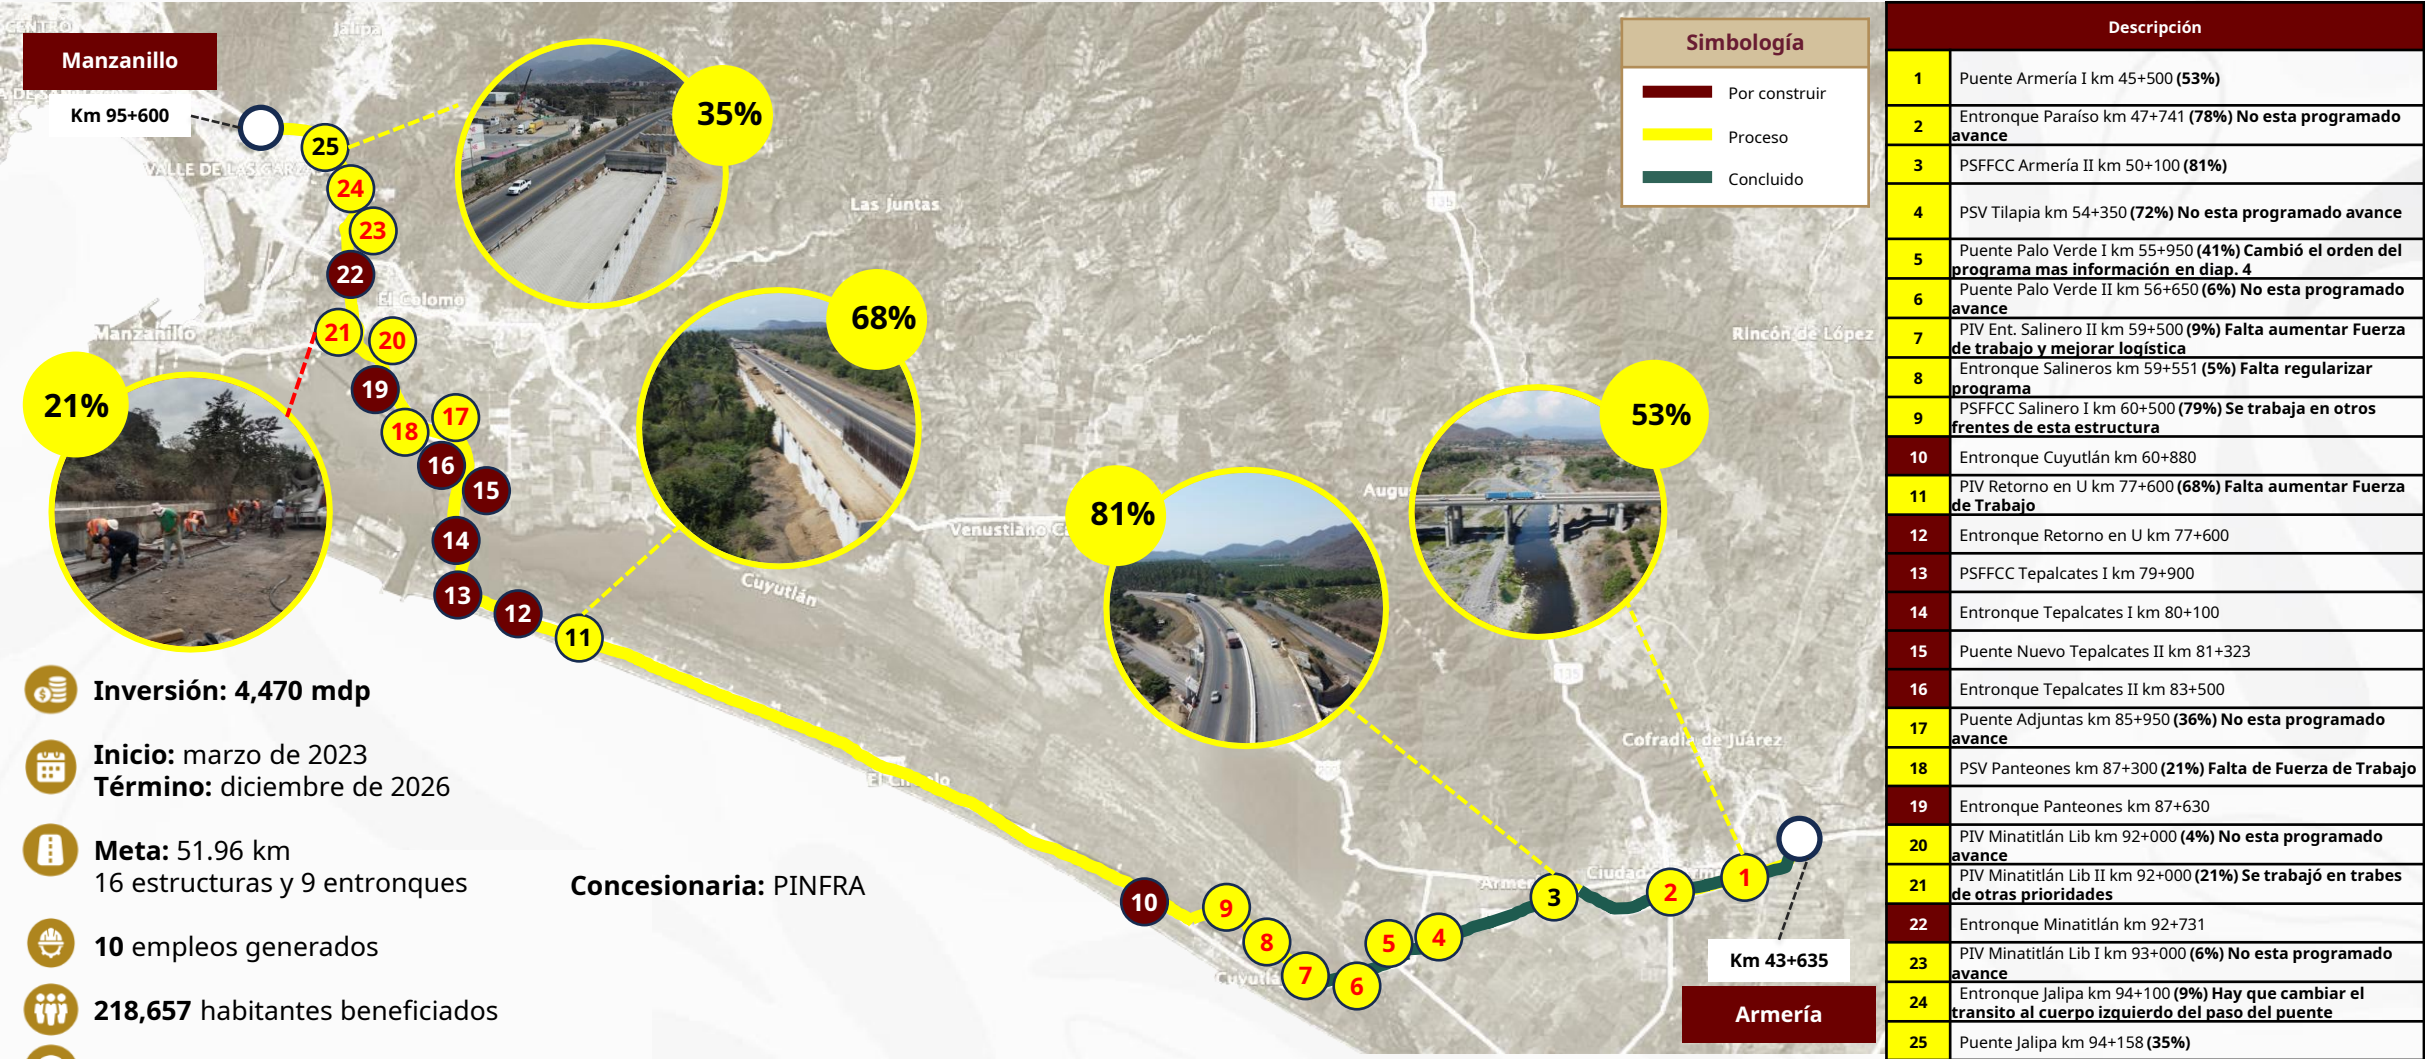


NOTA: La fecha de término se obtuvo de un programa provisional entregado por concesionaria. En proceso de regularizar.

Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	01/08/25 al 7/08/25		Observaciones
		acumulado		Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	257,991	0	0	3,845	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	484,392	329,517	0	108	
Base y sub base (m³)	260,119	130,000	130,119	0	574	

*Nota: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente

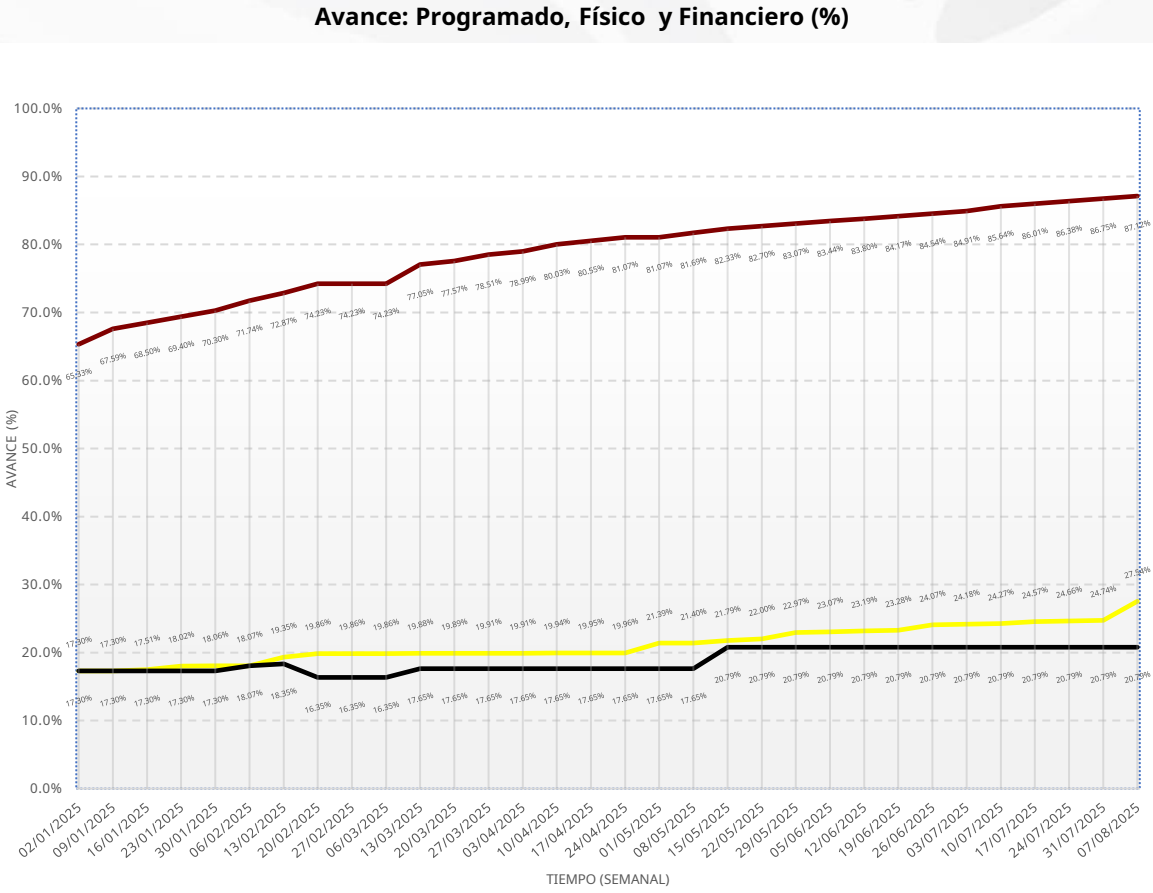

	Avance Programado	Avance Físico	Avance Financiero
	25 de julio al 31 de julio		01 de agosto al 07 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	193		180
Maquinaria	81		75

