


Nayarit

Tramo Tepic-Compostela



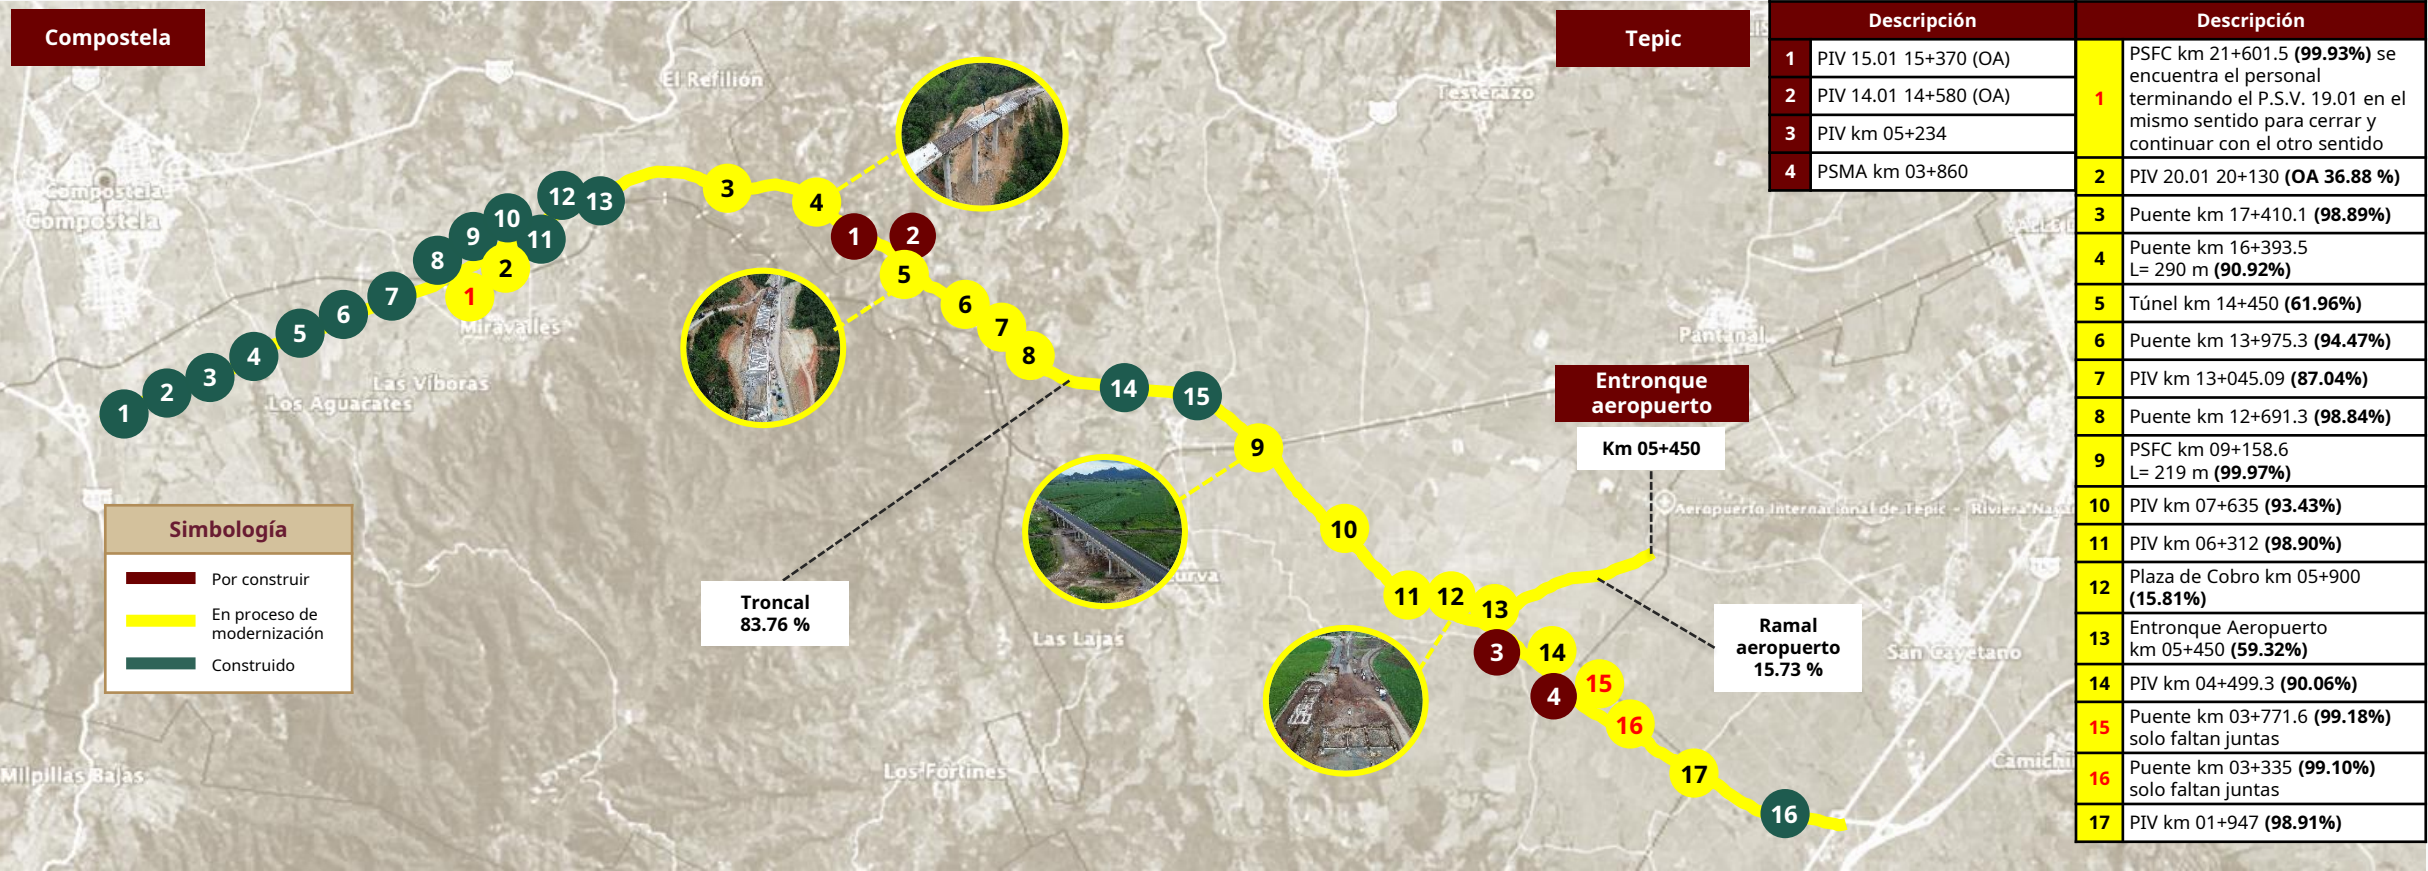

2025
Año de
La Mujer
Indígena


Avance físico


- Programado: 100 %
- Real: 96.14 %
- Financiero: 88.28 %
- Semanal: 0.45 %


Concesionaria: FONADIN


 **Inversión:** 2,473.43 mdp

-  **Meta:** 28 km
- 1 Plaza de cobro,
 - 10 Puentes,
 - 2 PSFC,
 - 1 Entronque (solo gazas)
 - 19 Cruces
 - Ramal Aeropuerto

 **Inicio:** Marzo 2023
Término: 31-Oct-2025

 **5,500** empleos generados

 **490 mil** habitantes beneficiados

 **35 minutos** de ahorro en tiempo

Nayarit


Tramo Tepic-Compostela



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	08/08/25 al 14/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	1,982,866.26	1,969,274.62	13,591.64	5,500.00	5,880.00	
Cortes (m³) Estabilización de taludes	2,443,497.56	2,363,372.63	80,124.93	10,500.00	12,500.00	
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	0.96	1.04	0	0	Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. En revisión fuerza de trabajo necesaria.

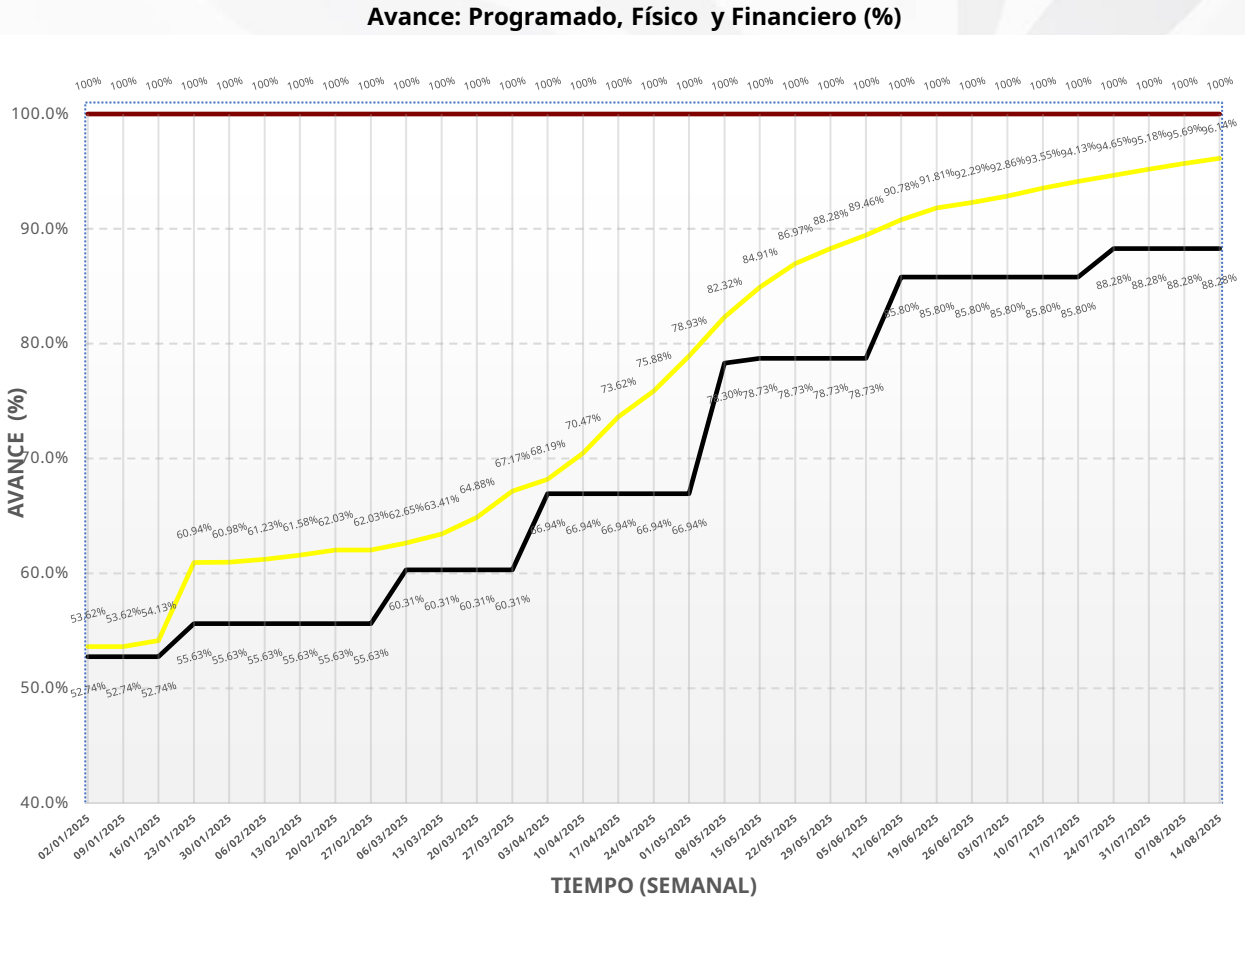

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	01 de agosto al 07 de agosto	08 de agosto al 14 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	480	480
Maquinaria	86	86
