

Chiapas

Entronque San Cristóbal

Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

Avance físico:

- Programado: 0.00%
- Semanal: 0.00%
- Real: 25.70%

Avances:

- Se modifica la fecha de reinicio de los trabajos de construcción del Entronque, y queda condicionando hasta la autorización de las nuevas modificaciones que presente la Concesionaria.


Las obras no presentan avance por estar en suspensión temporal



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

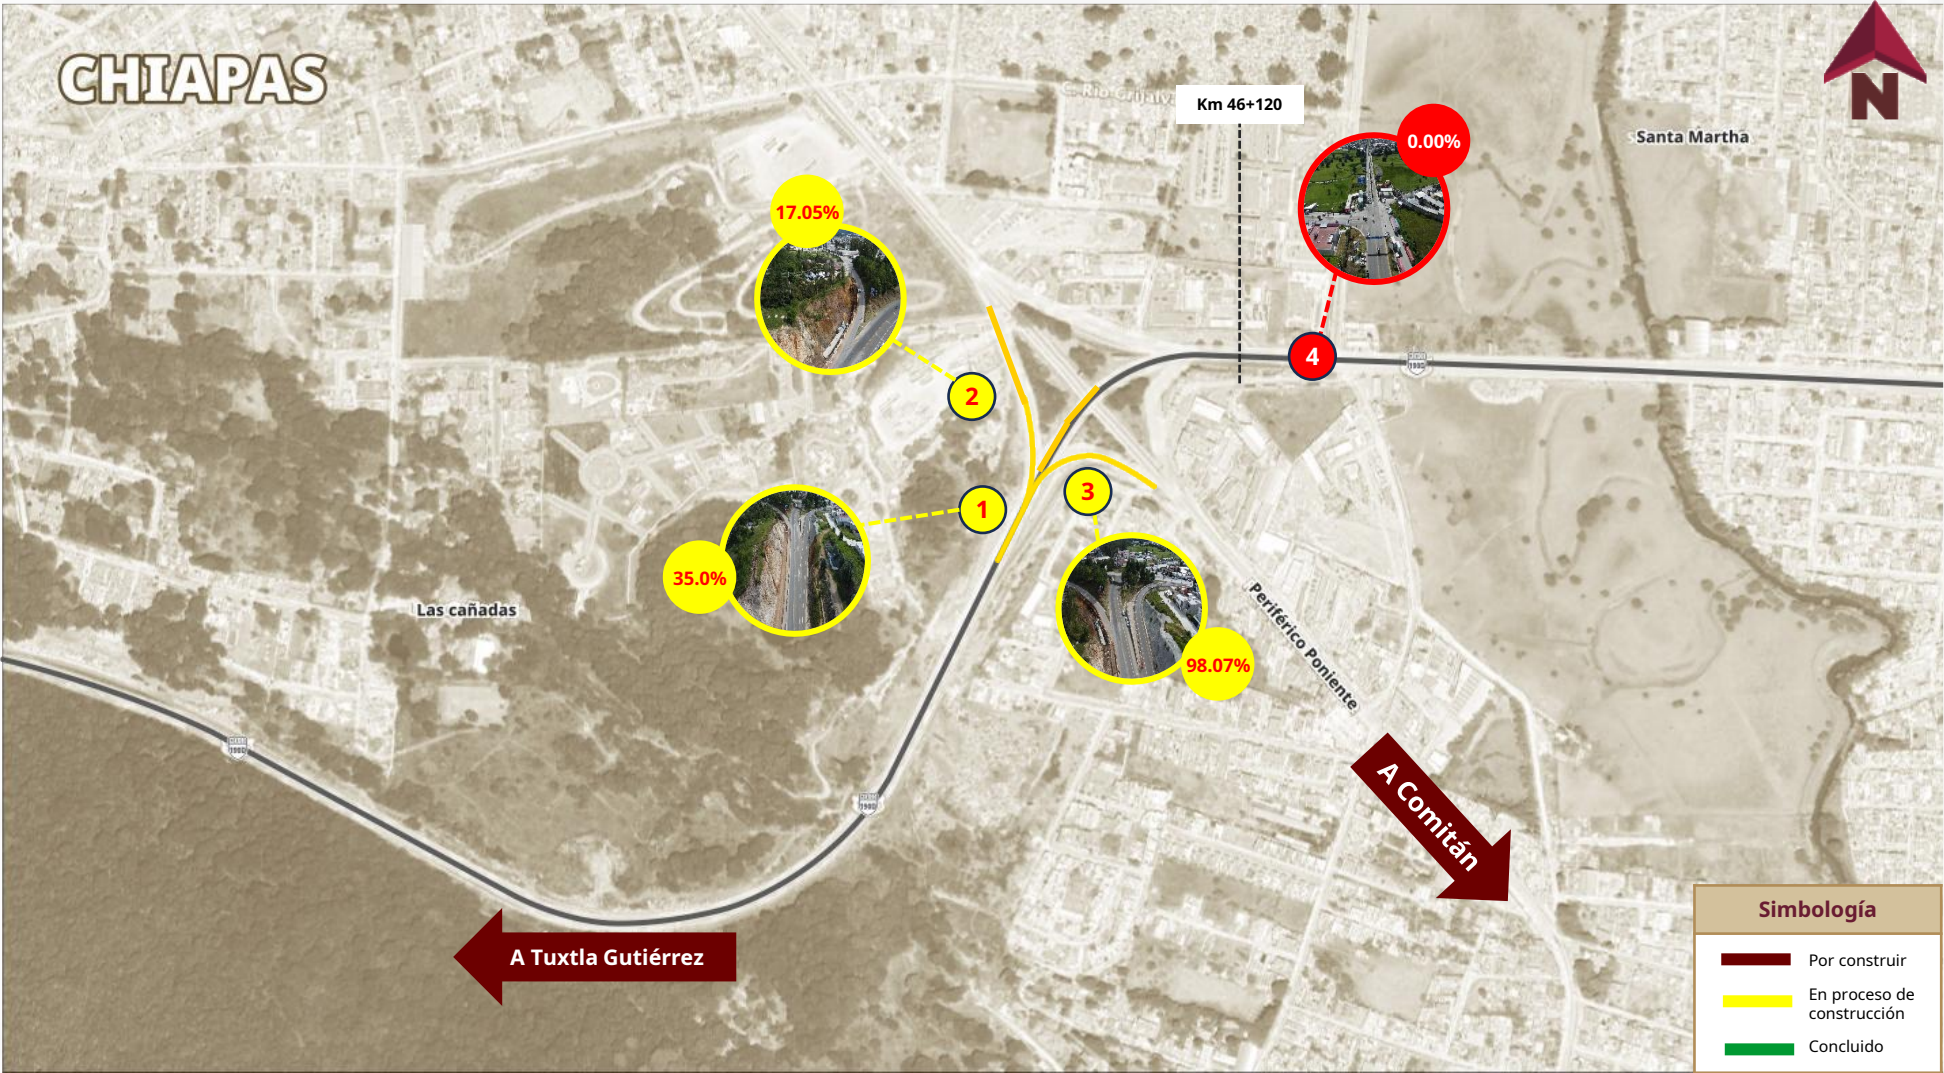

Inversión: 44.96 mdp

Meta: 1 Entronque

Avance físico:

- Real: 25.70%
- Financiero: 22.96%

Inicio:

Término: Por definir

135 empleos generados

200,000 mil habitantes beneficiados

- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.

Descripción		Observaciones
1	Eje 50: 35.00%	Con fecha 30-Sep-2025, La SICT envió por correo electrónico el oficio No. No. 3.4.-2742, mediante el cual informa a la Concesionaria que se modifica la fecha de reinicio de los trabajos de construcción del Entronque, y queda condicionando hasta la autorización de las nuevas modificaciones que presente.
2	Eje 2: 17.05%	
3	Eje 20: 98.07%, Trabajos a nivel capa subyacente.	
4	Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00%	
