


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

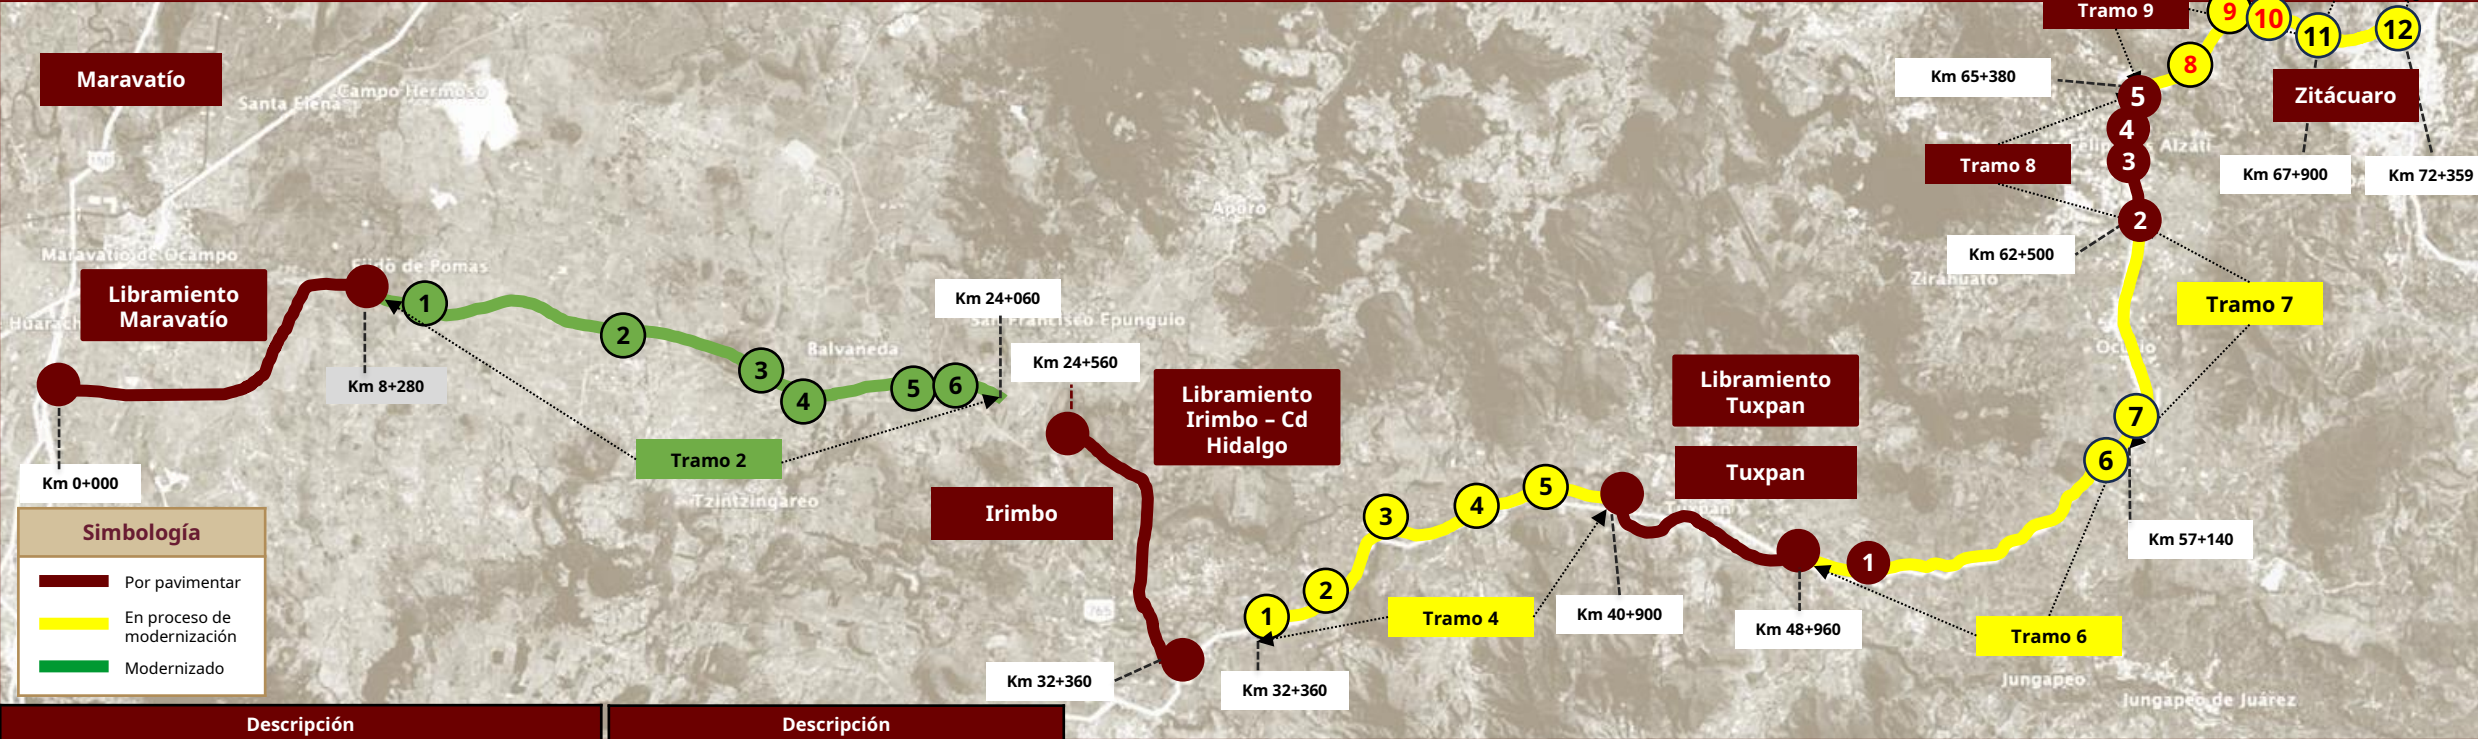

Descripción	
1	Entronque Santa Rosa km 32+420 (89.00%)
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420 (81.64%)
3	Puente Turundeo Km 36+460 (93.56%)
4	Entronque Turundeo I km 37+550 (79.66%)
5	Entronque Turundeo II km 38+780 (91.09%)
6	Entronque Jungapeo km 56+700 (64.86%)
7	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (61.80%)
8	Entronque Valle Verde km 67+220 (63.25%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
9	Entronque Curungueo I Km 68+240 (63.17%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
10	Entronque Curungueo II Km 68+780 (63.17%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
11	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (45.17%)
12	PSV Zitácuaro Km 72+160 (70.33%)

Descripción	
1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Macutzio km 65+620

Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

Avance físico

- Programado: 55.57%
- Real: 50.63%
- Semanal: 0.44%
- Financiero: 0.00%



Inversión: 4,575.3 mdp
Inversión 2020-2025: 3,321 mdp



Meta: 71.3 Km
Meta 2020-2025: 41 km



Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 30 de enero de 2027



13,726 empleos generados
(4,575 Directos y 9,151 Indirectos)



126,000 habitantes beneficiados



Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán


Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 26 sep al 02 oct 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	698,284.77	7,273.23	2,031.69	2,378.49	
Terraplén (m3)	445,687.00	347,631.73	98,055.27	8,275.62	4,466.59	SE DEBEN INICIAR TRABAJOS EN TRAMO 8, EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL DERECHO DE VIA.
Subyacente (m3)	256,097.00	233,843.35	22,253.65	1,049.65	2,529.18	
Subrasante (m3)	170,688.00	154,760.25	15,927.76	482.88	1,422.43	

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 26 sep al 02 oct 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	100,547.44	25,111.60	603.69	872.47	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,277.50	522.50	0.00	22.50	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Fresado (m3)	10,676.00	9,931.06	744.94	0.00	14.79	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	23.99	6.25	0.00	0.08	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Geomalla (m2)	84,520.00	64,807.40	19,712.60	0.00	1,974.80	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	100,397.09	20,016.96	0.00	695.39	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	13,092.21	32,155.59	0.00	192.10	INICIÓ EL TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 26 sep al 02 oct 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	1.45	0.00	0.00	0.05	CONFORMACION DE TERRACERÍAS DE ACCESO Y SALIDA, ARMADO DE MURO DE RESPALDO DE TRABES
PIV JUNGAPEO	1.00	0.95	0.05	0.00	0.10	CONTINÚA EL CORTE DE TN EN GASAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.31	0.69	0.00	0.01	FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA EN TALLER
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.80	0.20	0.00	0.02	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO, ARMADO DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO
DEFENSA METÁLICA	31,302.00 ml	20,307.10 ml	10,994.90 ml	776.31 ml	0.00 ml	SOLO SE REALIZARON PREPARATIVOS, LA SIGUIENTE SEMANA CONTINUA LA COLOCACIÓN DE DEFENSA

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

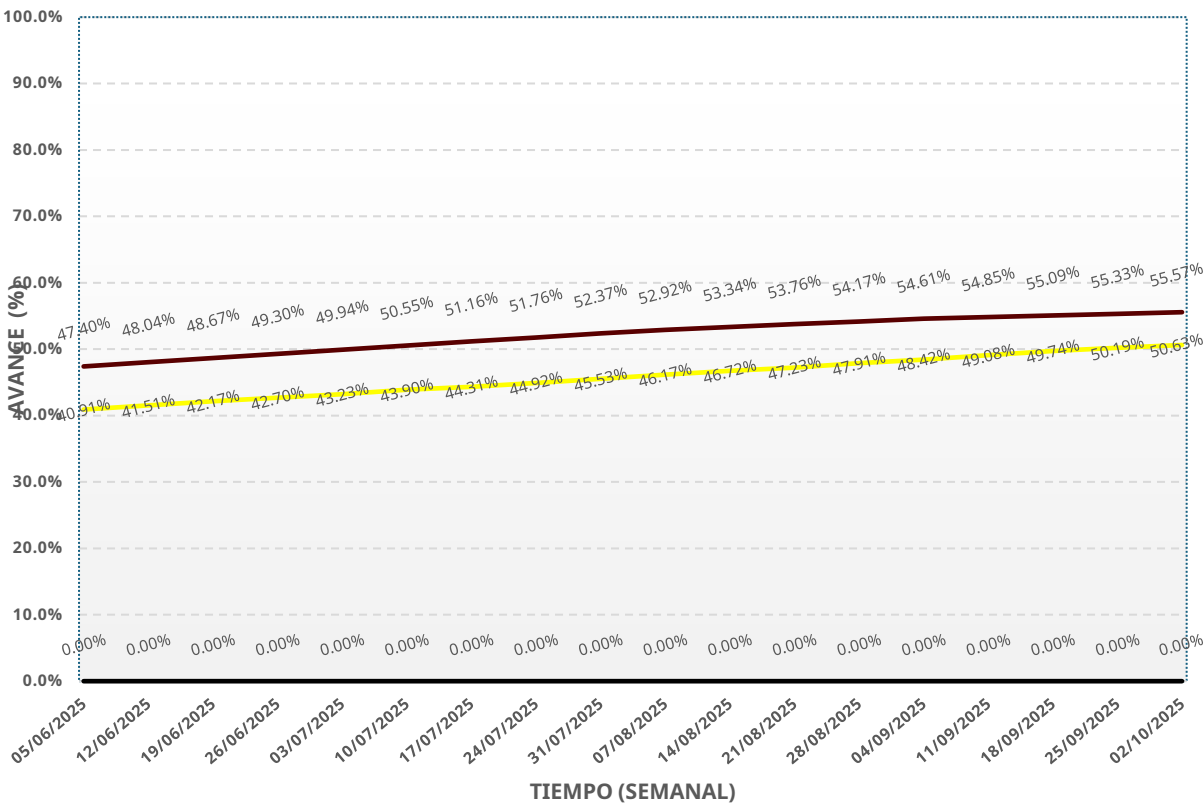

Avance Programado Avance Físico *Avance Financiero
* No presenta avance financiero

	19 de septiembre al 25 de septiembre	26 de septiembre al 02 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	280	279
Maquinaria	181	179
