


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

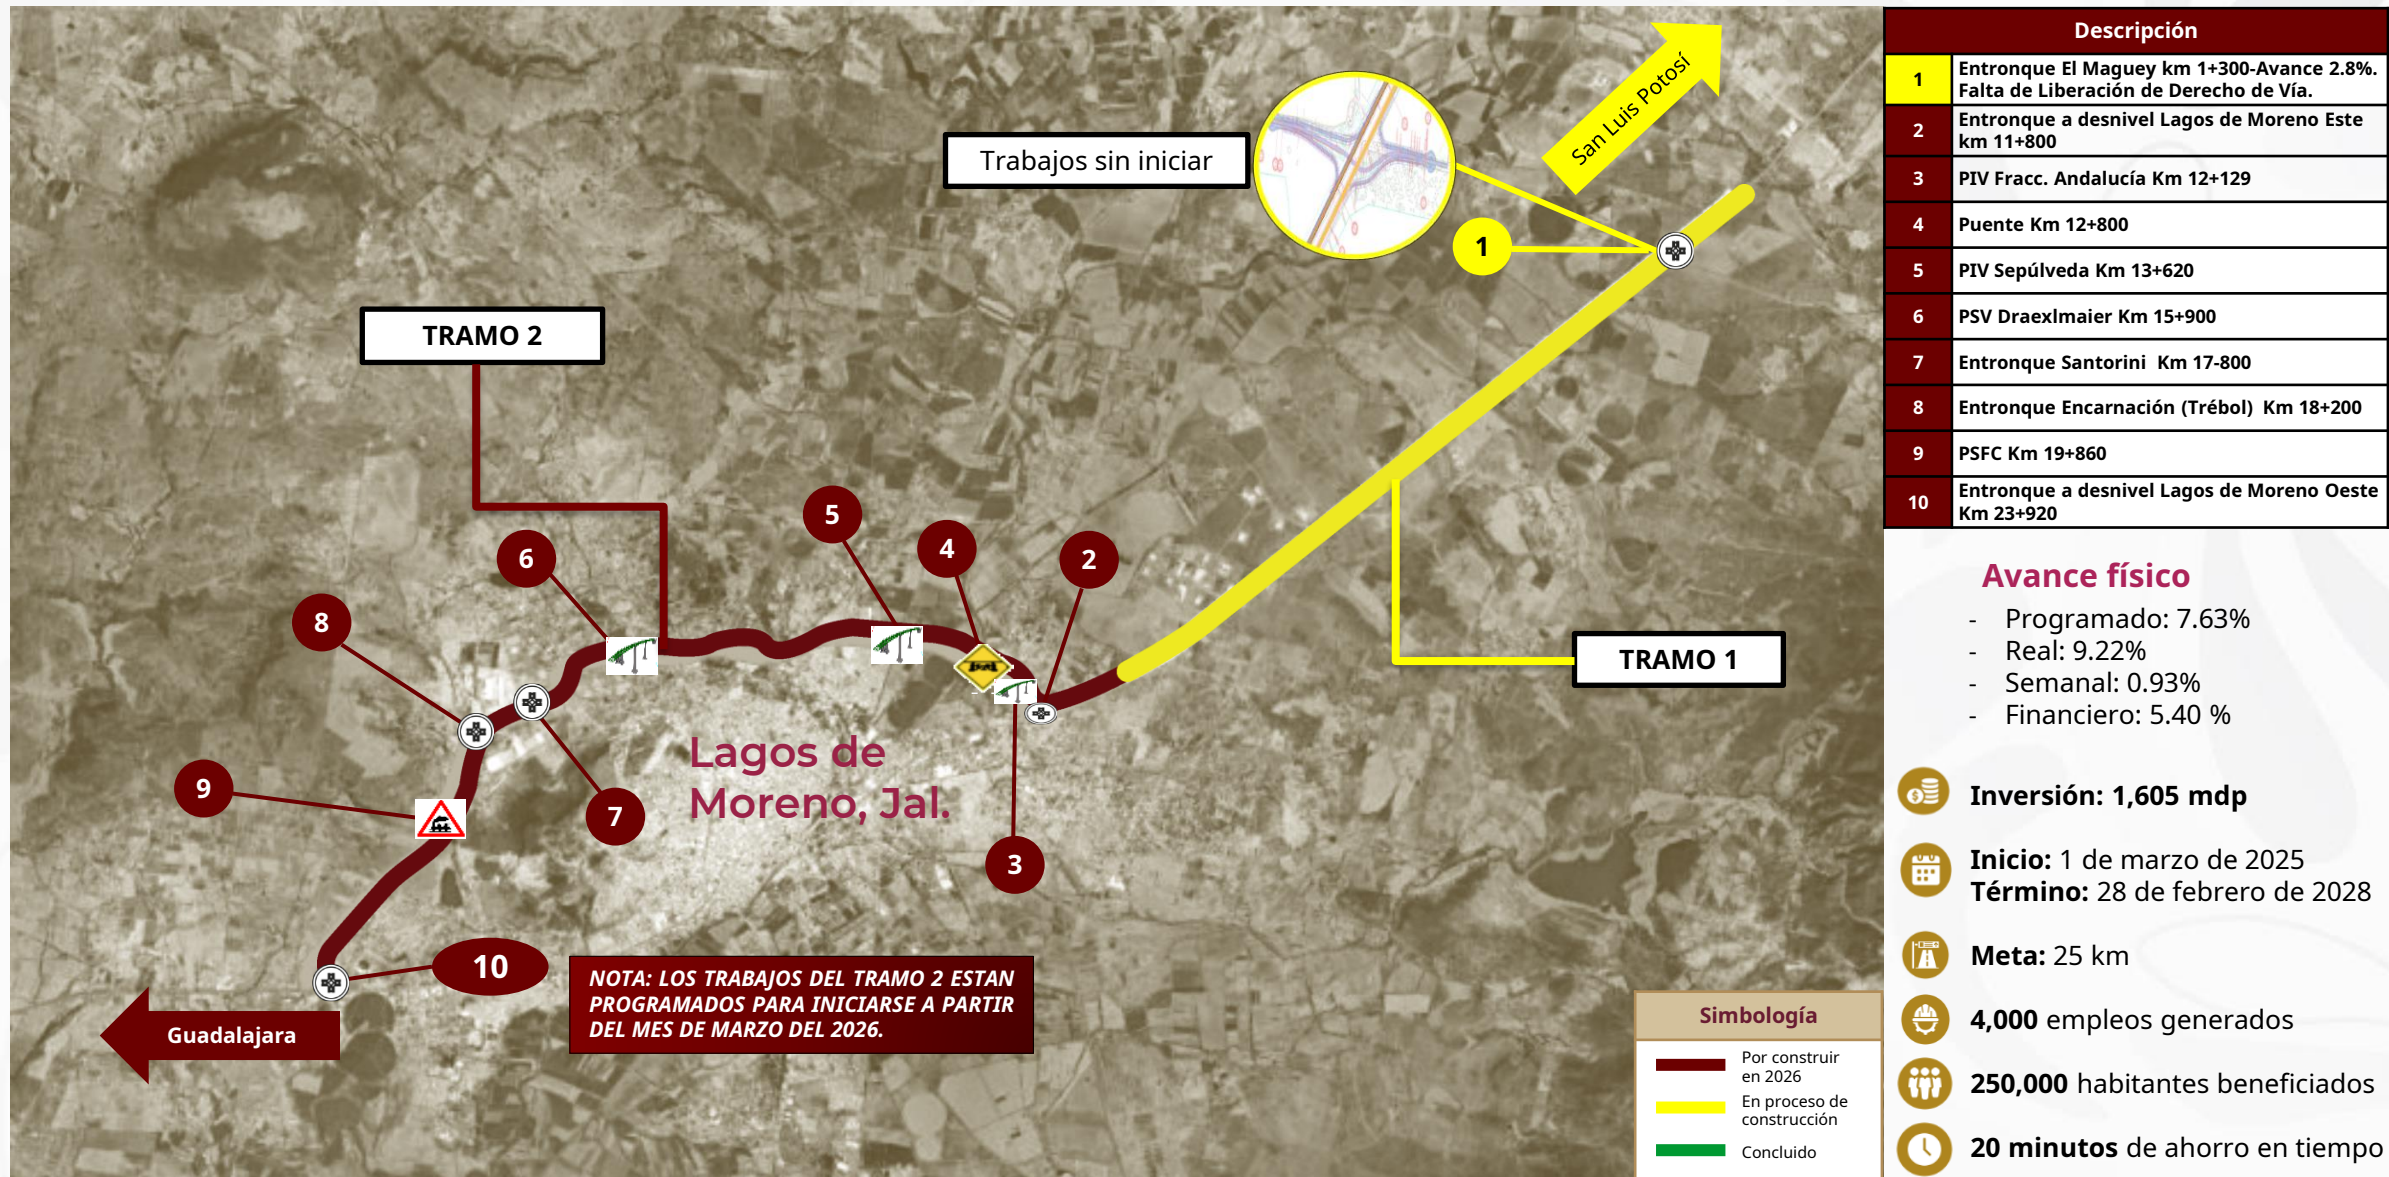


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

TERRACERIAS TRONCAL						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	18/07/25 al 24/07/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Corte (m³)	89,225	85,846.72	3,378.28	8,210.41	11,745.40	En proceso
Pedraplén (m³)	4,800	1,150	3,650	600	0	Se está regularizando toda vez que se ha cambiado el frente de trabajo por cambios de carril.
Terraplén (m³)	29,823	15,429.4	14,393.6	0	1,000	Se inicio antes de lo programado (Agosto)
Subrasante (m³)	24,644	13,796.19	10,847.81	0	201.10	Se inicio antes de lo Programado (Septiembre)
Base hidráulica (m³)	23,690	11,986.89	11,703.11	0	327.89	Se inicio antes de lo Programado (Octubre)

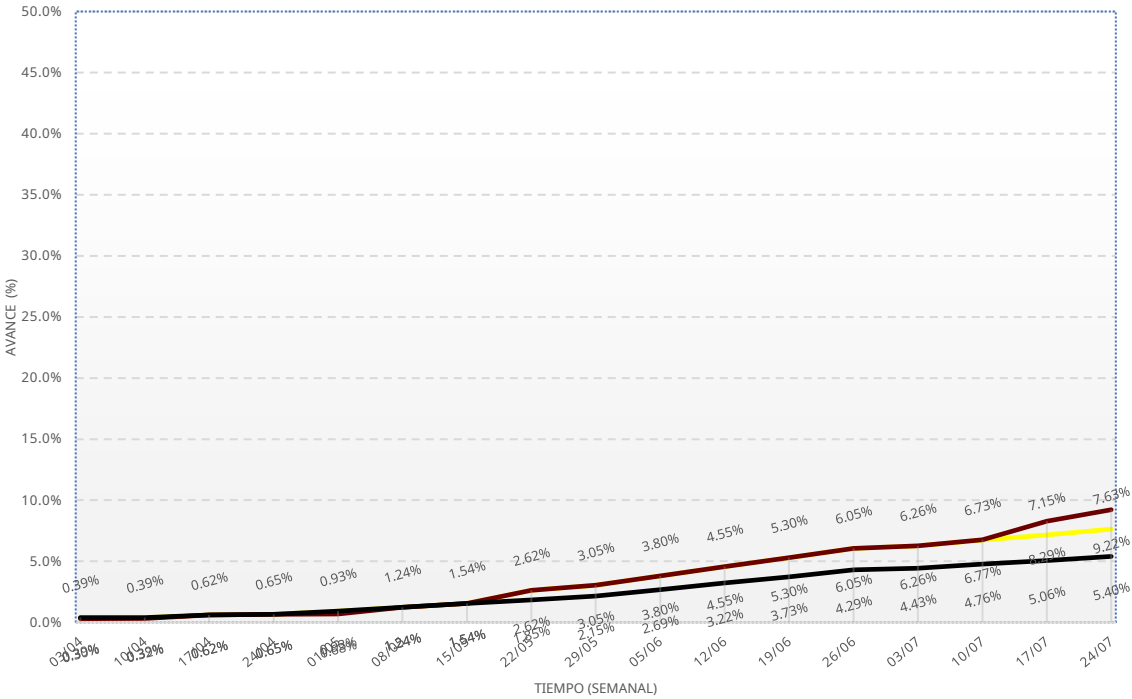

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	11 al 17 de julio de 2025	18 al 24 de julio de 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	138	138
Maquinaria	50	50

