


Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 8.73 %
- Real: 8.23 %
- Semanal: 0.15 %
- Financiero: 0%

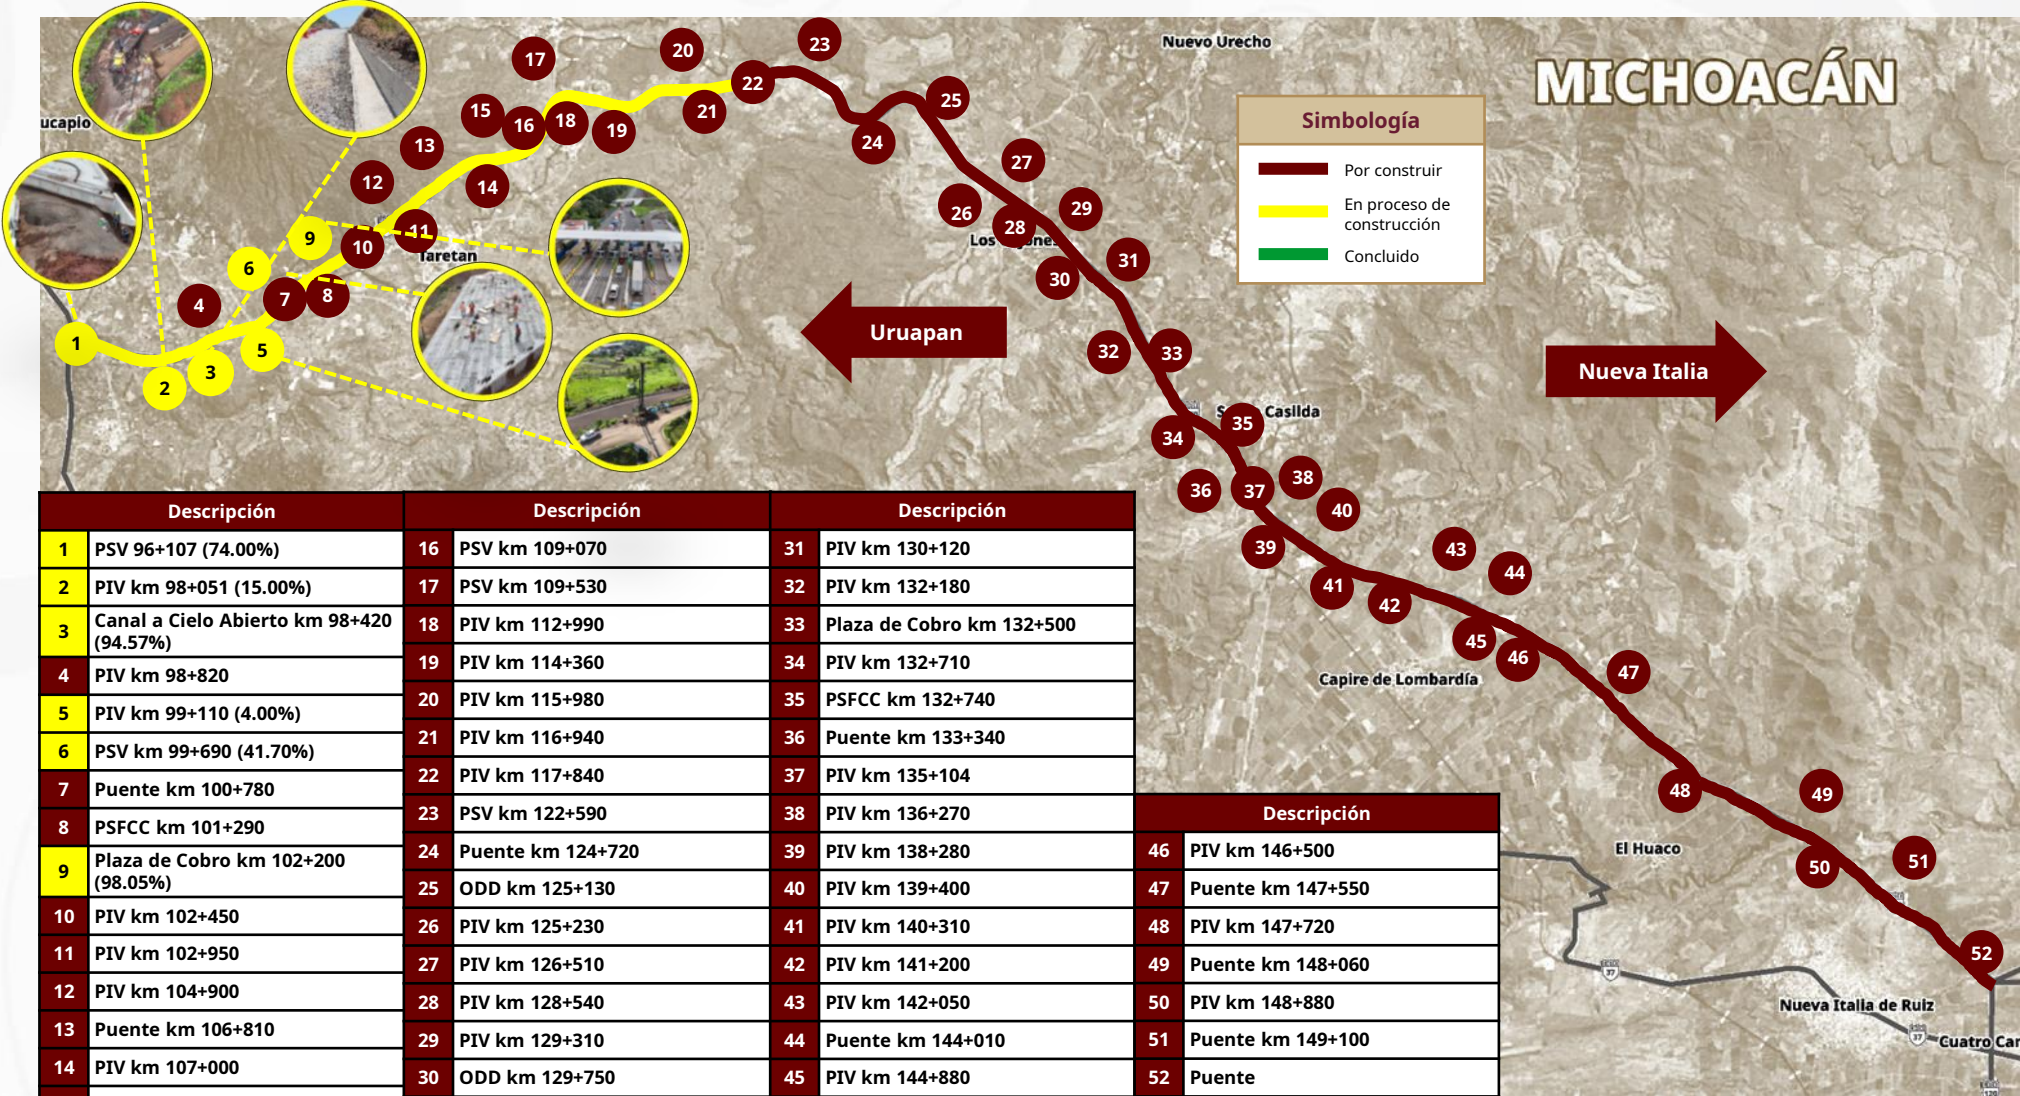


-  **Inversión: 7,049 mdp**
-  **Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
-  **Meta: 67.09 km**
65 km (troncal), 2.09 km (estructuras), 2 plazas de cobro, 10 puente, 6 entronques, 54 cruces y múltiples obras de drenaje.
-  **12,480** empleos generados
-  **1,800,000** habitantes beneficiados
-  **10 minutos** de ahorro en tiempo
- Concesionaria :** PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	18/07/25 al 24/07/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Subbase	65 km	6.65 km	58.34 km	.100 km	.100 km	En revisión programa de obra.
Subyacente	65 km	7.8 km	57.2 km	.300 km	.300 km	
PSV 96+107 Losas de acceso	2	0		1	1	Compactación de material en capa previo a desplante de losa de acceso
PIV 98+051 Cabezales	3	0	3	1	1	Cimbrado del muro diagrama del cabezal en el apoyo 3
Plaza de cobro 102+200 Cancelería en cabinas	2	0	2	1	1	Colocación de cancelería de vidiro en cabinas.

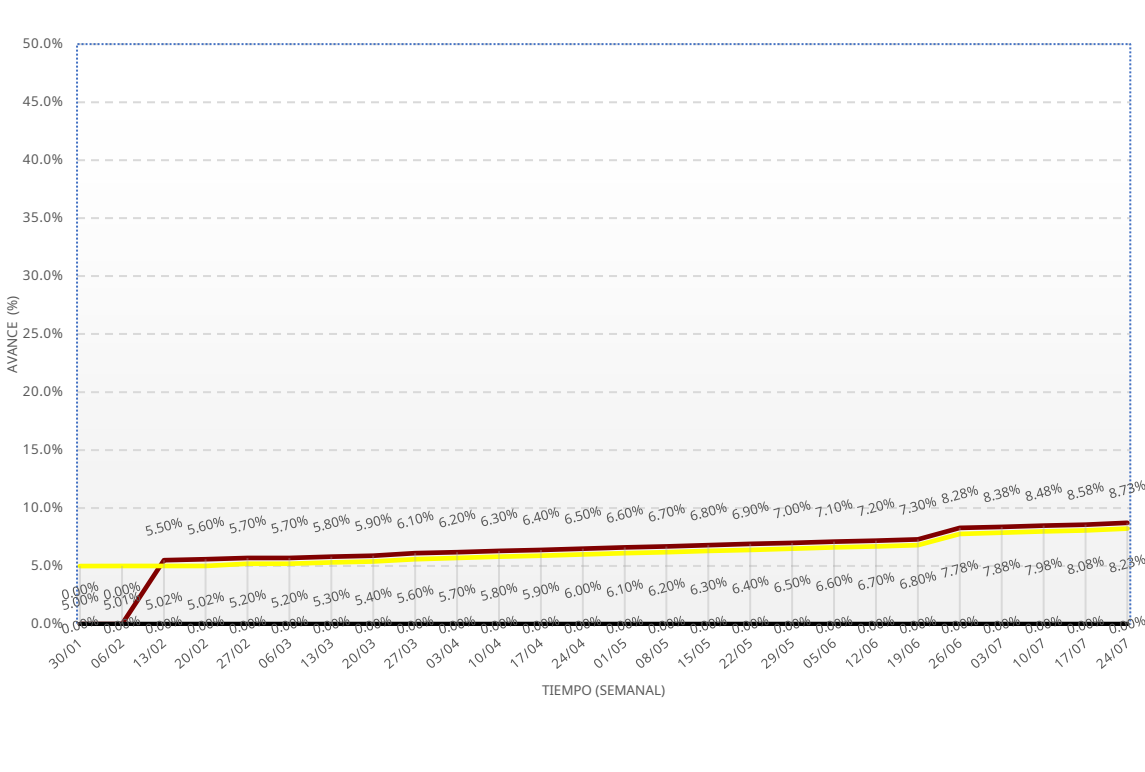

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 11 de julio al 17 de julio	Del 18 de julio al 24 de julio.
Fuerza de Trabajo (personas)	1,500	1,500
Maquinaria	550	550

