


Nayarit

Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

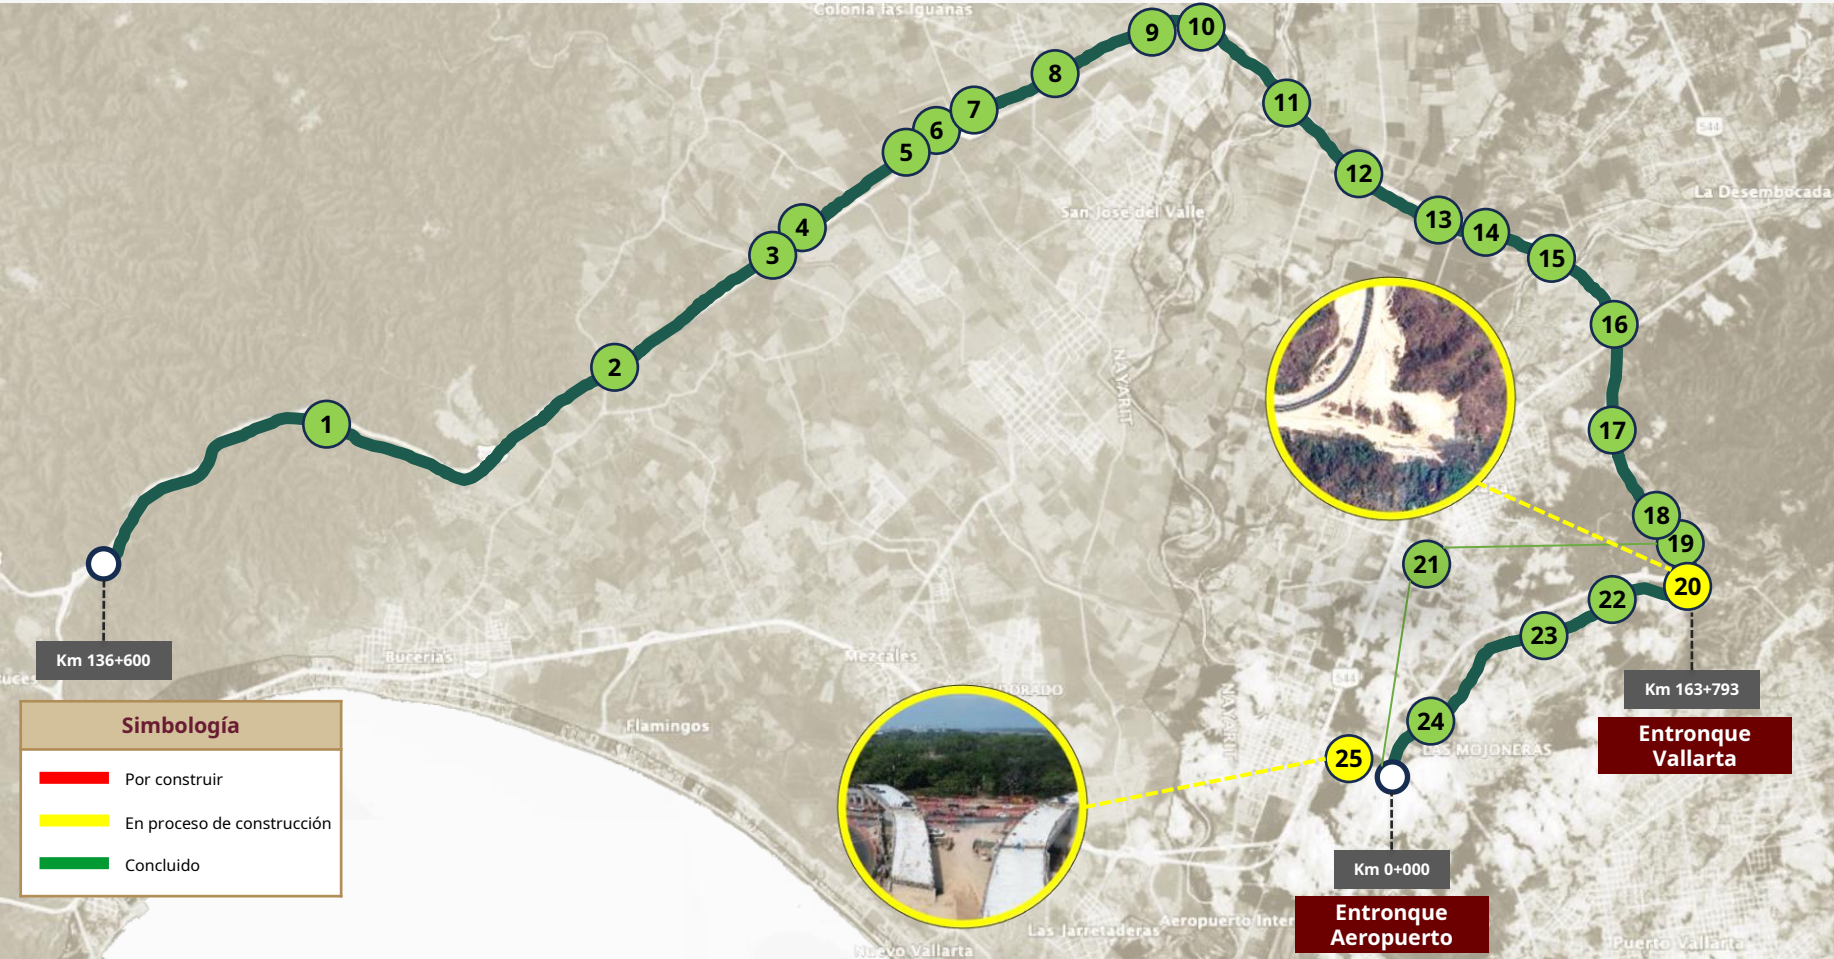

Simbología

Por construir

En proceso de construcción

Concluido

Inversión total: 2,577 mdp

Inicio: septiembre de 2022
Término: septiembre de 2025, inaugurada y puesta en operación diciembre de 2024 (pendiente complementaria)

Concesionaria: IDEAL

Meta: 34.9 km
8 puentes, 13 estructuras de cruce,
2 entronques, 1 plaza de cobro y 1 ramal

Avance físico:
Programado: 100%
Real: 93.82%
Semanal: 0.05%
Financiero: 87.52%

Avance de obra pendiente: Real: 6.18%

5,500 empleos generados

Más de 50,000 habitantes beneficiados

30 minutos de ahorro en tiempo


Descripción	
1	Puente rio Las Animas km 240+401
2	PIV 2V a zona agrícola km 144+237
3	PSV 1 V Sin Nombre km 146+700
4	Puente canal de riego km 146+800
5	PIV El Naranjo km 148+260
6	Plaza de cobro La Misión 148+700
7	Puente canal con camino de servicio km 149+597
8	PSV a valle de Candras km 151+496.22
9	PSV km153+225
10	PSV a San José del Valle km 153+538.25
11	Puente Rio Ameca km 154+903.25
12	Puente Canal km 156+754.01
13	PIV a San José del Valle km 157+663
14	Puente canal de riego km 158+876
15	Puente Mascota km 159+302
16	PSV Pto. Vallarta- Las Palmas km 160+427
17	Puente Santo Domingo km 162+181
18	PSV km 163+005
19	PSV km 163+452
20	Entronque Aeropuerto km 163+793, (15.0%) Sin asignación de recursos por la concesionaria.
21	Ramal Aeropuerto
22	PSV km 4+690
23	PSV km 3+018.9
24	PSV A.V. México km 1+000.13
25	Entronque Vallarta km 0+000, (80.9%)

Nayarit

Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	18/07/25 al 24/07/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Entronque Vallarta. Eje 10						
Montaje de trabes	49	49	0	0	3	Claro 0-1A.
Losa de rodamiento	487.1	322.5	154.6	0	51.0	Claro 1-2
MME	2,748	1,370.5	1,377.5	196.3	212.0	Se trabaja en colocación de escamas y rellenos
Entronque Vallarta. Eje 20						
Fabricación de trabes	32	32	0	0	1	Colado de trabe claro 6A-7
Montaje de trabes	32	29	3	0	2	Claro 6A-7
Losa de rodamiento	346.0	122.0	224.0	9.6	0	Trabajos de cimbrado en claro 5-6

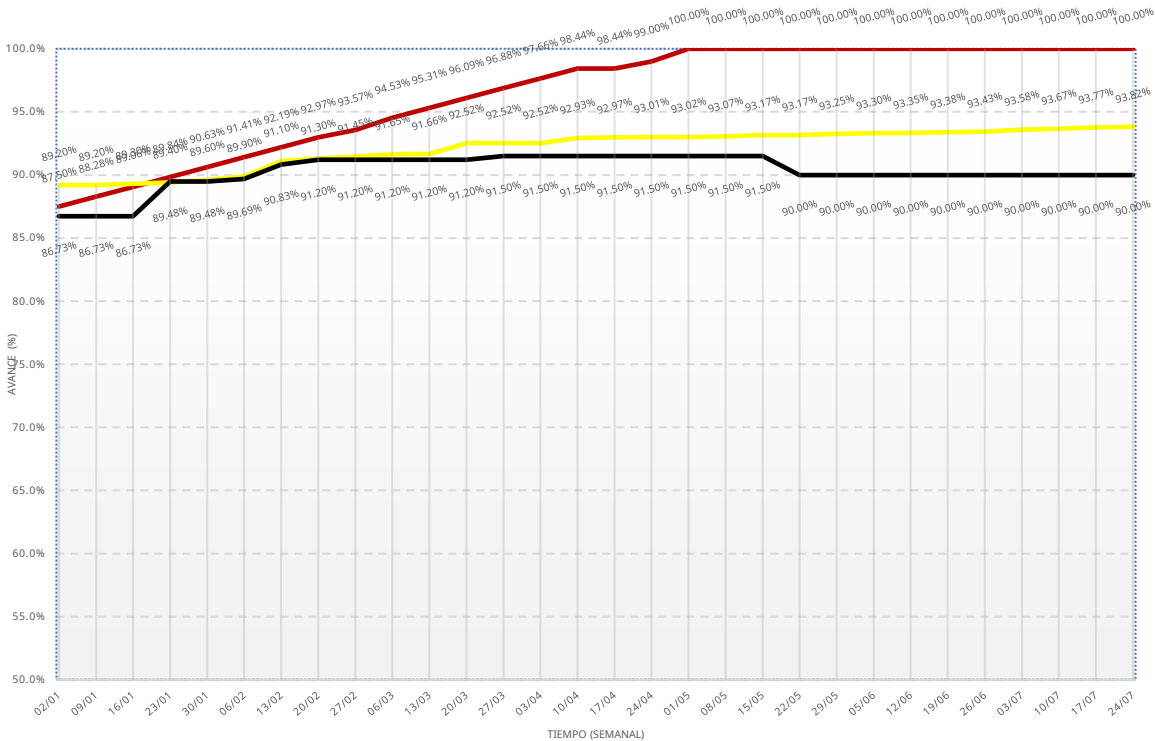

	Avance Programado	Avance Físico	Avance Financiero
	Del 11 de julio al 17 de julio		Del 18 de julio al 24 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	301		295
Maquinaria	22		20

