


# Colima

## Tramo Armería-Manzanillo

**Avance físico**

- Programado: 94.48%
- Semanal: 0.46 %
- Real: 35.53%
- Financiero: 20.79%

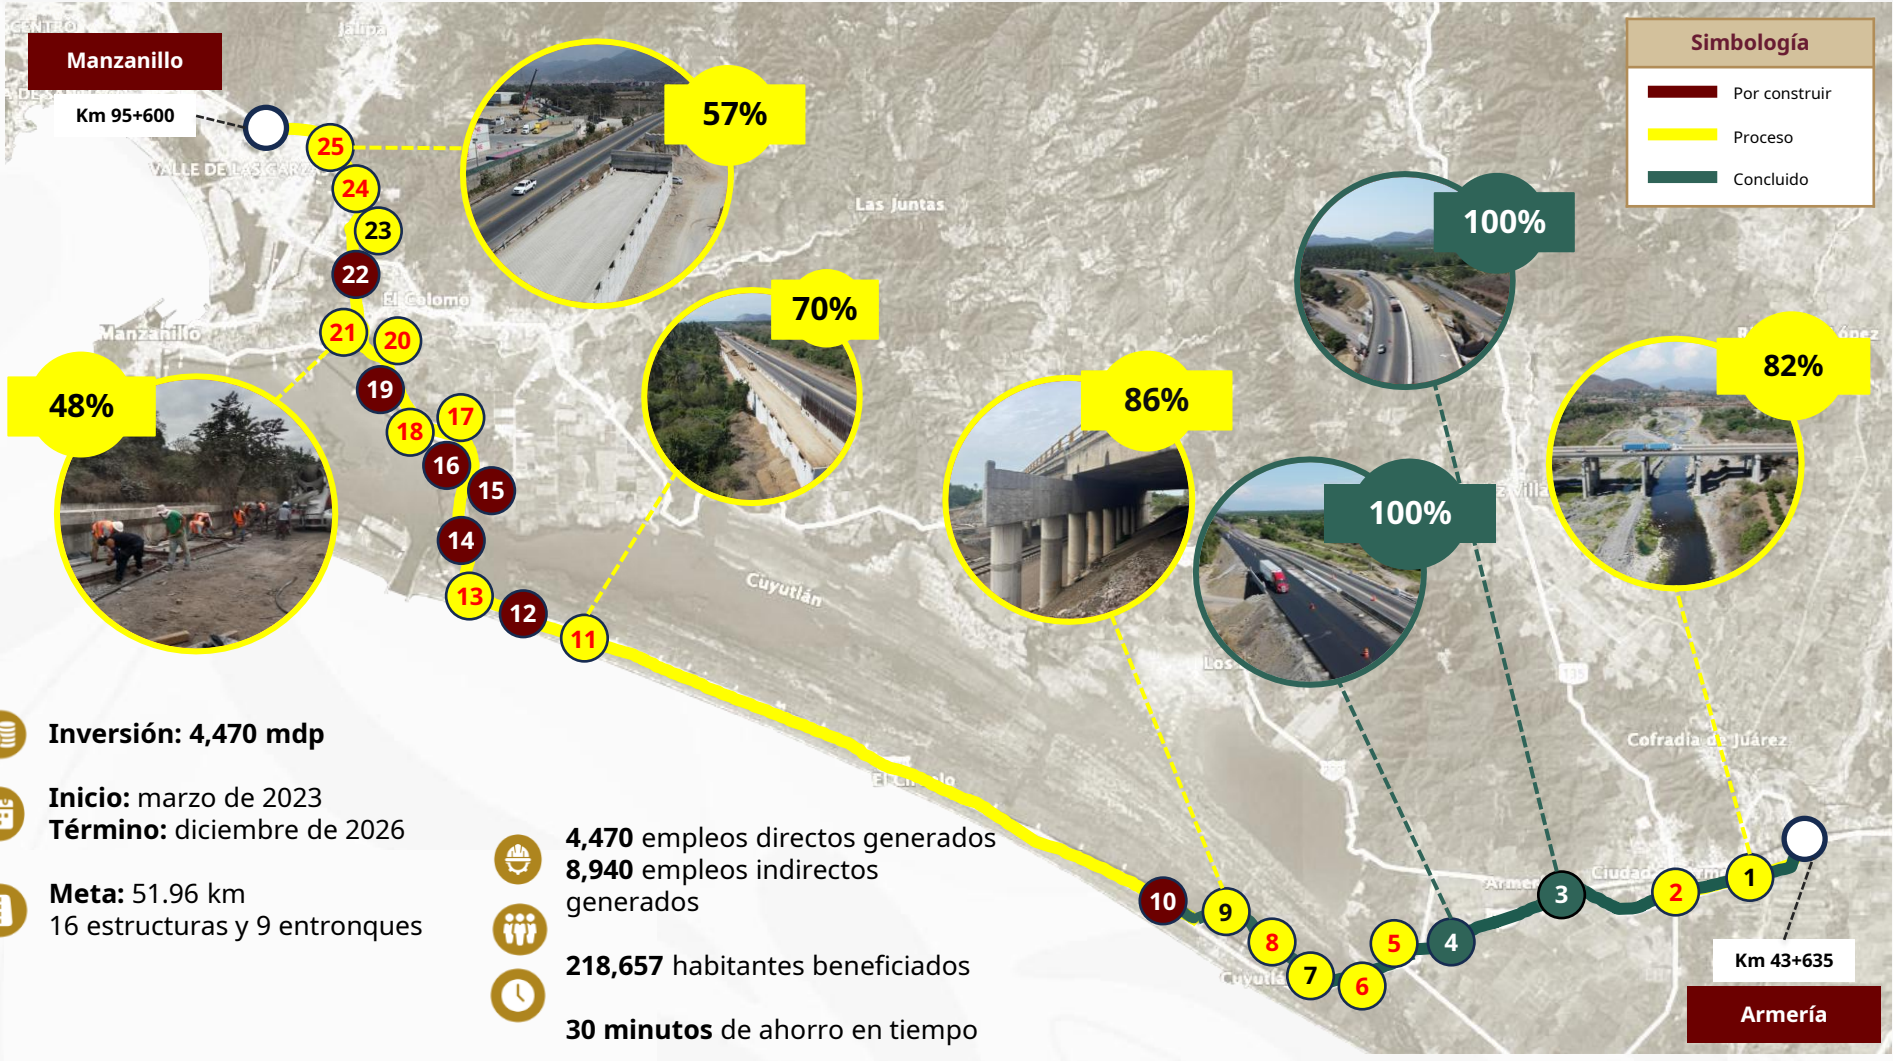

**Inversión:** 4,470 mdp

**Inicio:** marzo de 2023  
**Término:** diciembre de 2026

**Meta:** 51.96 km  
16 estructuras y 9 entronques

**4,470** empleos directos generados  
**8,940** empleos indirectos generados

**218,657** habitantes beneficiados

**30 minutos** de ahorro en tiempo

**Concesionaria:** PINFRA

Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (82%)
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance.
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (100%)
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (42%) Se inició habilitado de acero
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (17%) Sin actividades programadas
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (54%)
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) Falta regularizar programa
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (86%)
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (70.66%) No se tuvieron trabajos programados
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900 (52%) Sin actividades programadas
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (67%) Sin actividades programadas
18	PSV Panteones km 87+300 (21%) Falta de Fuerza de Trabajo
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
21	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (48%) Trabajo programado para esta semana concluido
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (16%)
24	Entronque Jalipa km 94+100 (9%) Hay que cambiar el transito al cuerpo izquierdo del paso del puente
25	Puente Jalipa km 94+158 (57%) El trabajo programado para esta semana, está concluido


# Colima

## Tramo Armería - Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	28/11/25 al 04/12/25		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	272,485	0	0	0	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	522,661	291,248	0	3,726	
Base y sub base (m³)	260,119	165,324	94,795	0	1,248	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

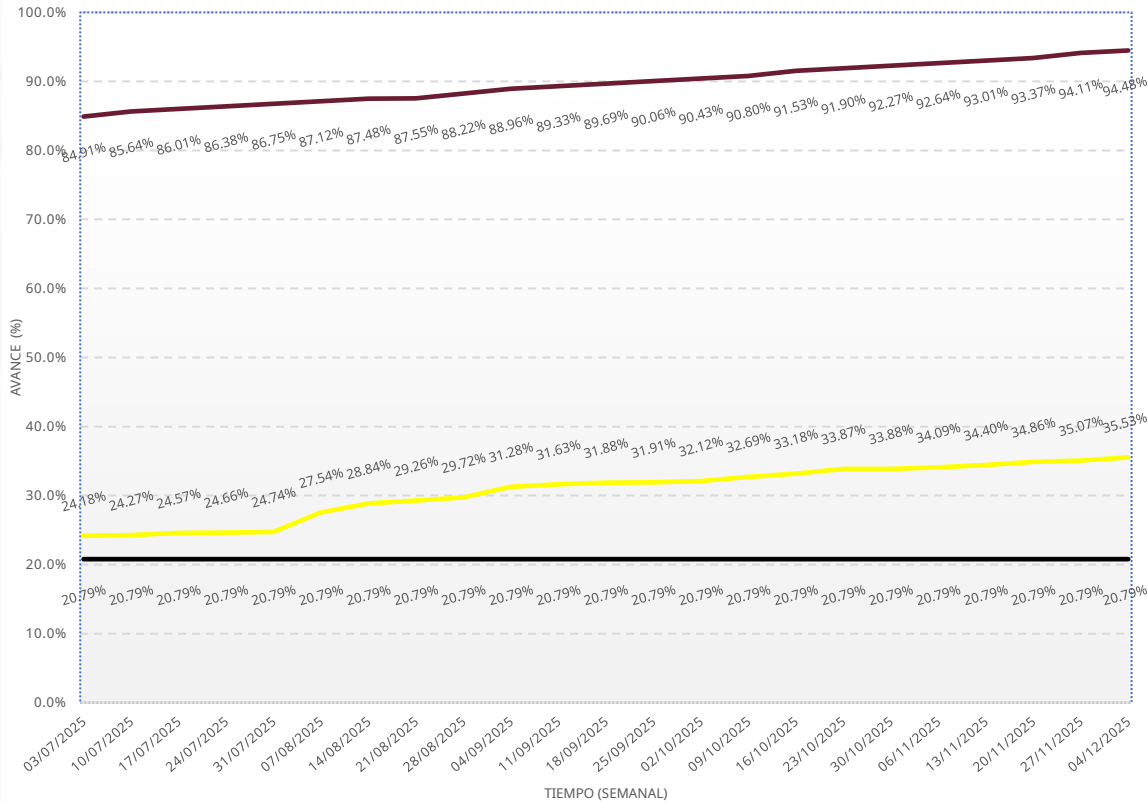

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	21 al 27 de noviembre	28 de noviembre al 04 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	160	168
Maquinaria	66	70
Frente de trabajo	Pavimentación Jalipa tramo 6 de 90+000 a 95+000; tramo 1 de 44+000 a 54+000	Pavimentación Jalipa tramo 6 de 90+000 a 95+000; tramo 1 de 44+000 a 54+000

