


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

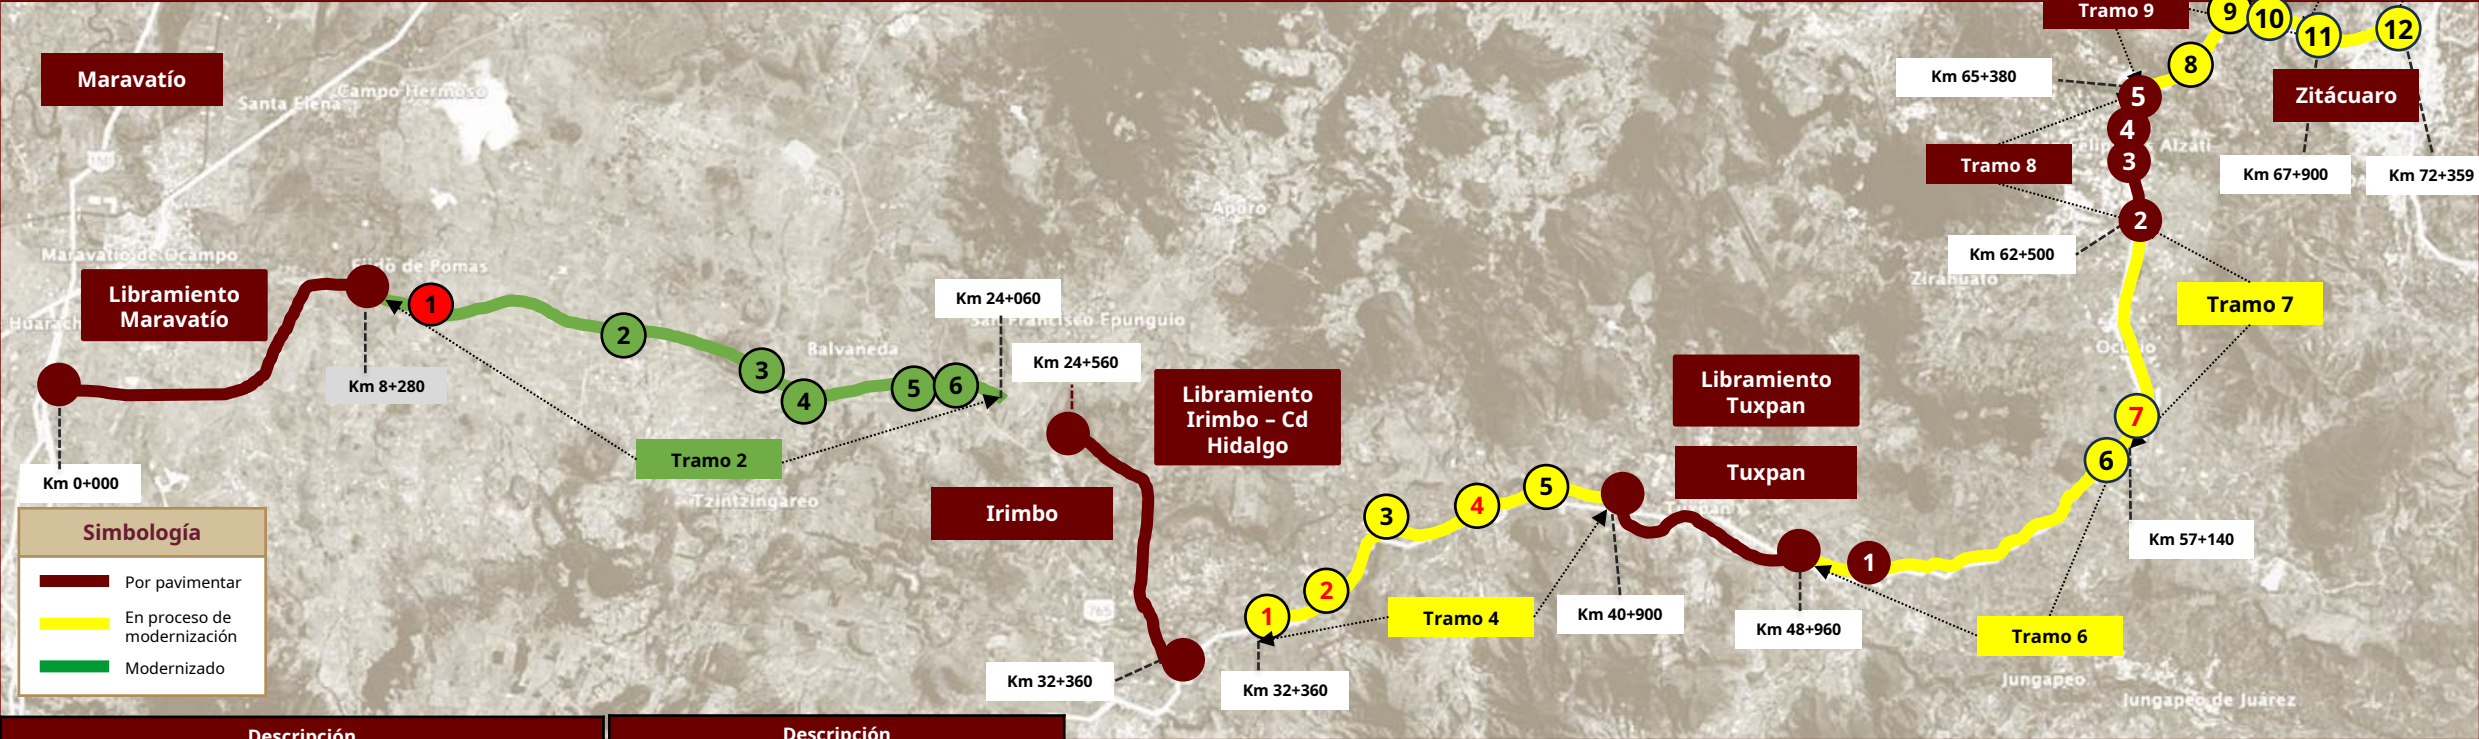


| Descripción | |
|-------------|---|
| 1 | Entronque Santa Rosa km 32+420 (78.00%), Falta tendido de carpeta asfáltica. |
| 2 | Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420 (76.32%), Falta tendido de carpeta asfáltica. |
| 3 | Puente Turundeo Km 36+460 (85.32%) |
| 4 | Entronque Turundeo I km 37+550 (76.37%), Falta tendido de carpeta asfáltica. |
| 5 | Entronque Turundeo II km 38+780 (84.78%) |
| 6 | Entronque Jungapeo km 56+700 (57.33%) |
| 7 | Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (53.58%), Sin actividad |
| 8 | Entronque Valle Verde km 67+220 (52.74%) |
| 9 | Entronque Curungueo I Km 68+240 (30.84%) |
| 10 | Entronque Curungueo II Km 68+780 (30.84%) |
| 11 | Puente San Juan Viejo Km 69+860 (9.28%) |
| 12 | PSV Zitácuaro Km 72+160 (47.23%) |

| Descripción | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Puente Obispo Km 50+400 |
| 2 | Entronque Zirahuato km 62+620 |
| 3 | Entronque San Felipe I km 64+400 |
| 4 | Entronque San Felipe II Km 64+640 |
| 5 | Entronque Macutzio km 65+620 |


Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

Avance físico


- Programado: 51.76 %
- Real: 44.92 %
- Semanal: 0.61 %
- Financiero: 0.00%




Inversión: 4,575.3 mdp
Inversión 2020-2025: 3,321 mdp




Meta: 71.3 Km
Meta 2020-2025: 41 km




Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 30 de enero de 2027



4,800 empleos generados



126,000 habitantes beneficiados



Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán


Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

| TERRACERIAS | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|---|
| Concepto | Total | Ejecutado | Faltante | Del 18 jul al 24 jul 25 | | Observaciones |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| Cortes (m3) | 705,558.00 | 634,914.29 | 70,643.71 | 2,714.60 | 9,463.06 | CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9 |
| Terraplén (m3) | 445,687.00 | 298,587.94 | 147,099.06 | 7,964.00 | 3,528.75 | EL AVANCE DEPENDE DE LOS FRENTES DE TRABAJOS DISPONIBLES. SE ABRIERON FRENTES DE TRABAJO EN TRAMOS 6 Y 7. |
| Subyacente (m3) | 256,097.00 | 213,232.35 | 42,864.65 | 1,002.11 | 1,949.03 | CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9 |
| Subrasante (m3) | 170,688.00 | 141,189.97 | 29,498.03 | 416.11 | 1,516.70 | CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9 |

| PAVIMENTOS | | | | | | |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|---|
| Concepto | Total | Ejecutado | Faltante | Del 18 jul al 24 jul 25 | | Observaciones |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| Base Hidráulica (m3) | 125,659.04 | 84,852.47 | 40,806.57 | 429.07 | 988.54 | CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7 |
| Bacheo (m3) | 1,800.00 | 985.50 | 814.50 | 66.67 | 30.00 | SE REALIZAN BACHEOS EN TRAMO 7 Y 9. LOS TRABAJOS DEPENDEN DE LA DISPONIBILIDAD DE FRENTES. |
| Fresado (m3) | 10,676.00 | 9,492.14 | 1,183.86 | 45.33 | 3.90 | SE REALIZAN BACHEOS EN TRAMO 7 Y 9. LOS TRABAJOS DEPENDEN DE LA DISPONIBILIDAD DE FRENTES. |
| Rayado Carpeta (Ha) | 30.24 | 19.05 | 11.19 | 0.31 | 0.75 | CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7 |
| Geomalla (m2) | 84,520.00 | 45,472.40 | 39,047.60 | 529.78 | 3,646.00 | CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7 |
| Base Asfáltica (m3) | 120,414.05 | 90,172.35 | 30,241.70 | 713.61 | 1,341.20 | CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7 |
| Carpeta Asfáltica (m3) | 45,247.80 | 12,632.00 | 32,615.80 | 1,493.56 | 0.00 | AÚN NO INICIA LA PRODUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PLANTA JUNGAPÉO. EL AVANCE SE COMPENSARÁ CON EL ALTO RENDIMIENTO EN LA COLOCACION DE LA CAPA. |

| ESTRUCTURAS | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------|----------|-------------------------|-----------|--|
| Concepto | Total | Ejecutado | Faltante | Del 18 jul al 24 jul 25 | | Observaciones |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| PUENTE TURUNDEO | 1.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ARMADO DE LOSA DE COMPRESION EN CLARO A2 - A3, MONTAJE DE PRELOSAS EN EL CLARO A4 - A5 |
| PIV JUNGAPÉO | 1.00 | 0.88 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | CONTINUA EL CORTE DE TN EN GAZAS, ARMADO DE LOSA DE COMPRESIÓN EN PIV |
| PSV SAN JUAN VIEJO | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 0.00 | 0.01 | PERFORACIÓN Y COLADO DE PILAS DE ESTRIBO 01 |
| PSV ZITÁCUARO | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | ARMADO DE DIAFRAGMA DE APOYO 02 |

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

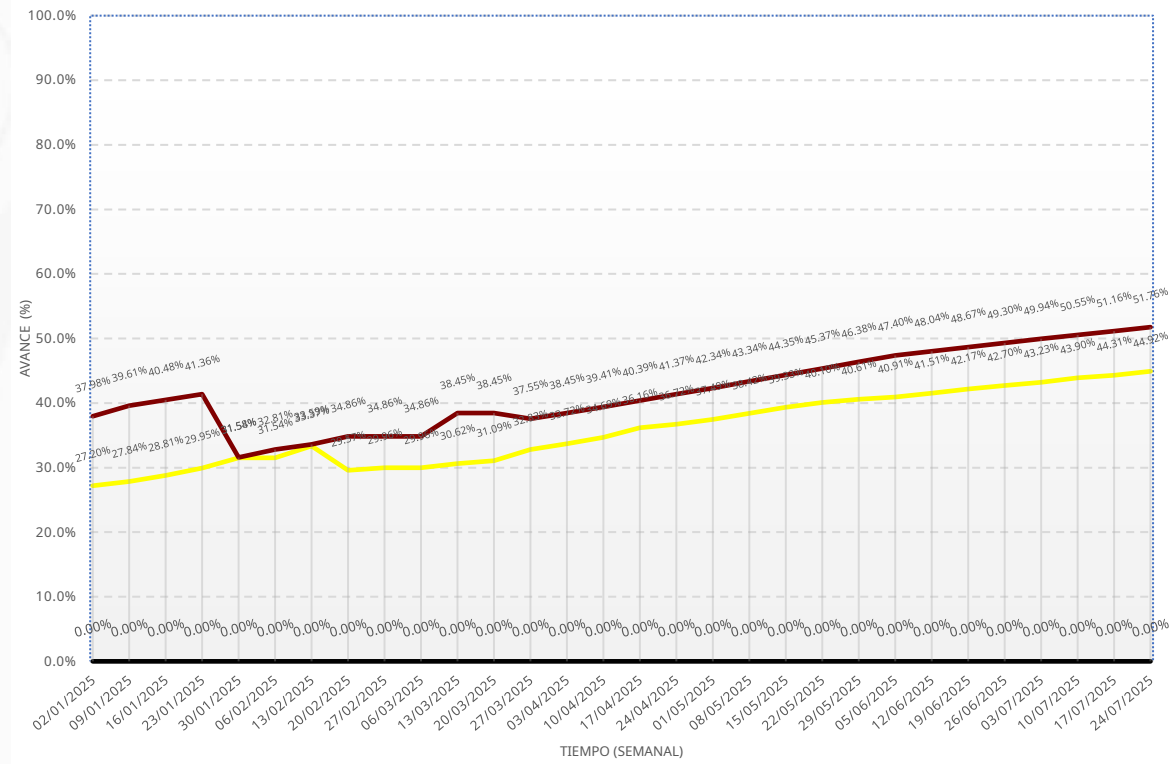

Avance Programado

Avance Físico

Avance Financiero

* No presenta avance financiero

| | 11 de julio al 17 de julio | 18 de julio al 24 de julio |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 280 | 279 |
| Maquinaria | 178 | 180 |
