


Nayarit

Tramo Tepic-Compostela

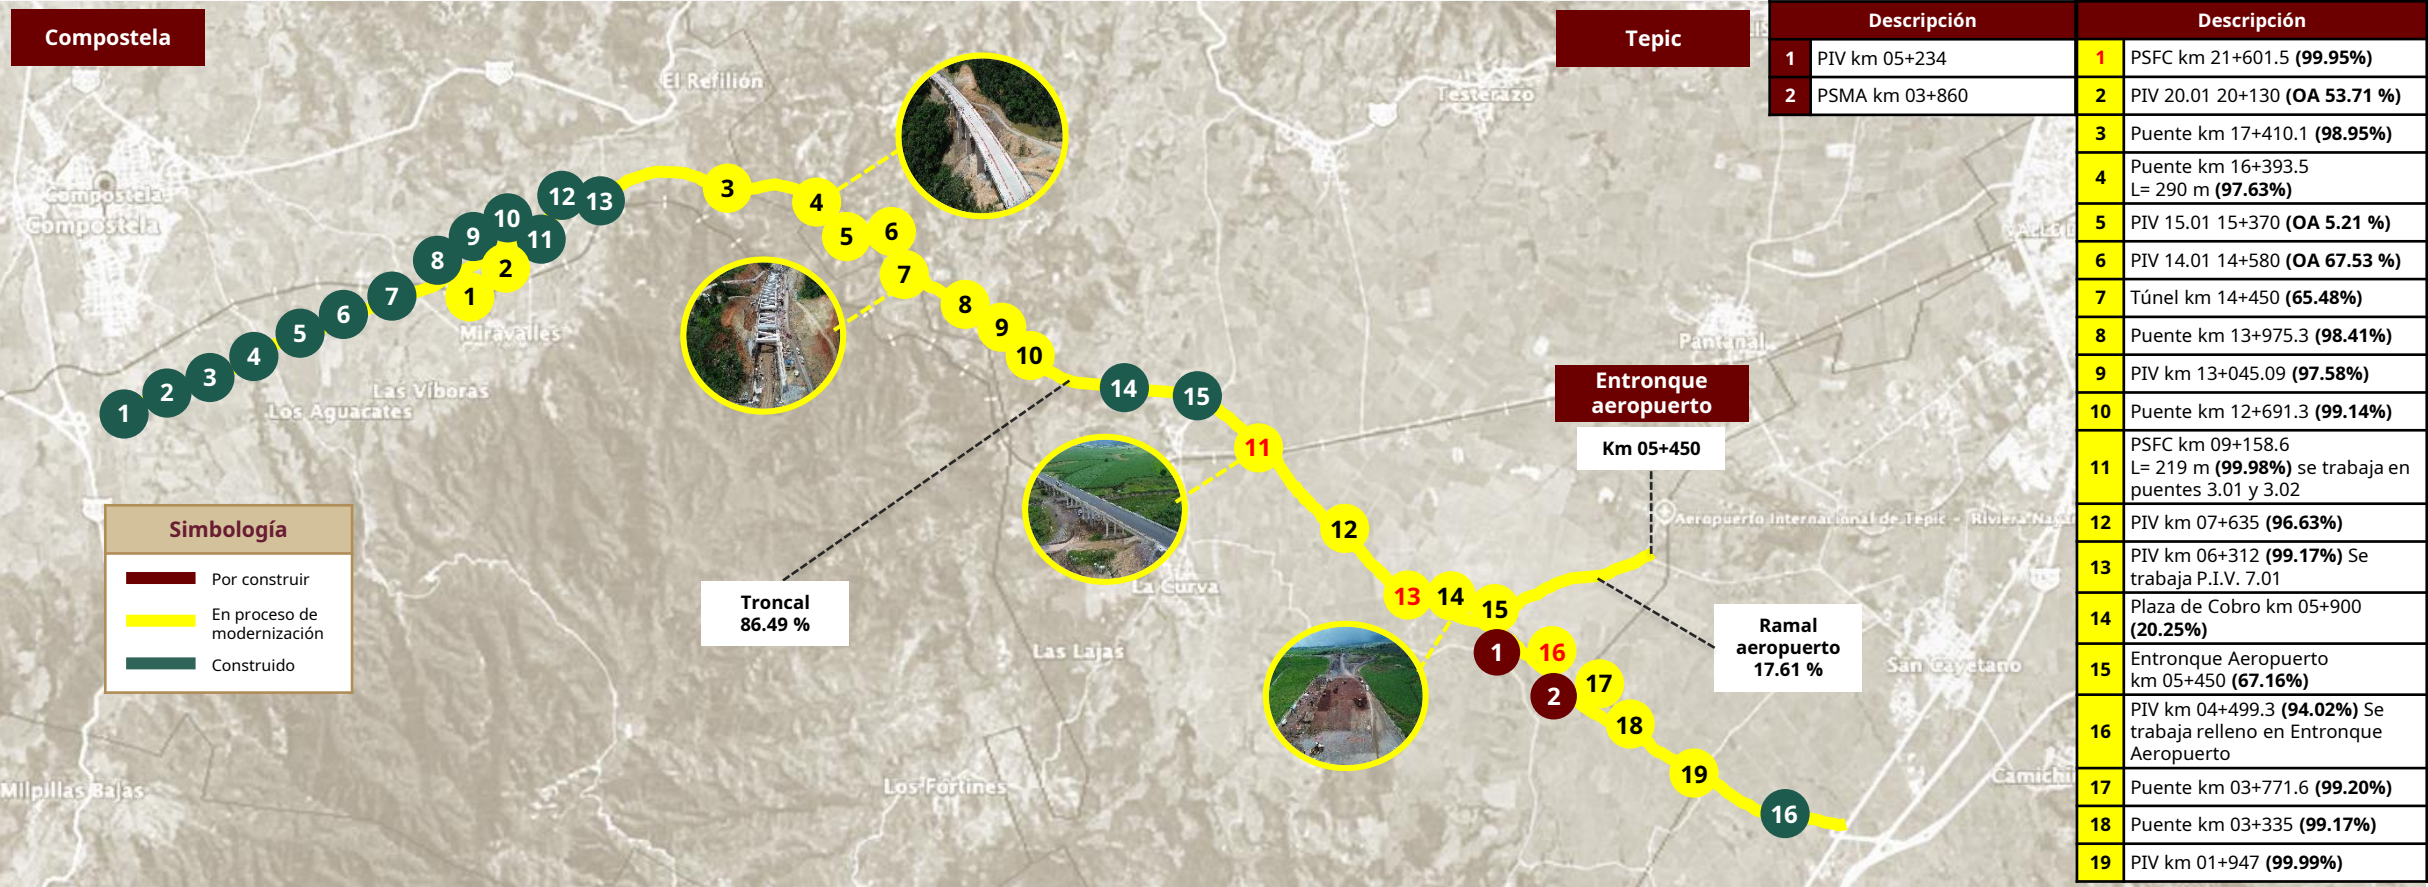

2025
Año de
La Mujer
Indígena

Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 96.93 %
- Financiero: 88.28 %
- Semanal: 0.38 %

Concesionaria: FONADIN

Inversión: 2,473.43 mdp

Meta: 28 km

- 1 Plaza de cobro,
- 10 Puentes,
- 2 PSFC,
- 1 Entronque (solo gases)
- 19 Cruces
- Ramal Aeropuerto

Inicio: Marzo 2023
Término: 31-Oct-2025

5,500 empleos generados


490 mil habitantes beneficiados

35 minutos de ahorro en tiempo

Nayarit

Tramo Tepic-Compostela

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	22/08/25 al 28/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Subyacente (m³)	290,689.00	273,686.49	17,002.51	4,600.00	4,750.00	
Puente 16.01 km 16+393.50						
Cortes (m³) Estabilización de taludes	2,443,497.56	2,396,372.63	47,124.93	18,500.00	21,000.00	
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	1.2	0.8	0	0.2	Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. En revisión fuerza de trabajo necesaria.

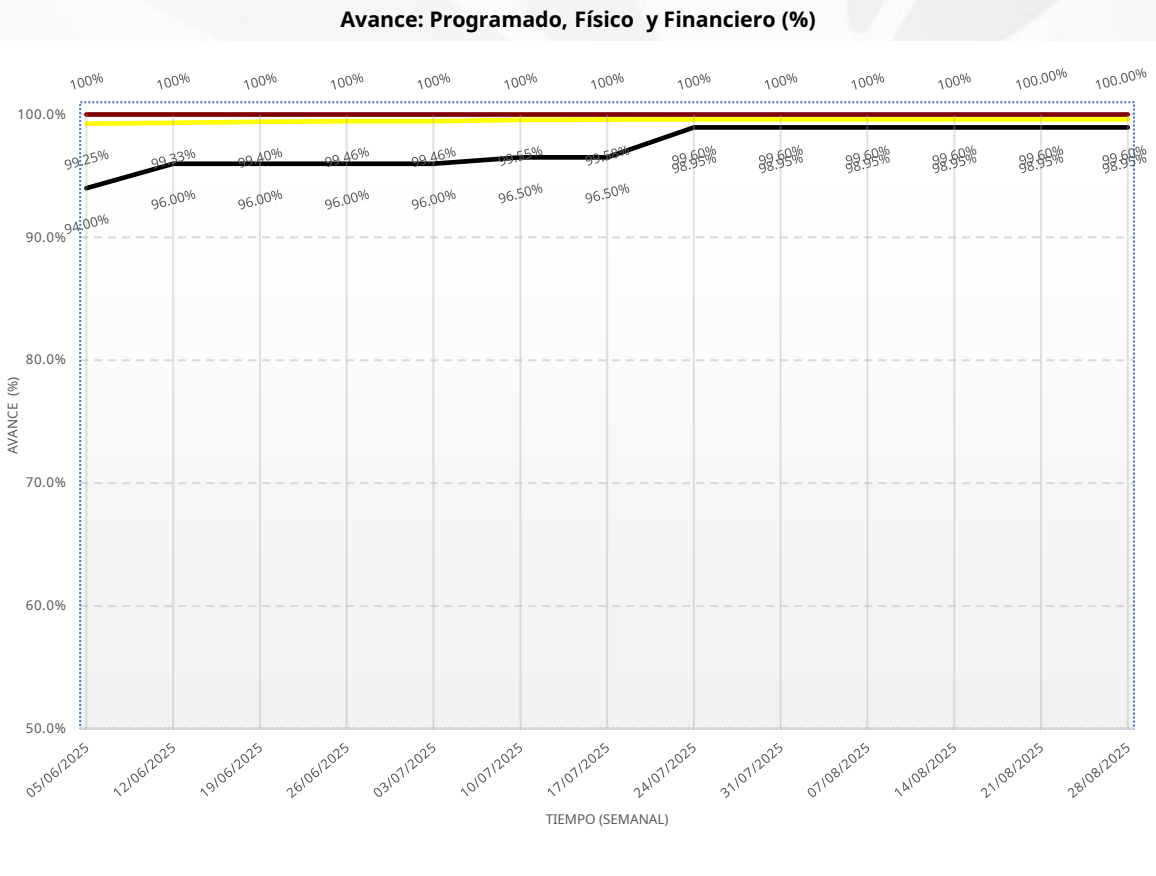

	Avance Programado	Avance Físico	Avance Financiero
	15 de agosto al 21 de agosto		22 de agosto al 28 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	480		450
Maquinaria	86		71
