


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

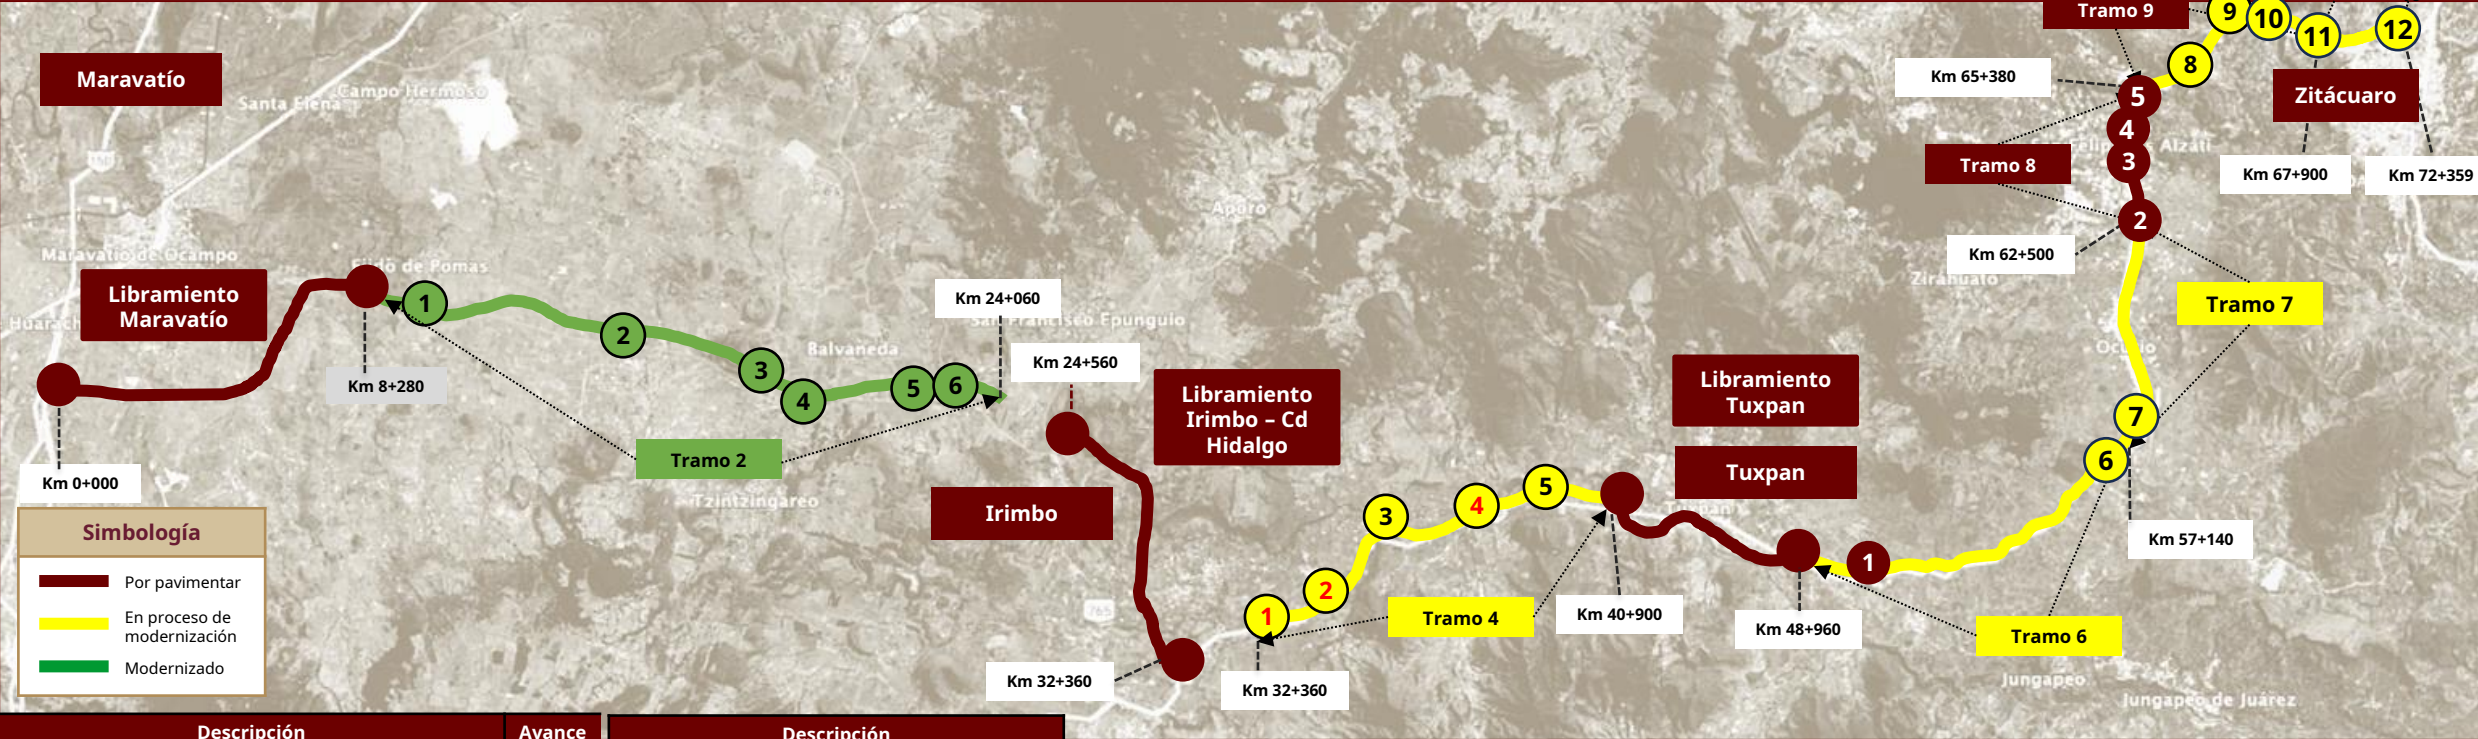

	Descripción	Avance
1	Entronque Santa Rosa km 32+420 (78.00%), Falta tendido de carpeta asfáltica.	78.00%
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420 (76.32%), Falta tendido de carpeta asfáltica.	76.32%
3	Puente Turundeo Km 36+460 (86.88%)	86.88%
4	Entronque Turundeo I km 37+550 (76.37%), Falta tendido de carpeta asfáltica.	76.37%
5	Entronque Turundeo II km 38+780 (85.56%)	85.56%
6	Entronque Jungapeo km 56+700 (62.74%)	62.74%
7	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (54.10%)	54.10%
8	Entronque Valle Verde km 67+220 (53.71%)	53.71%
9	Entronque Curungueo I Km 68+240 (34.39%)	34.39%
10	Entronque Curungueo II Km 68+780 (34.39%)	34.39%
11	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (11.24%)	11.24%
12	PSV Zitácuaro Km 72+160 (50.95%)	50.95%

	Descripción
1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Macutzio km 65+620

Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

Avance físico

- Programado: 52.37%
- Real: 45.53%
- Semanal: 0.61 %
- Financiero: 0.00%



Inversión: 4,575.3 mdp
Inversión 2020-2025: 3,321 mdp



Meta: 71.3 Km
Meta 2020-2025: 41 km



Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 30 de enero de 2027



4,800 empleos generados



126,000 habitantes beneficiados



Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán


Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 25 jul al 31 jul 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	642,459.54	63,098.46	2,714.60	7,545.25	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9
Terraplén (m3)	445,687.00	305,329.54	140,357.46	7,964.00	6,741.60	EL AVANCE DEPENDE DE LOS FRENTES DE TRABAJOS DISPONIBLES. SE ABRIERON FRENTES DE TRABAJO EN TRAMOS 6 Y 7.
Subyacente (m3)	256,097.00	215,235.55	40,861.45	1,002.11	2,003.20	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9
Subrasante (m3)	170,688.00	142,443.47	28,244.53	416.11	1,253.50	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 25 jul al 31 jul 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	86,649.48	39,009.56	429.07	1,797.01	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Bacheo (m3)	1,800.00	1,026.00	774.00	66.67	40.50	SE REALIZAN BACHEOS EN TRAMO 7 Y 9. LOS TRABAJOS DEPENDEN DE LA DISPONIBILIDAD DE FRENTES.
Fresado (m3)	10,676.00	9,507.05	1,168.95	45.33	14.91	SE REALIZAN BACHEOS EN TRAMO 7 Y 9. LOS TRABAJOS DEPENDEN DE LA DISPONIBILIDAD DE FRENTES.
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	19.46	10.78	0.31	0.42	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Geomalla (m2)	84,520.00	48,114.80	36,405.20	529.78	2,642.40	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	91,510.52	28,903.53	713.61	1,338.17	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	12,632.00	32,615.80	1,493.56	0.00	AÚN NO INICIA LA PRODUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PLANTA JUNGAPERO. EL AVANCE SE COMPENSARÁ CON EL ALTO RENDIMIENTO EN LA COLOCACION DE LA CAPA.

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 25 jul al 31 jul 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	1.10	0.00	0.00	0.01	COLADO DE LOSA DE COMPRESION EN CLARO A3 - A4,ARMADO DE LOSA EN EL CLARO A4 - A6
PIV JUNGAPEO	1.00	0.89	0.11	0.00	0.02	CONTINUA EL CORTE DE TN EN GAZAS, ARMADO DE LOSA DE COMPRESIÓN EN PIV
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.11	0.89	0.00	0.01	PERFORACIÓN Y COLADO DE PILAS DE ESTRIBO 02
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.68	0.32	0.00	0.01	ARMADO DE LOSA DE COMPRESIÓN

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

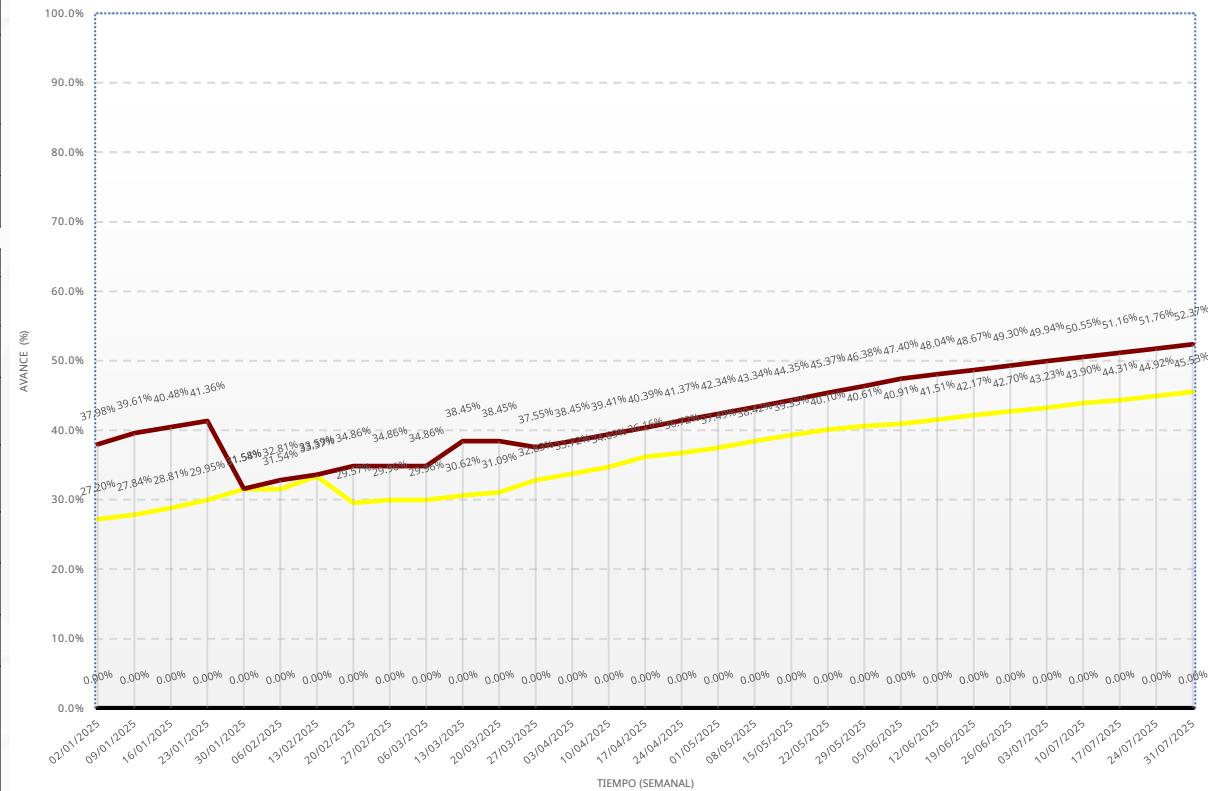

	* No presenta avance financiero	
	18 AL 24 DE JULIO	25 AL 31 DE JULIO
Fuerza de Trabajo (personas)	279	278
Maquinaria	180	182
