


# Michoacán

## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío





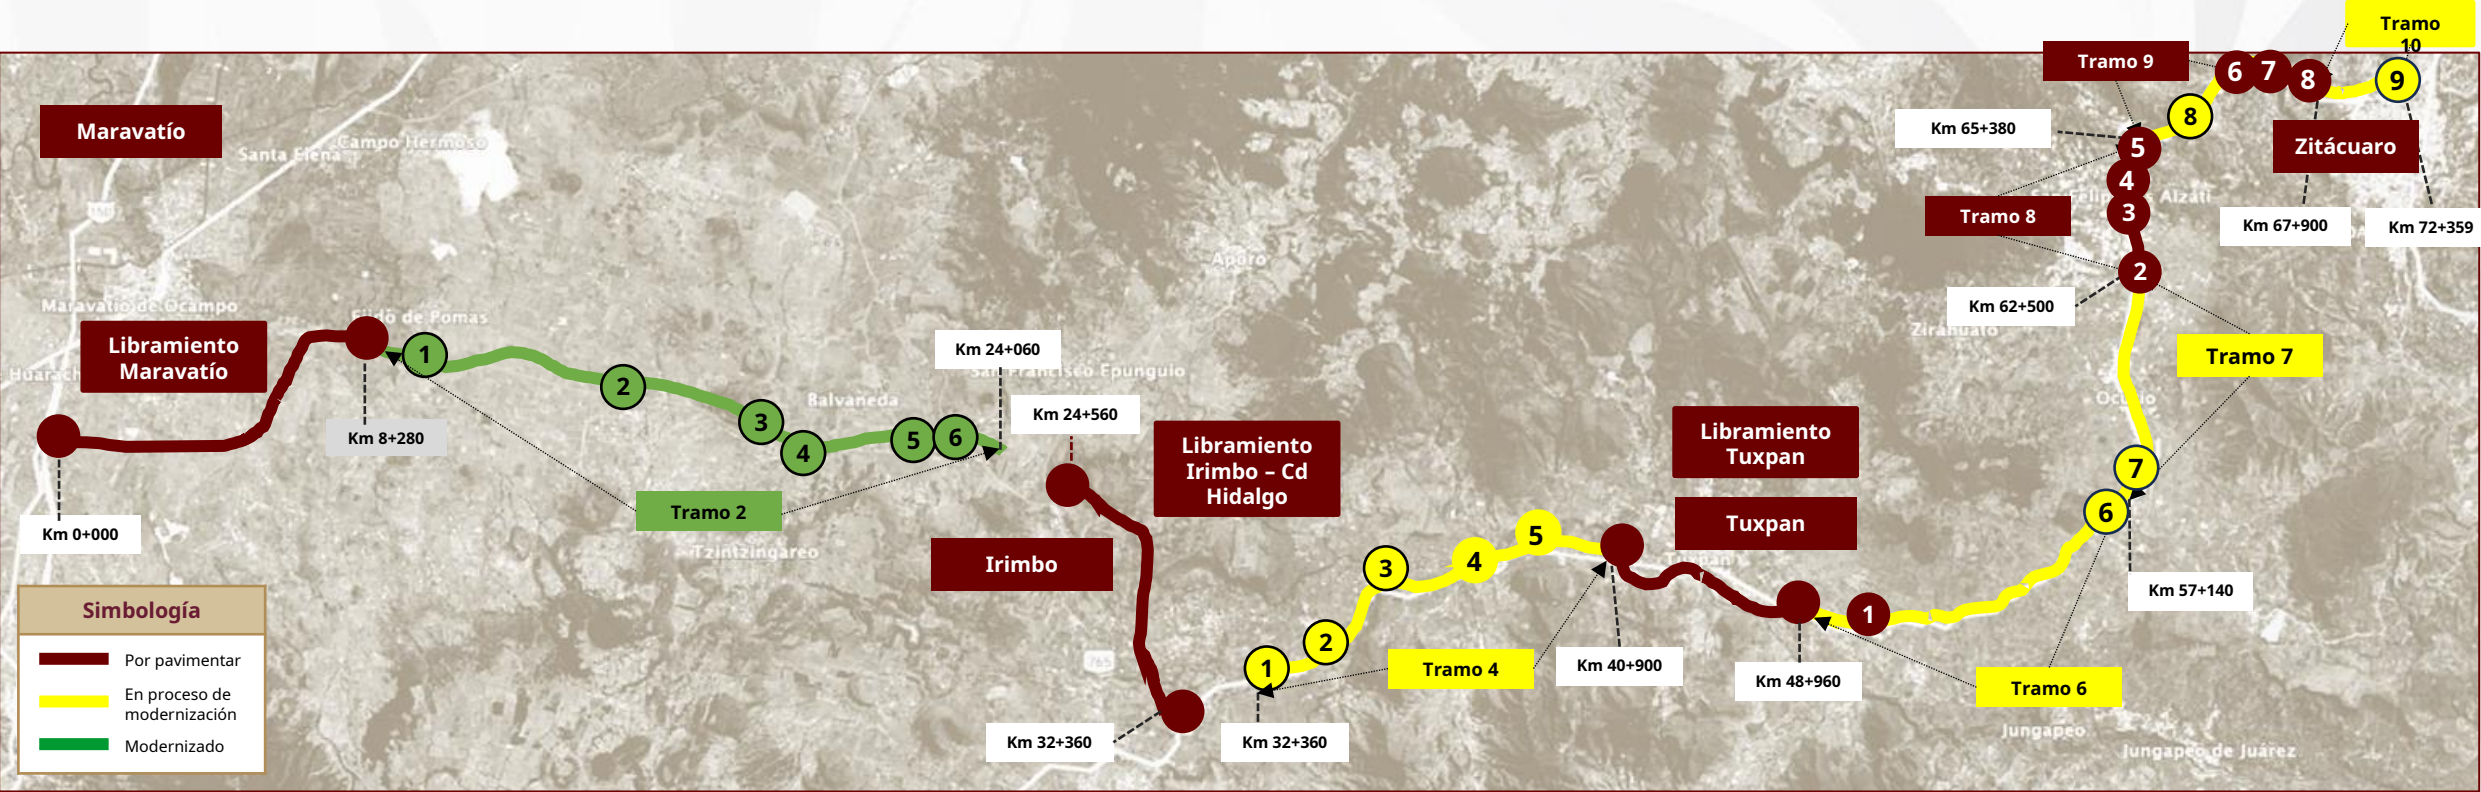


**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Descripción	
1	Entronque Santa Rosa km 32+420 <b>78.00%</b>
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420 <b>76.32%</b>
3	Puente Turundeo Km 36+460 <b>67.00%</b>
4	Entronque Turundeo I km 37+550 <b>76.37%</b>
5	Entronque Turundeo II km 38+780 <b>84.00%</b>
6	Entronque Jungapeo km 56+700 <b>50.15%</b>
7	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 <b>25.63%</b>
8	Entronque Valle Verde km 67+220 <b>38.00%</b>
9	PSV Zitácuaro Km 72+160 <b>17.30%</b>

Descripción	
1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Macutzio km 65+620
6	Entronque Curungueo I Km 68+200
7	Entronque Curungueo II Km 68+400
8	Puente San Juan Viejo Km 69+860

### Avance físico

- Programado: 46.38%
- Real: 40.61%
- Semanal: 0.51%
- Financiero: 0.00%

-  **Inversión:** 4,575.3 mdp
-  **Meta:** 71.3 Km
-  **Inicio:** 27 de enero de 2024  
**Término:** 30 de enero de 2027
-  4,800 empleos generados
-  126,000 habitantes beneficiados
-  Ahorro en tiempo: 25 min

# Michoacán

## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 23 may al 29 may 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m³)	705,558.00	608,808.92	96,749.08	1,147.27	2,683.85	CONTINÚAN TRABAJOS DE CORTE EN TRAMO 10
Terraplén (m³)	445,687.00	272,577.43	173,109.57	1,434.56	7,397.86	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Subyacente (m³)	256,097.00	204,800.22	51,296.78	693.78	66.26	EL AVANCE DEPENDE DE LOS FRENTES DE TRABAJOS DISPONIBLES.
Subrasante (m³)	170,688.00	132,691.83	37,996.17	0.00	382.53	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 23 may al 29 may 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m³)	125,659.04	72,955.16	52,703.88	728.18	836.35	CONTINUAN TENDIDOS EN TRAMOS 4 Y 6
Bacheo (m³)	1,800.00	769.50	1,030.50	40.00	87.00	SE REALIZAN BACHEOS EN TRAMO 7 Y 9
Fresado (m³)	10,676.00	9,088.49	1,587.51	22.67	11.23	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 9 Y 10
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	14.78	15.46	0.15	0.61	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 9 Y 10
Geomalla (m²)	84,520.00	30,797.60	53,722.40	3,448.89	2,196.00	DISMINUYE EL RITMO DE TRABAJO POR INTERFERENCIAS DEL TRÁNSITO LOCAL
Base Asfáltica (m³)	120,414.05	78,089.22	42,324.83	2,959.83	850.77	DISMINUYE EL RITMO DE TRABAJO POR INTERFERENCIAS DEL TRÁNSITO LOCAL
Carpeta Asfáltica (m³)	45,247.80	12,676.15	32,571.65	398.68	0.00	AÚN NO INICIA LA PRODUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PLANTA JUNGAPERO

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 23 may al 29 may 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	0.95	0.05	0.01	0.01	COLADO DE COLUMNAS EN APOYO 05, CABEZALES EN APOYOS 1 Y 3
PIV JUNGAPERO	1.00	0.79	0.21	0.00	0.02	COLADO DE ESTRIBOS Y CORTE EN GAZAS.
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.51	0.49	0.00	0.02	COLADO DE CABEZAL EN APOYOS 1 Y 4
MURO DE CONTENCIÓN MT4	200.00 ml	197.25 ml	2.75 ml	0.00 ml	1.10 ml	CIMBRADO Y COLADO DE MURO

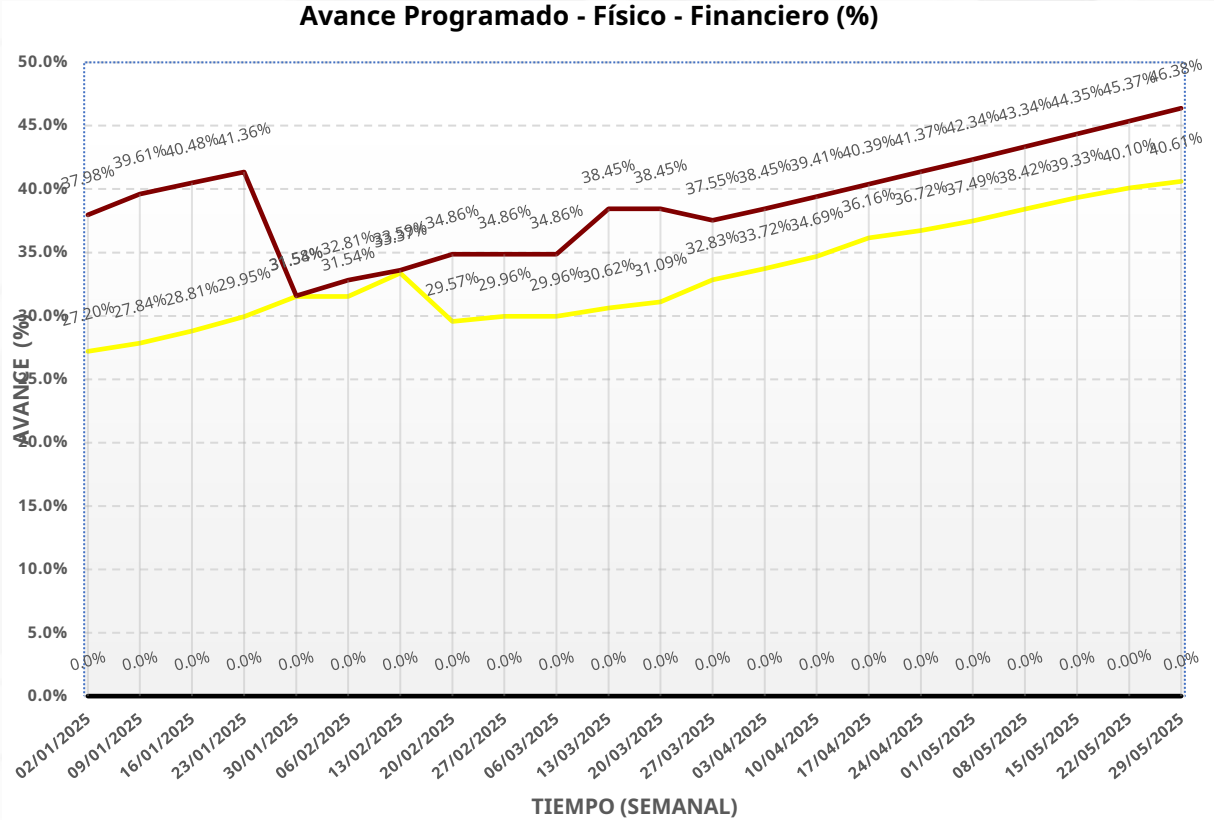

	Del 16 de mayo al 22 de mayo.	Del 23 de mayo al 29 de mayo.
Fuerza de Trabajo (personas)	281	277
Maquinaria	184	177
