


Nayarit

Tramo Tepic-Compostela



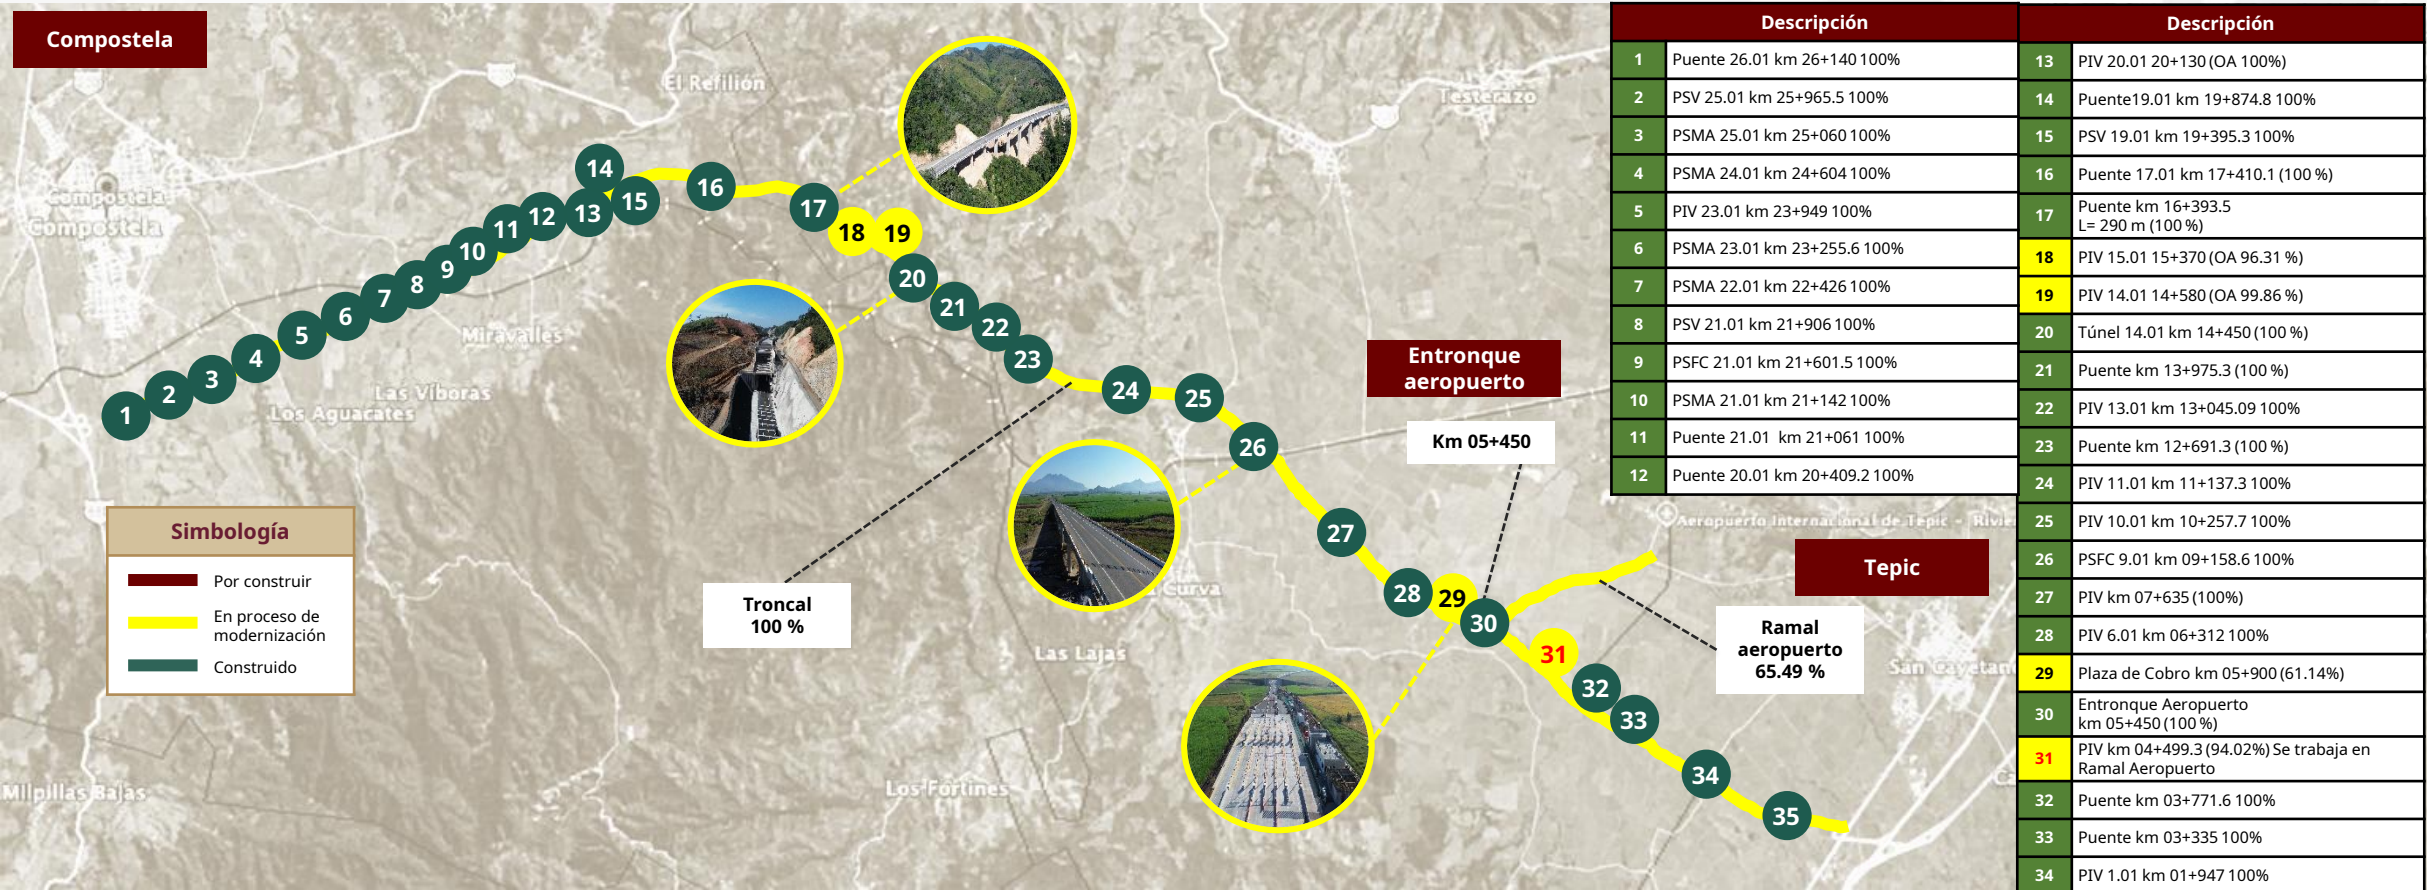

2025

Año de

La Mujer Indígena

Avance físico

• Programado: 100 %

• Real: 99.89 %

• Financiero: 96.70 %

• Semanal: 0.10 %

Concesionaria: FONADIN



Inversión: 2,473.43 mdp



Meta: 28 km. 1 Túnel Falso, 1 Plaza de cobro, 10 Puentes, 2 PSFC, 1 Entronque (solo gazas) y 1 Entronque completo (Aeropuerto), 21 Cruces y Ramal Aeropuerto



Inicio: Marzo 2023

Término: 31-Oct-2025



2,473 empleos directos generados P/MDI

4,946 empleos indirectos generados P/MDI



490 mil habitantes beneficiados



35 minutos de ahorro en tiempo

Nayarit

Tramo Tepic-Compostela




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	07/11/25 al 13/11/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	2,095,966.26	2,075,999.62	19,966.64	10,000.00	12,500.00	
Subyacente (m³)	290,689.00	276,686.49	14,002.51	2,500.00	3,000.00	

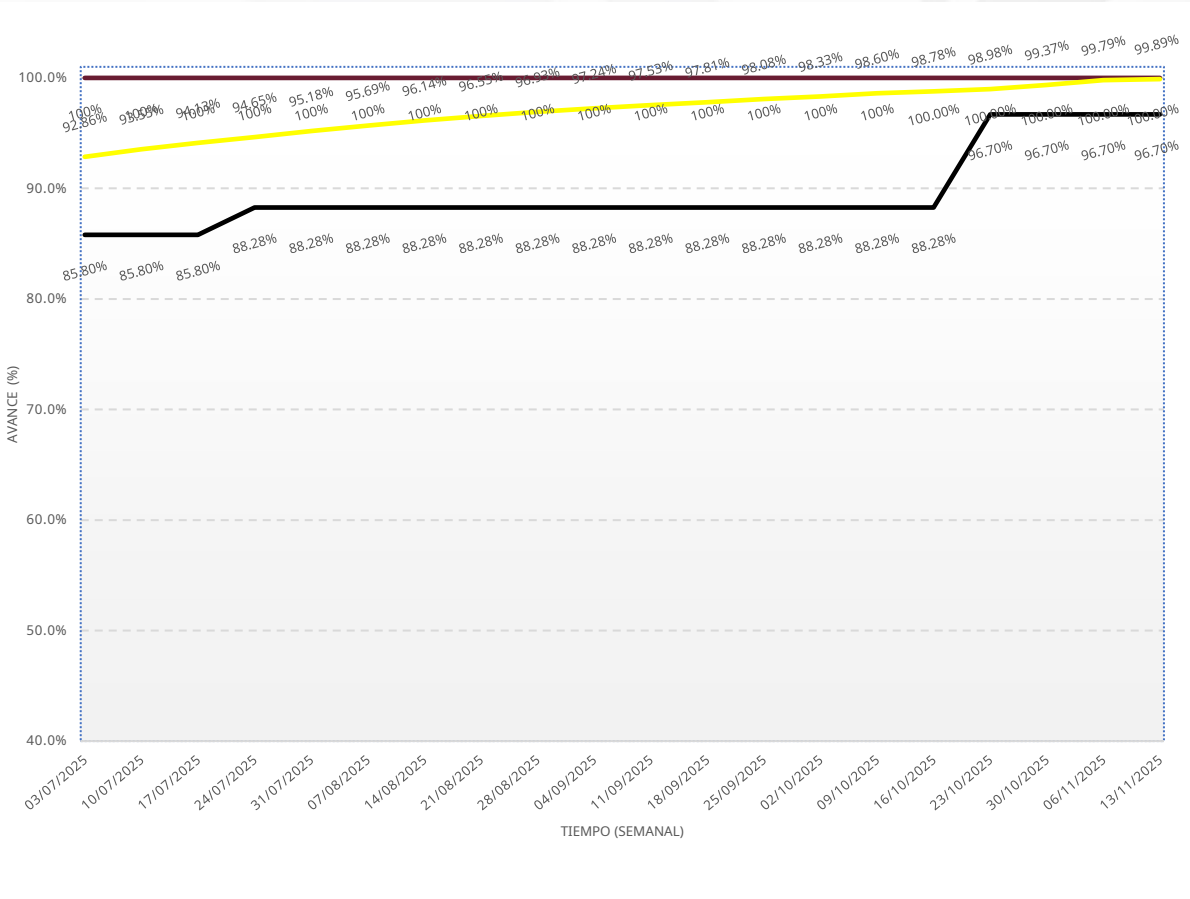

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	31 de octubre al 06 de noviembre	07 de noviembre al 13 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	450	450
Maquinaria	71	71
