


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro - Maravatío

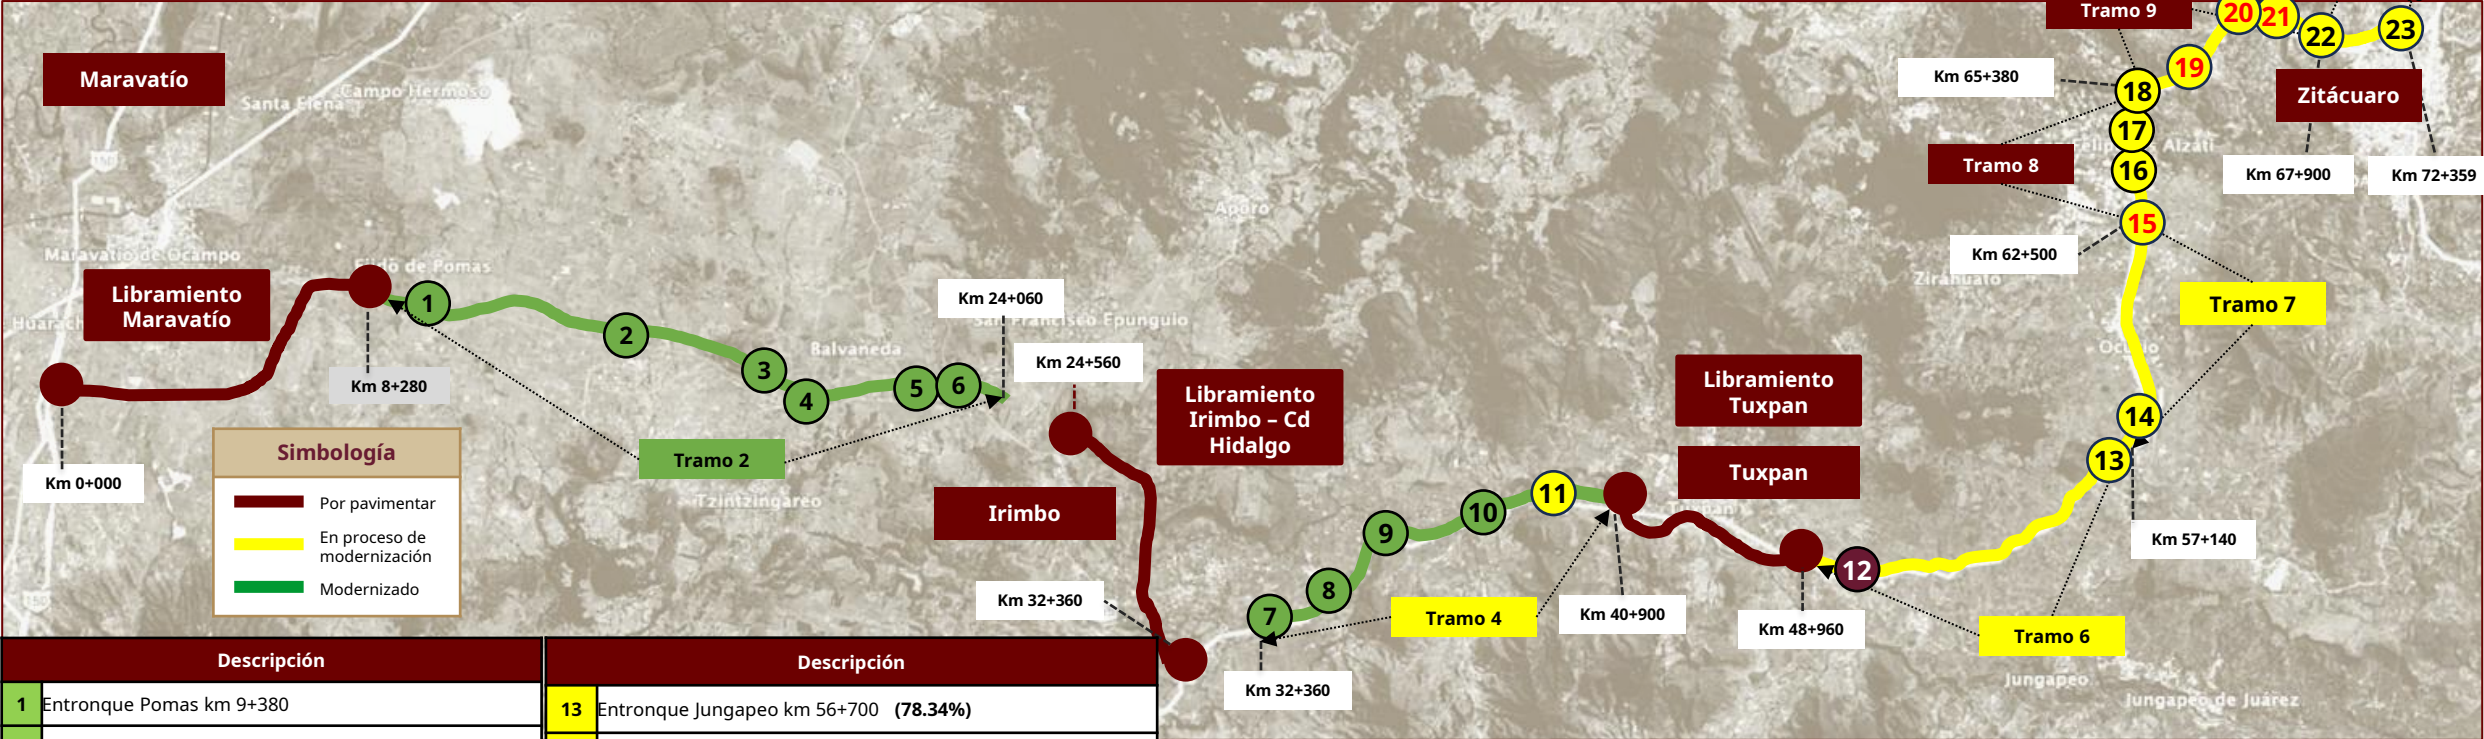

Avance físico

- Programado: 54.82% (Reprogramación T8)
- Real: 58.38%
- Semanal: 0.42%
- Financiero: 8.11%

Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.



Inversión: 4,575.3 mdp



4,800 empleos generados



Meta: 71.3 Km



126,000 habitantes beneficiados



Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026



Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán


Modernización Carretera Zitácuaro - Maravatío

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 09 ene al 15 ene 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	735,962.04	-30,404.04	2,847.33	4,656.78	
Terraplén (m3)	445,687.00	373,763.38	71,923.62	698.67	2,779.88	
Subyacente (m3)	256,097.00	250,898.99	5,198.01	1,909.00	1,237.52	SE INICIAN TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MODIFICACIÓN DE TRAZO T9
Subrasante (m3)	170,688.00	163,878.77	6,809.23	1,505.33	446.09	SE INICIAN TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MODIFICACIÓN DE TRAZO T9

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 09 ene al 15 ene 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	114,716.79	10,942.25	1,640.62	817.41	SE ESTÁ N TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7.
Bacheo (m3)	1,800.00	1,657.75	142.25	22.22	15.00	SE ESTÁ N TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7.
Fresado (m3)	10,676.00	10,621.03	54.97	4.00	20.06	
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	28.29	1.95	1.59	0.12	SE ESTÁ N TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7.
Geomalla (m2)	84,520.00	78,668.60	5,851.40	311.11	572.40	
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	115,432.44	4,981.61	656.89	949.42	
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	26,373.74	18,874.06	394.40	1,008.20	

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 09 ene al 15 ene 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PIV JUNGAPERO	1.00	1.0054	0.0000	0.0000	0.0007	CONTINÚA EL CORTE DE TN EN GASAS Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
PSV SAN FELIPE	1.00	0.3491	0.6509	0.0006	0.0144	TENDIDO DE BASE ASFÁLTICA
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.8879	0.1121	0.0212	0.0096	COLOCACIÓN DE PARAPETO
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.8905	0.1095	0.0104	0.0143	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE SALIDA.
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	66,239.81 ml	90,897.79 ml	0.00 ml	3,442.57 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4
CUNETA	12,028.95 ml	10,482.14 ml	1,546.81 ml	0.00 ml	34.40 ml	CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN EN TRAMO 4 Y TRAMO 6.
BOTONES	12,041.00 pza	7,955.00 pza	4,086.00 pza	0.00 pza	291.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.

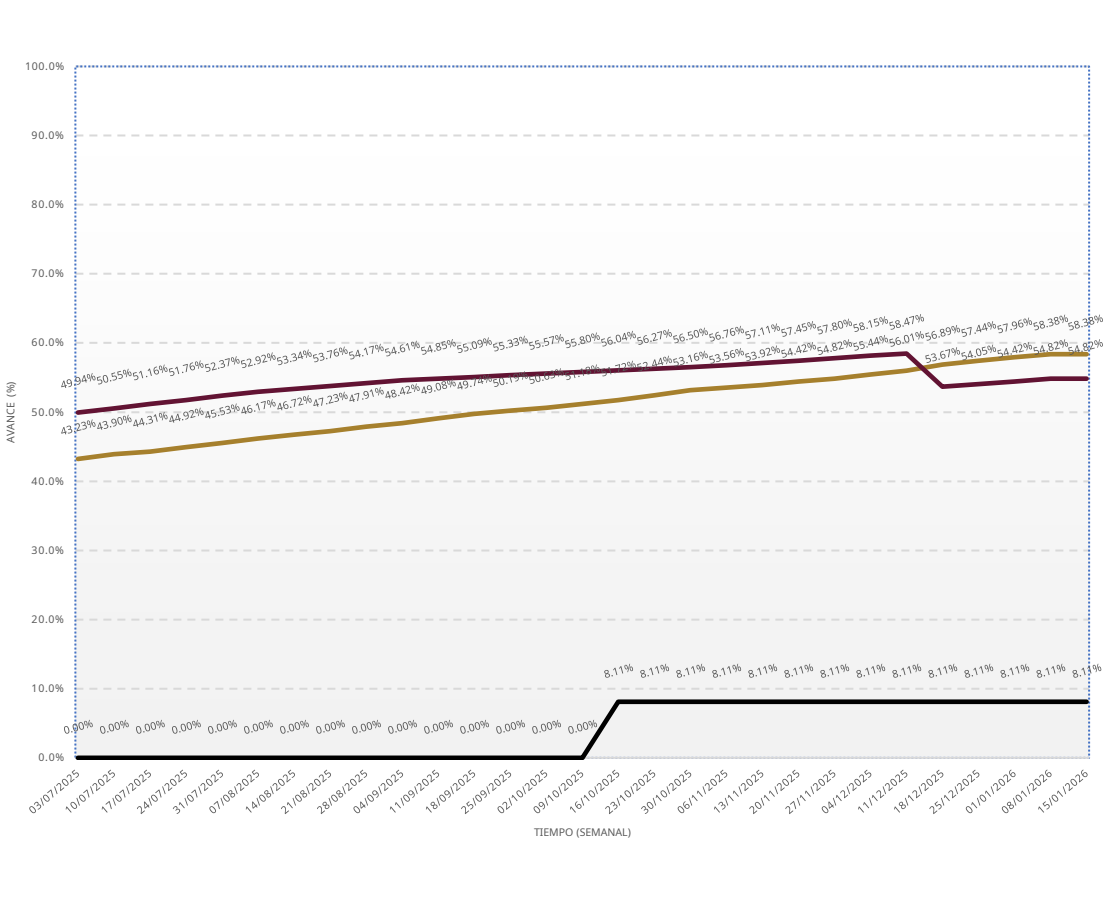

	Del 02 al 08 ene 26	Del 09 al 15 ene 26
Fuerza de Trabajo (personas)	287	289
Maquinaria	191	189
Frentes de trabajo (totales)	26	31
