

# Colima

## Tramo Armería-Manzanillo


Avance físico

• Programado: 91.53%

• Semanal: 0.49 %

• Real: 33.18%


• Financiero: 20.79%

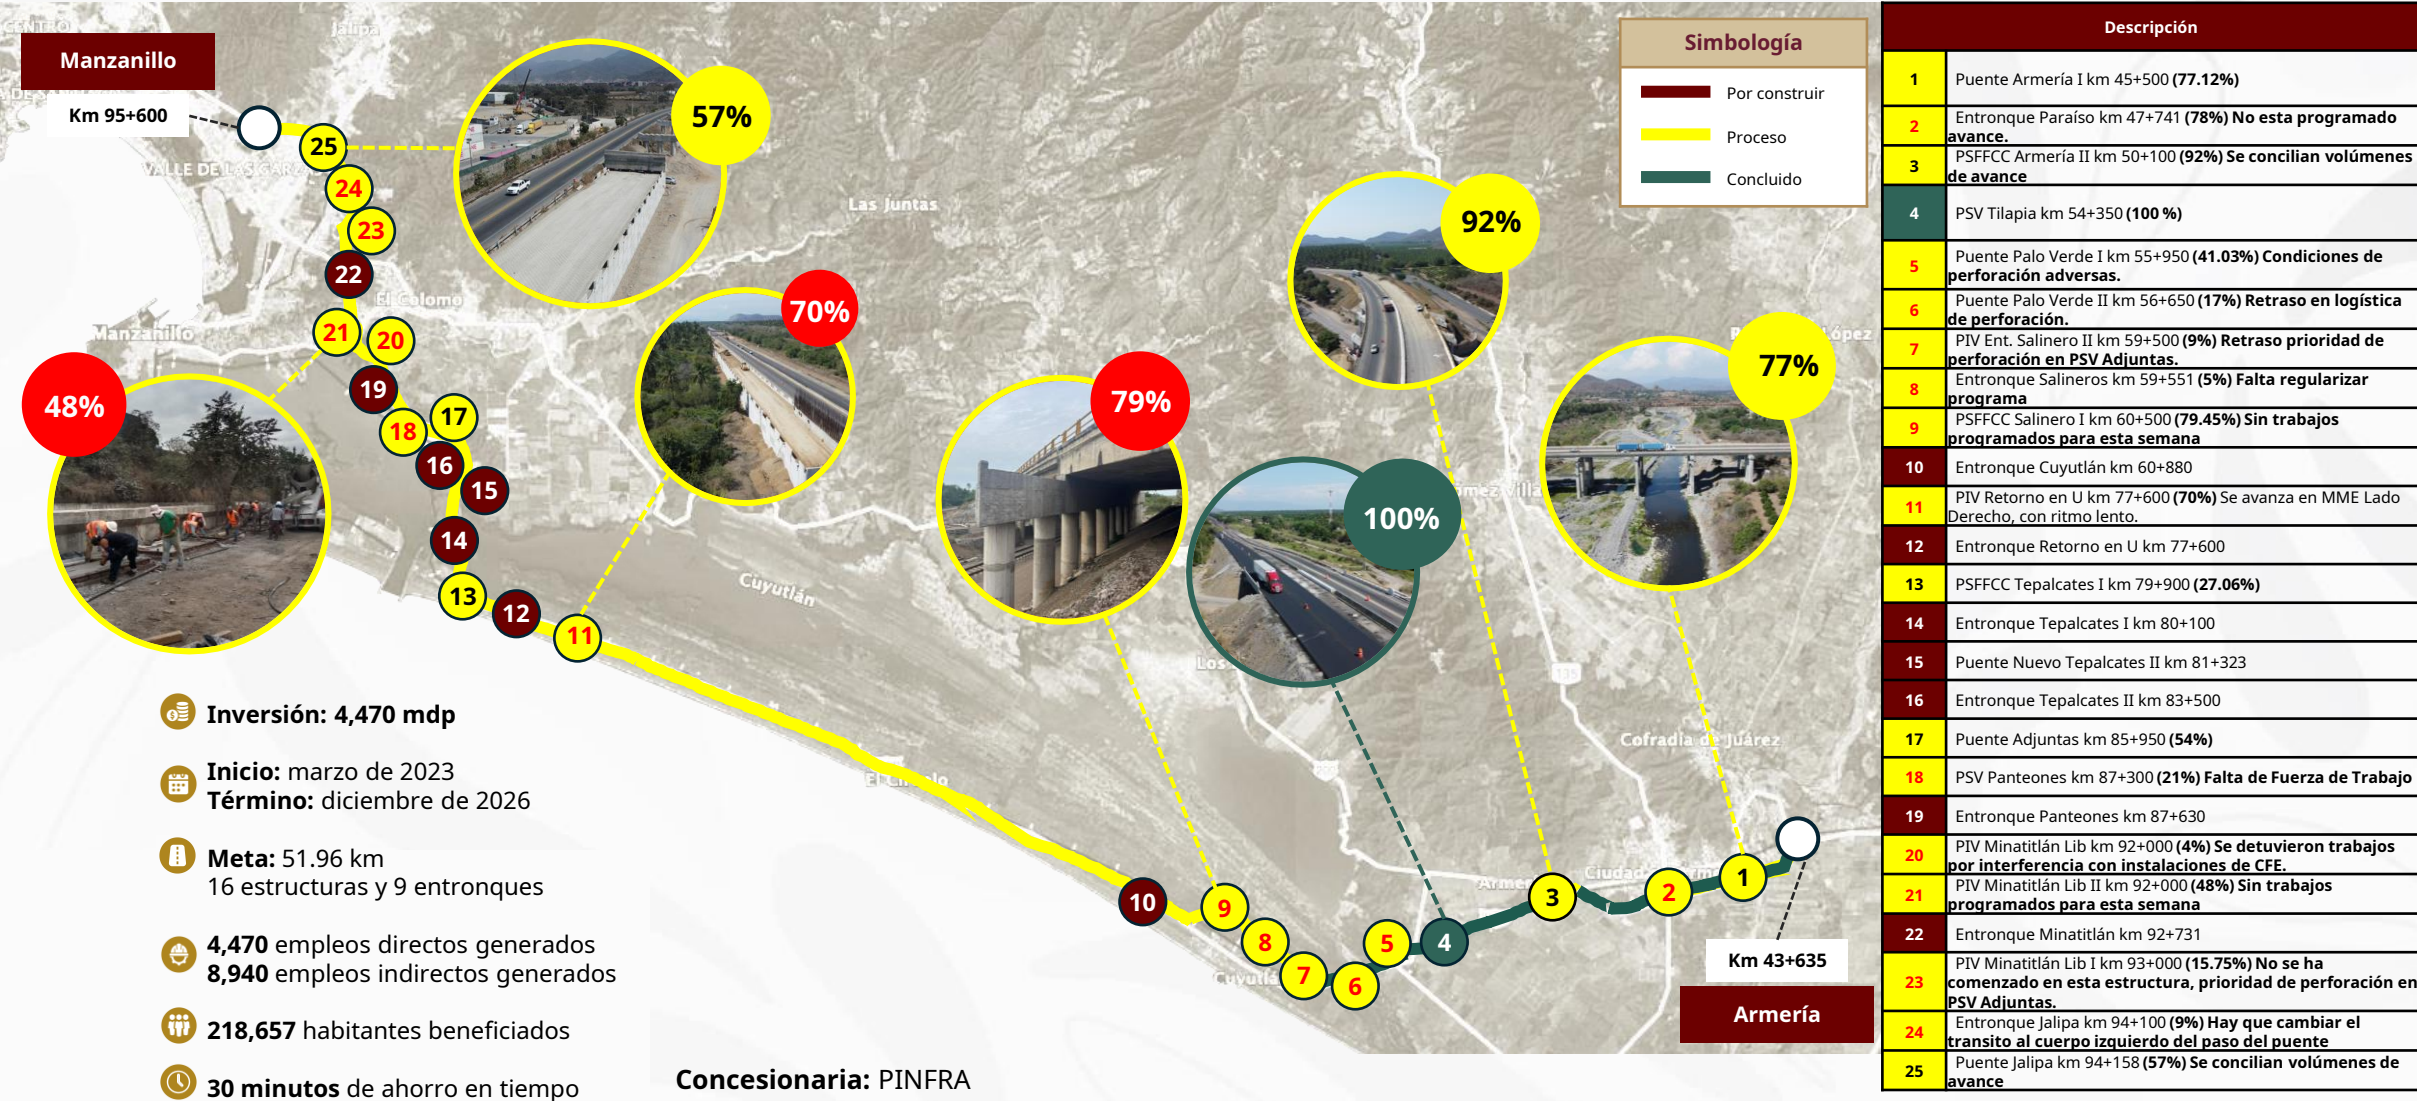

# Colima

## Tramo Armería-Manzanillo

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

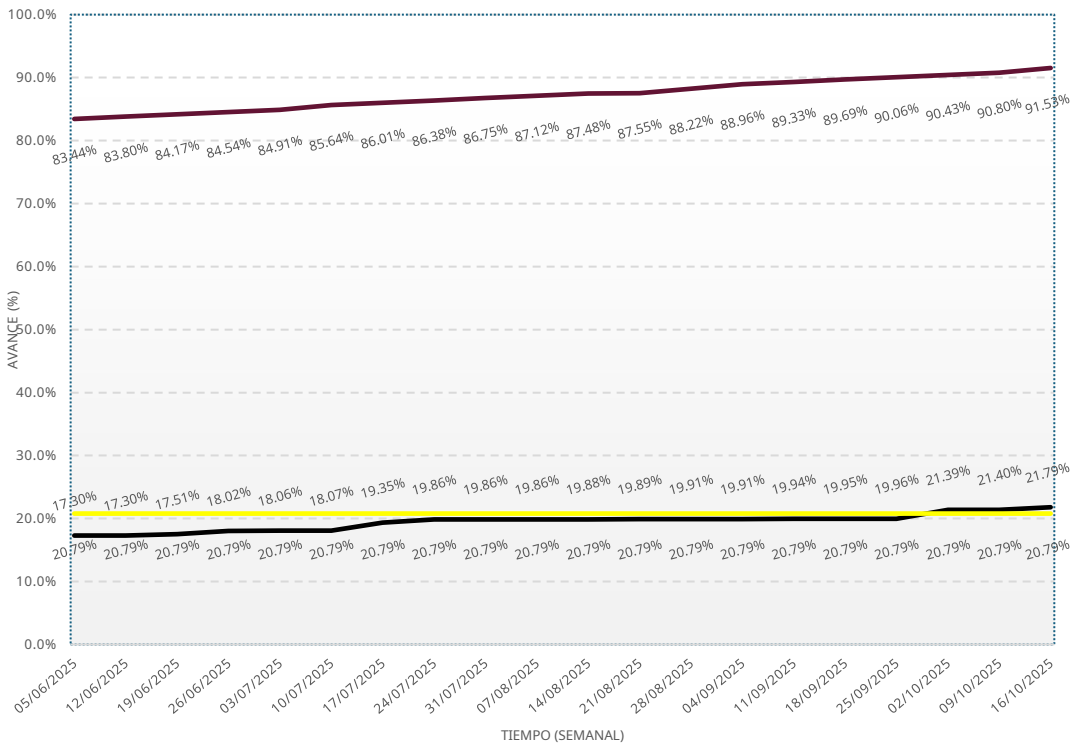

Nota: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	10/10/25 al 16/10/25		Observaciones
		acumulado		Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	265,564	0	0	0	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	506,456	307,454	0	1,188	
Base y sub base (m³)	260,119	147,337	112,782	0	1,537	



	03 de octubre al 09 de octubre	10 de octubre al 16 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	138	114
Maquinaria	60	43
