

Colima

Tramo Armería-Manzanillo




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 87.48%
- Semanal: 1.80 %
- Real: 28.84 %
- Financiero: 20.79%

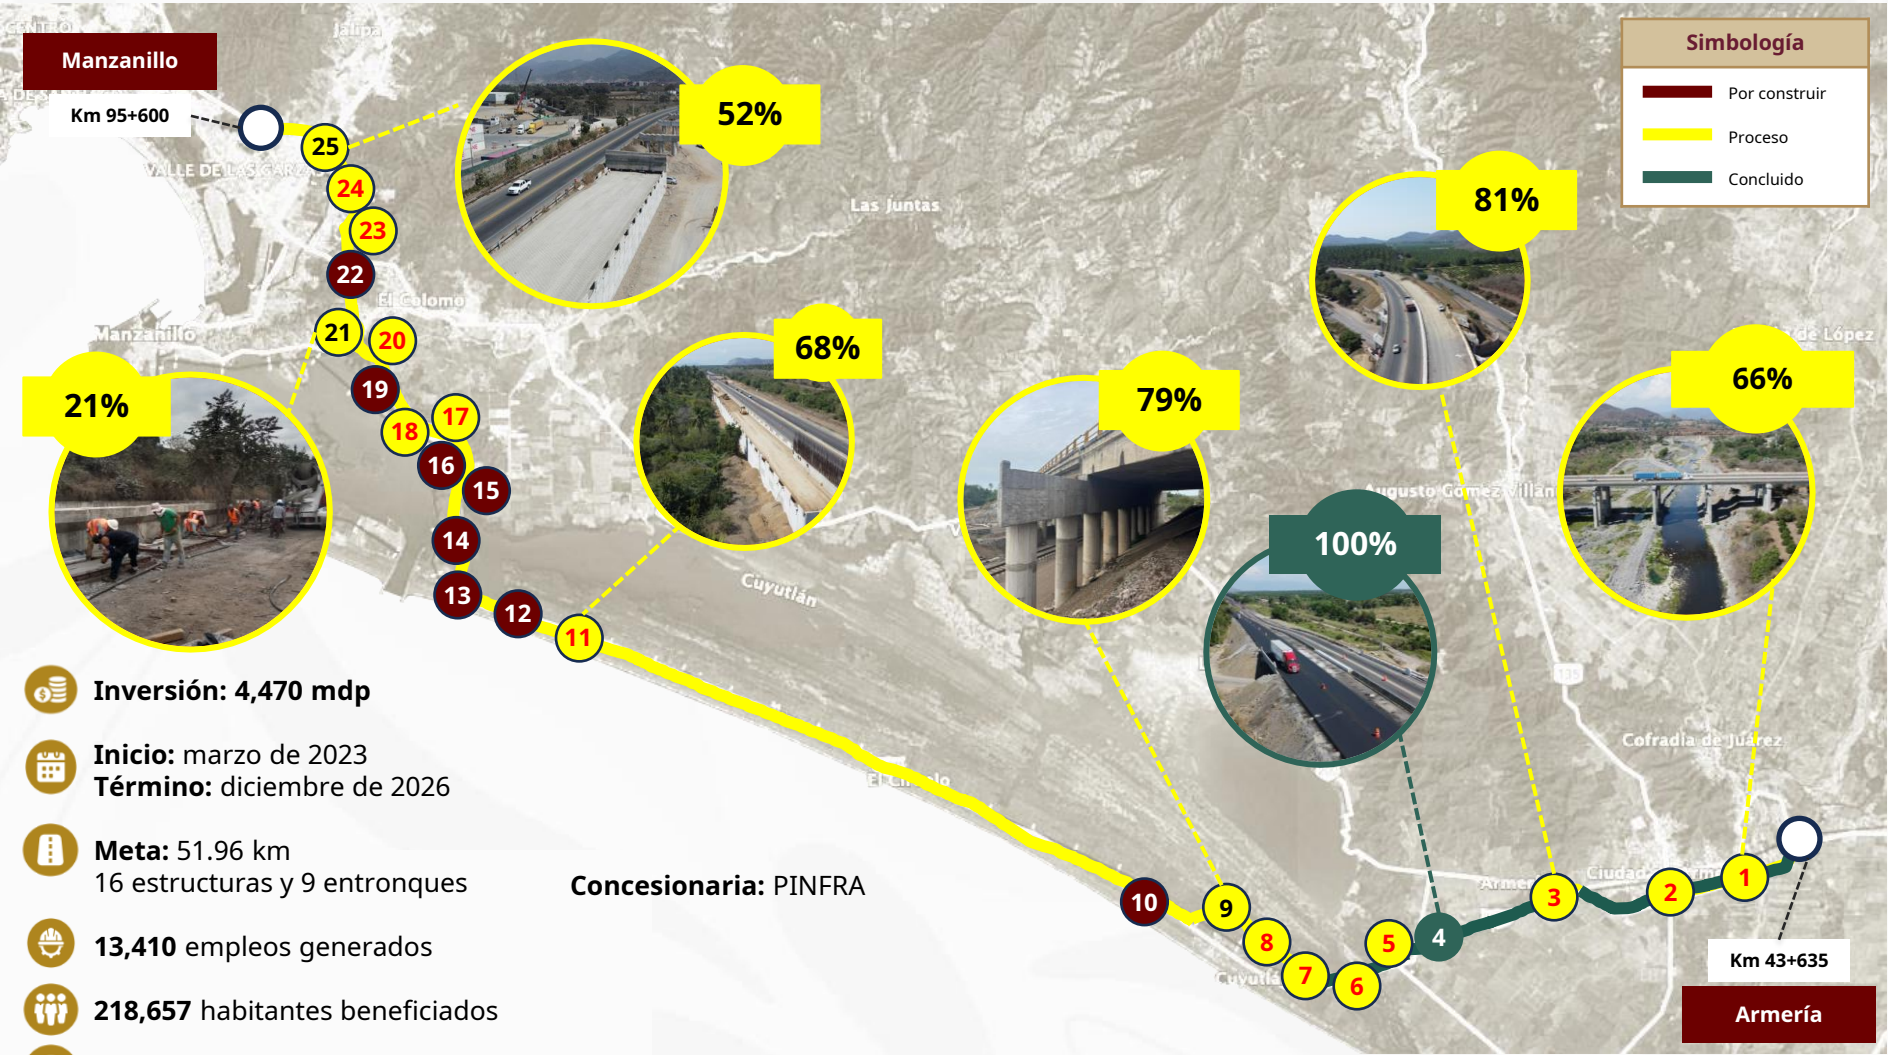

Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (66%) Falta de personal operativo
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (81%) Se trabaja en cimbra de losas CI
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (41%) Cambió el orden del programa de ejecución
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (17%) Retraso en logística de perforación
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (9%) Retraso en logística de demolición de PIV
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) Falta regularizar programa
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (79%)
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (68%) Falta aumentar Fuerza de Trabajo
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (36%) No esta programado avance
18	PSV Panteones km 87+300 (21%) Falta de Fuerza de Trabajo
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib km 92+000 (4%) Se trabajó en otras prioridades
21	PIV Minatitlán Lib II km 92+000 (21%)
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (6%) Se detuvieron los trabajos por interferencia ferrocarril Peña Colorada
24	Entronque Jalipa km 94+100 (9%) Hay que cambiar el tránsito al cuerpo izquierdo del paso del puente
25	Puente Jalipa km 94+158 (52%)

NOTA: La fecha de término se obtuvo de un programa provisional entregado por concesionaria. En proceso de regularizar.


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	08/08/25 al 14/08/25		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	261,836	0	0	924	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	484,500	329,409	0	1,997	
Base y sub base (m³)	260,119	130,574	129,545	0	1,315	

*Nota: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente

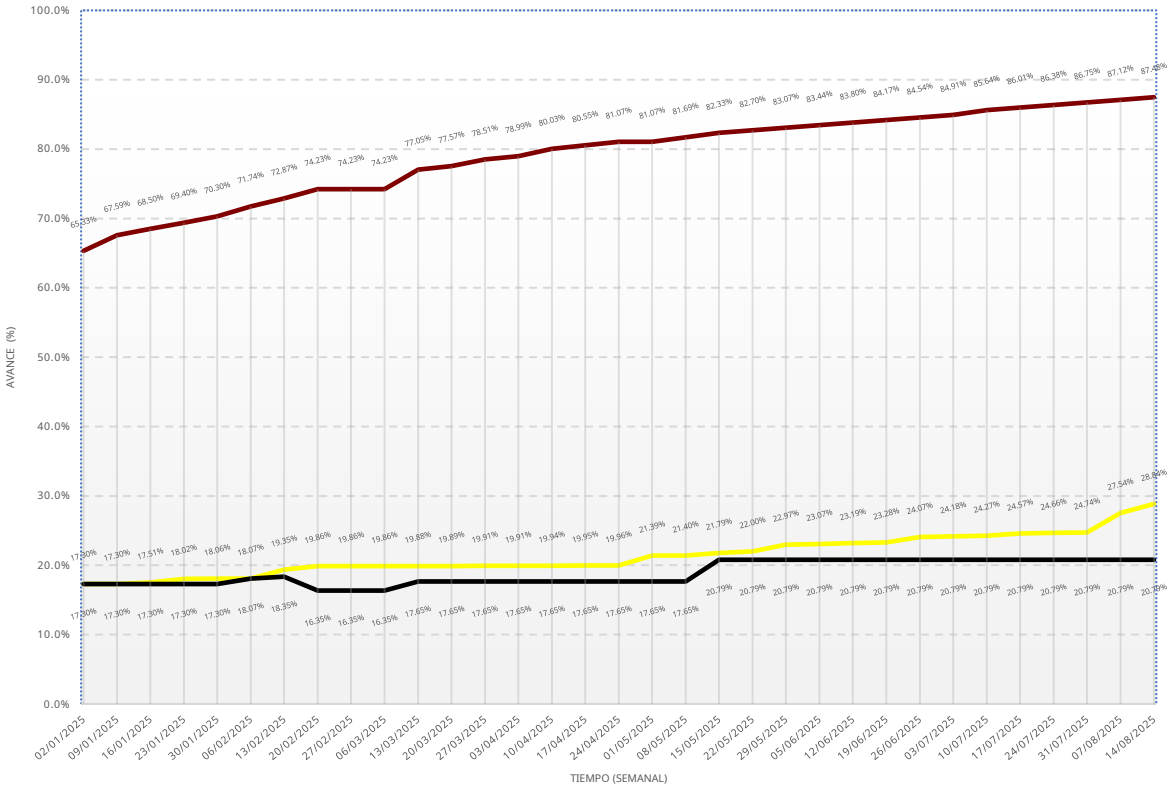

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	01 de agosto al 07 de agosto	08 de agosto al 14 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	180	181
Maquinaria	75	71



2025
Año de
La Mujer
Indígena
