


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro - Maravatío



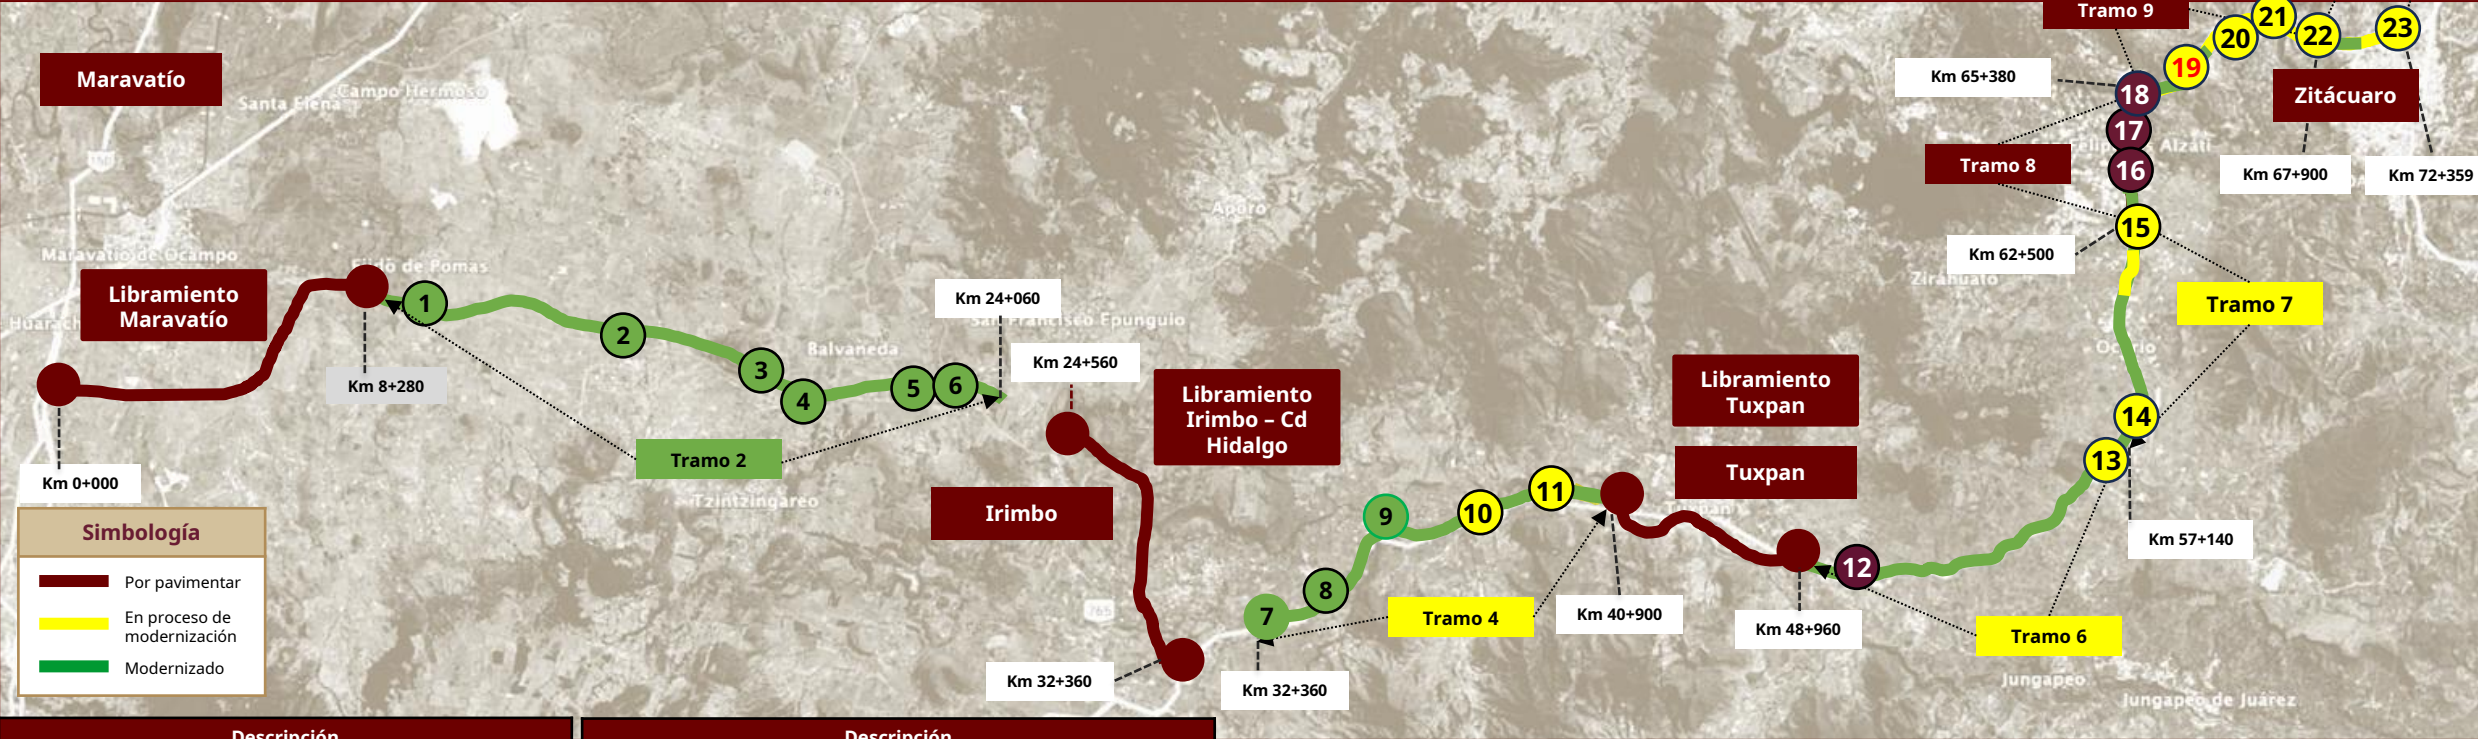

Descripción		Descripción	
1	Entronque Pomas km 9+380	13	Entronque Jungapeo km 56+700 (73.19%)
2	Entronque San Vicente km 14+500	14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (67.29%)
3	PIP km 18+370	15	Entronque Zirahuato km 62+500 (46.10%)
4	Entronque Zinzingareo km 18+700	16	Entronque San Felipe I km 64+400 (0.00%), Sin Iniciar
5	Entronque Senguio km 21+280	17	Entronque San Felipe II Km 64+640 (0.00%), Sin Iniciar
6	PIP km 22+280	18	Entronque Macutzio km 65+620 (0.00%), Sin Iniciar
7	Entronque Santa Rosa km 32+420	19	Entronque Valle Verde km 67+220 (69.04%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500	20	Entronque Curungueo I Km 68+240 (70.82%)
9	Puente Turundeo Km 36+460 (100.00%)	21	Entronque Curungueo II Km 68+780 (70.82%)
10	Entronque Turundeo I km 37+550 (99.95%)	22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (83.68%)
11	Entronque Turundeo II km 38+780 (99.74%)	23	PSV Zitácuaro Km 72+160 (83.61%)
12	Puente Obispo Km 50+400 (0.00%), Sin Iniciar		


Avance físico


- Programado: 58.15%
- Real: 55.44%
- Semanal: 0.62%
- Financiero: 8.11%


Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.


**Inversión:** 4,575.3 mdp

**Meta:** 71.3 Km

**Inicio:** septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026

4,800 empleos generados

126,000 habitantes beneficiados

Ahorro en tiempo: 25 min


Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro - Maravatío

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 28 nov al 04 dic 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	714,293.45	-8,735.45	2,706.96	1,695.12	INICIAN TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL TRAMO 8
Terraplén (m3)	445,687.00	362,139.27	83,547.73	3,108.00	1,857.04	INICIAN TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL TRAMO 8
Subyacente (m3)	256,097.00	243,561.32	12,535.68	252.96	854.91	
Subrasante (m3)	170,688.00	160,345.83	10,342.18	551.28	470.07	INICIAN TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL TRAMO 8
PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 28 nov al 04 dic 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	108,258.07	17,400.97	1,351.25	1,249.89	INICIAN TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL TRAMO 8
Bacheo (m3)	1,800.00	1,455.25	344.75	12.00	63.75	
Fresado (m3)	10,676.00	10,292.41	383.59	33.60	91.94	
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	26.47	3.77	0.57	0.61	
Geomalla (m2)	84,520.00	74,355.40	10,164.60	0.00	471.00	
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	106,830.38	13,583.67	576.12	1,672.79	
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	23,284.78	21,963.02	84.72	257.24	
ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 28 nov al 04 dic 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	1.45	0.00	0.00	0.05	TRABAJOS CONCLUIDOS
PIV JUNGAPEO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.10	CONTINÚA EL CORTE DE TN EN GASAS Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.60	0.40	0.00	0.02	MONTAJE DE TABLETAS
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.90	0.10	0.00	0.00	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO Y SALIDA.
DEFENSA METÁLICA	31,302.00 ml	23,704.55 ml	7,597.45 ml	0.00 ml	485.35 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	58,064.14 ml	99,073.47 ml	0.00 ml	3,010.42 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.
CUNETAS	12,028.95 ml	9,966.18 ml	2,062.77 ml	0.00 ml	120.39 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4 Y TRAMO 6.
BOTONES	12,041.00 pza	5,791.00 pza	6,250.00 pza	0.00 pza	1,076.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACIÓN EN TRAMO 4.

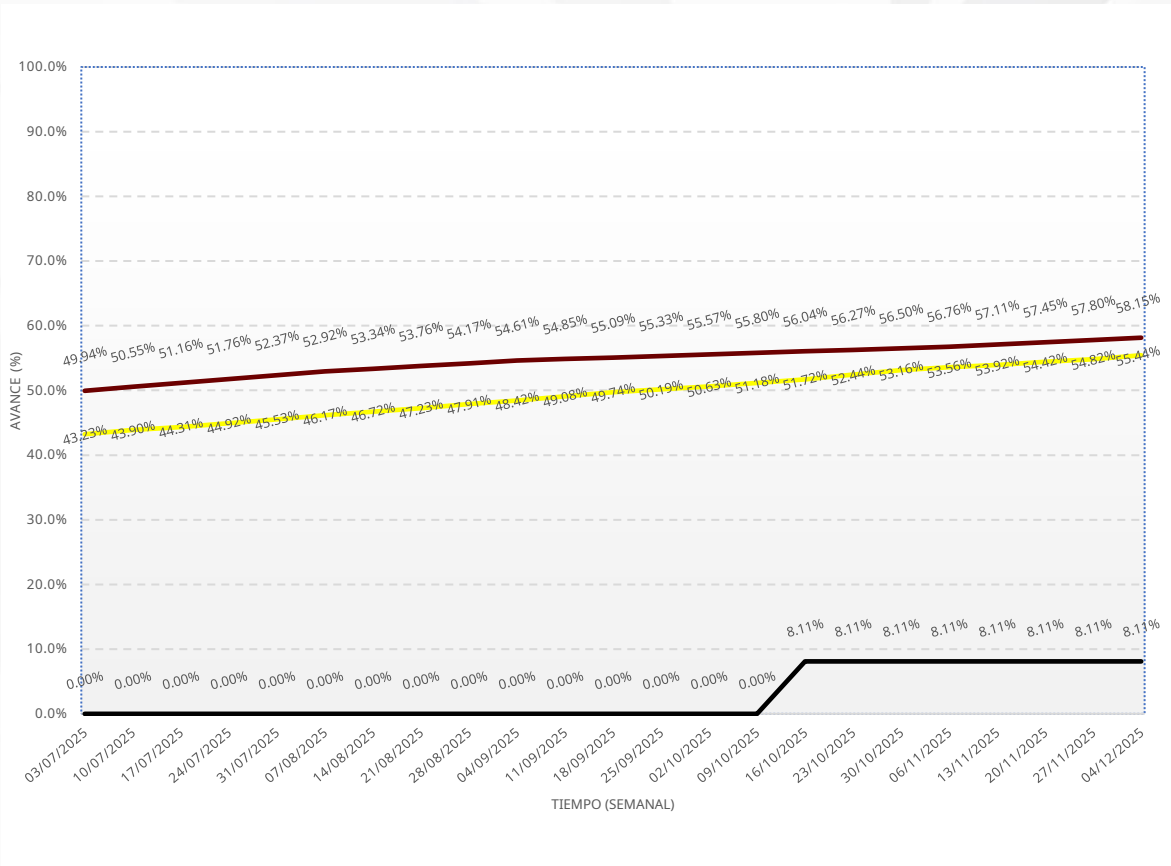

Avance Programado

Avance Físico

*Avance Financiero

* No presenta avance financiero

	21 AL 27 NOVIEMBRE 25	28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 25
Fuerza de Trabajo (personas)	289	287
Maquinaria	192	195
Frente de trabajo	Tramos 4, 6, 7, 8 y 10	Tramos 4, 6, 7, 8 y 10
