


Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 14.30 %
- Real: 14.85 %
- Semanal: 0.67 %
- Financiero: 0%

- Fuerza de trabajo : 21,147 personas
- Empleos directos : 7,049 personas
- Empleos indirectos : 14,098 personas

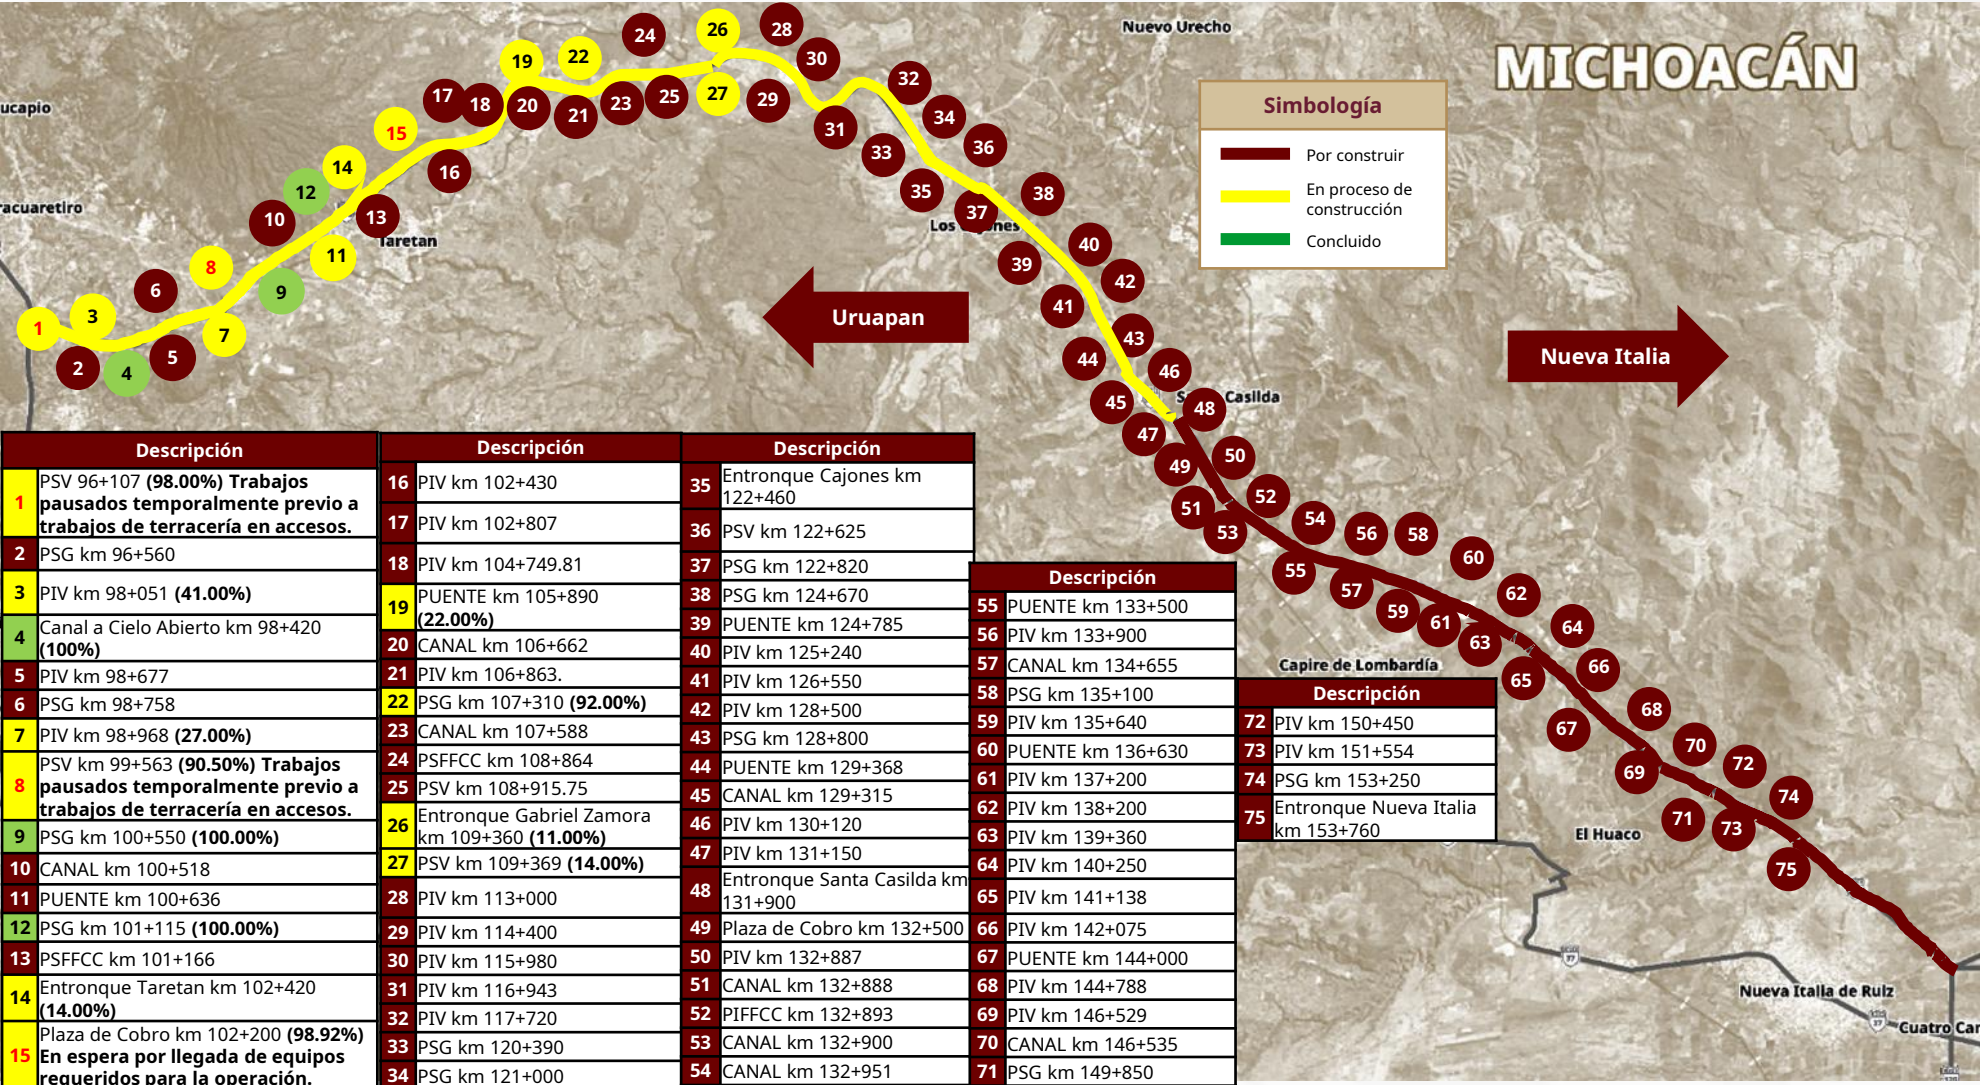

-  **Inversión: 7,049 mdp**
-  **Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
-  **Meta: 67.09 km**
65 km (tronal)
2.09 km (estructuras)
2 plazas de cobro, 10 puente,
5 entronques, 65 cruces y
múltiples obras de drenaje.
-  **21,147** empleos generados
-  **1,800,000** habitantes beneficiados
-  **25 minutos** de ahorro en tiempo
- Concesionaria : PINFRA.**

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia


| Elemento | Meta | Ejecutado acumulable | Faltante | 04/12/2025 al 11/12/2025 | | Observaciones |
|--|-------|----------------------|----------|--------------------------|-----------|--|
| | | | | Programad o | Ejecutado | |
| Carpeta Asfáltica | 65 km | 5.50 km | 59.50 km | .500 km | .500 km | |
| Base Asfáltica | 65 km | 7.30 km | 56.70km | .300 km | .300 km | |
| Base Hidráulica | 65 km | 8.20 km | 56.80 km | .200 km | .200 km | |
| Subbase | 65 km | 9.10 km | 55.90 km | .200 km | .200 km | |
| Subyacente | 65 km | 11.20 km | 53.80 km | .200 km | .200 km | |
| Km 98+051 PIV Caballetes | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Armado de acero y colado de concreto hidráulico para caballete |
| Km 100+636 Puente Cimentación profunda | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | Cimentación profunda para pilas pilotes |
| Km 105+890 Puente Subestructur a | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | Colado de concreto para columnas |
| Km 109+369 PSV Subestructur a | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Colado de concreto de alero en estribo No 2 |



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

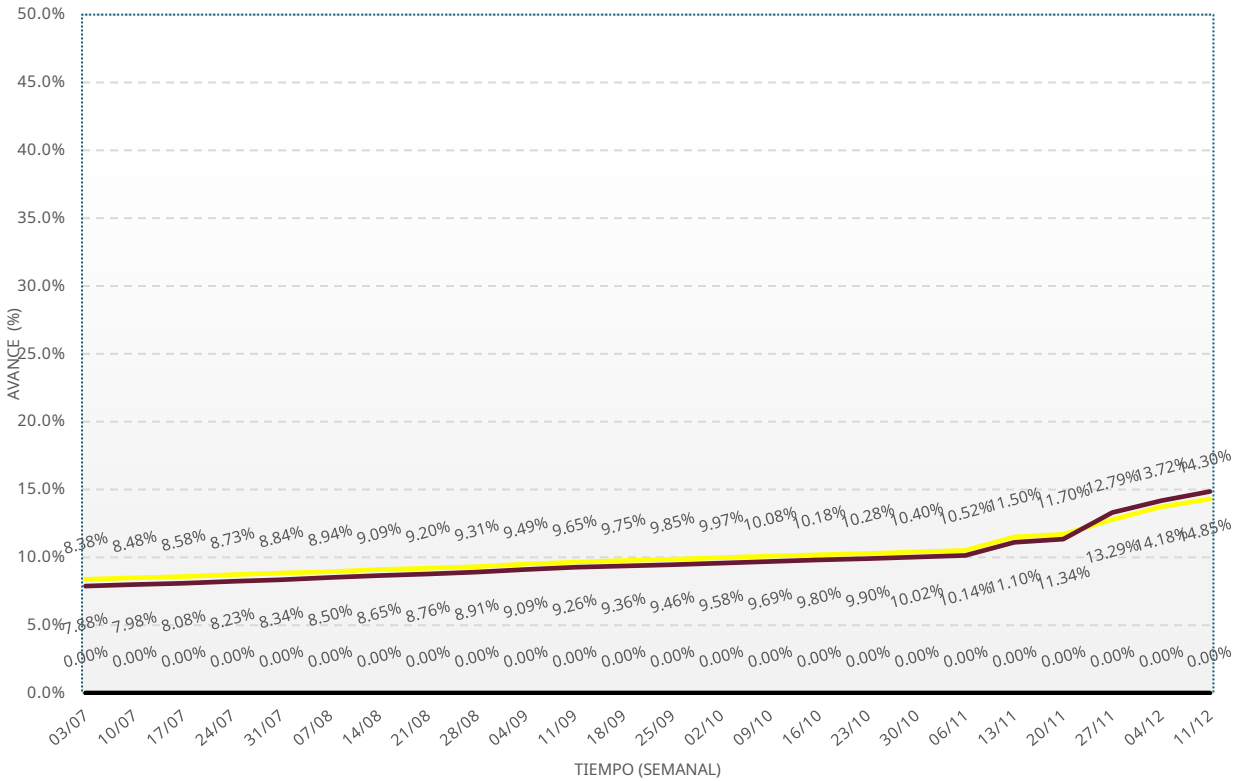

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

| | Del 27 de noviembre al 04 de diciembre. | Del 04 de diciembre al 11 de diciembre. |
|------------------------------|---|---|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 800 | 800 |
| Maquinaria | 245 | 245 |
| Frentes de trabajo | PIV 98+051; PIV 98+968; Puente 105+890;PSG 107+310; PSV 109+369 | Troncal 95+000 a 140+000.PIV km 98+051 PIV km 98+968.Entronque Taretan km 102+420,Puente km 105+890,PSG km 107+310,Entronque Gabriel Zamora km 109+360 PSV km 109+369 |



2025
Año de
La Mujer Indígena
