


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno ok

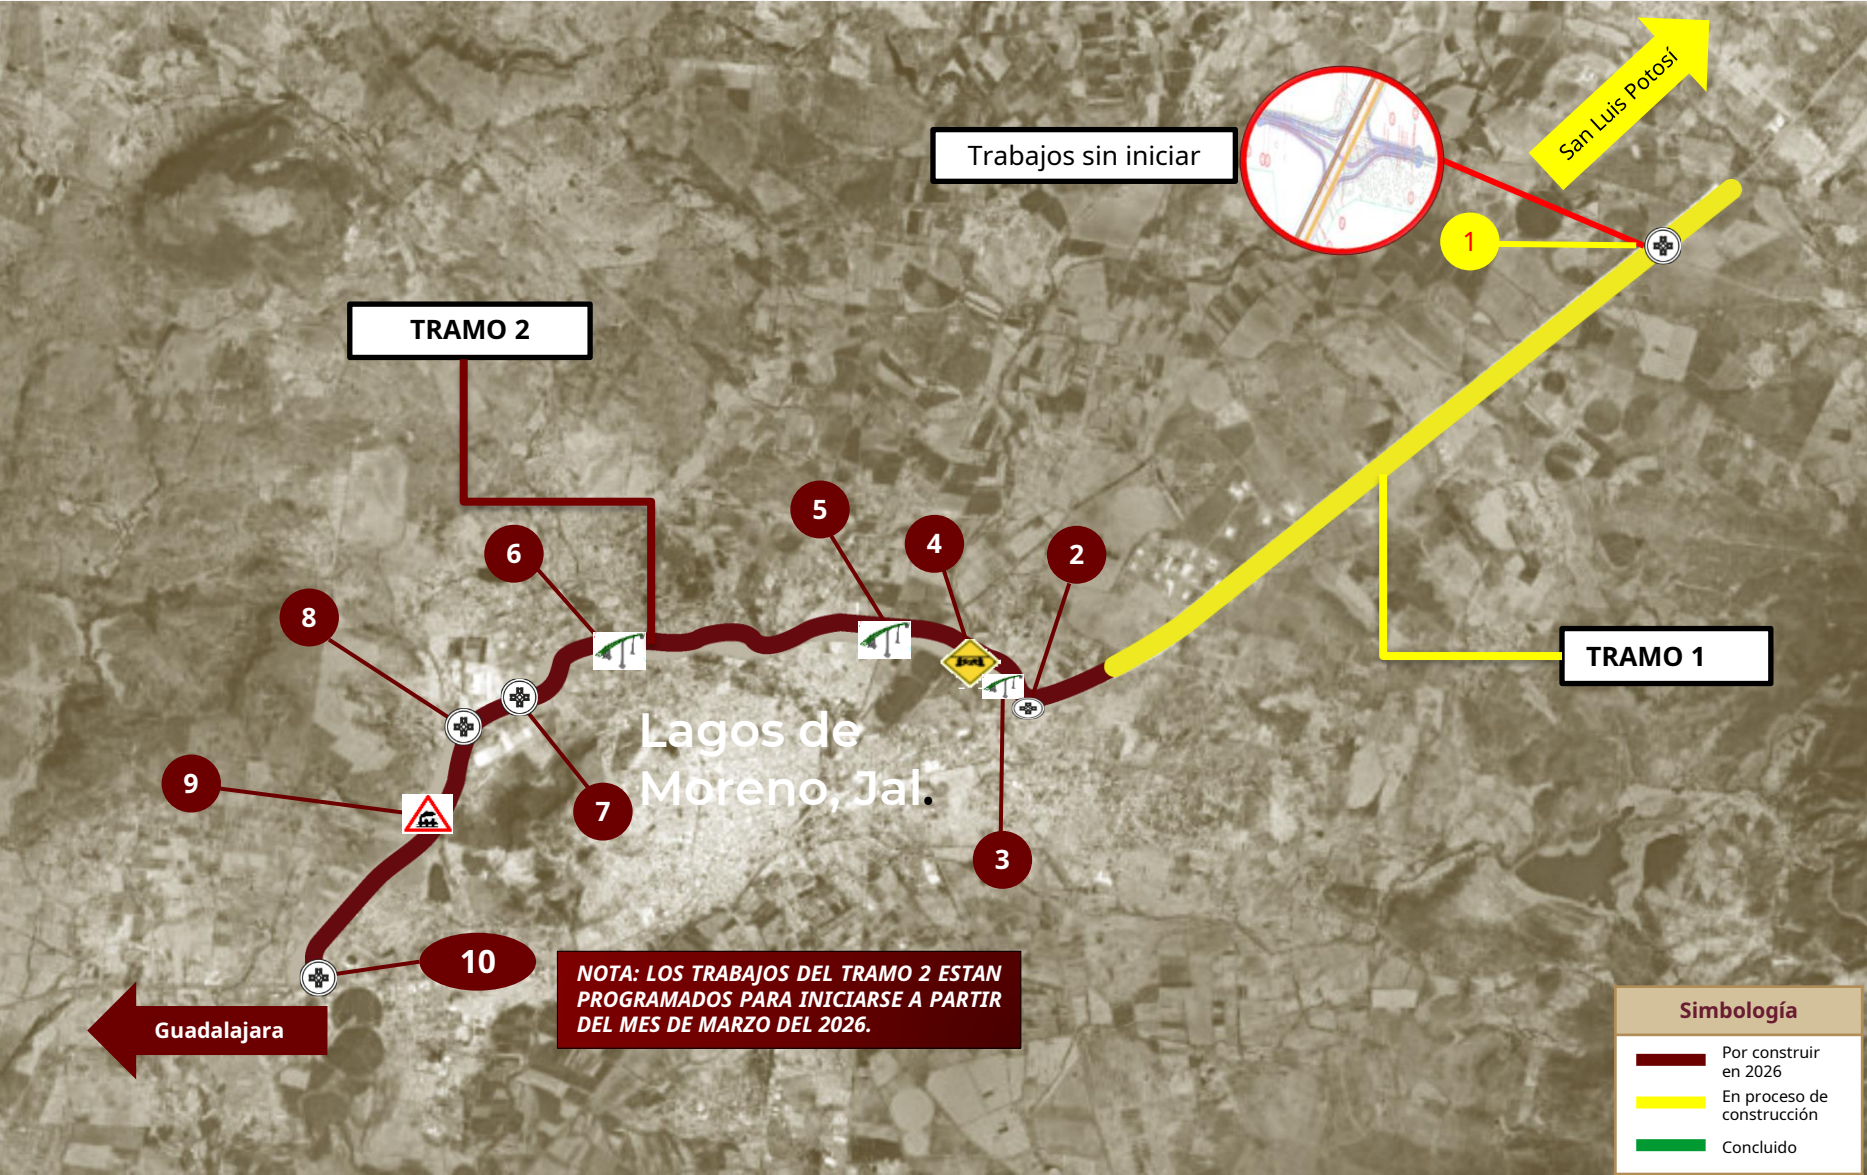

Descripción	
1	Entronque El Maguey km 1+300 - Avance 2.8% Problemas de DDV.
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800
3	PIV Fracc. Andalucía Km 12+129
4	Puente Km 12+800
5	PIV Sepúlveda Km 13+620
6	PSV Draexlmaier Km 15+900
7	Entronque Santorini Km 17-800
8	Entronque Encarnación (Trébol) Km 18+200
9	PSFC Km 19+860
10	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Oeste Km 23+920

Avance físico

- Programado: 8.07%
- Real: 11.57%
- Semanal: 2.37%
- Financiero: 5.71 %

Inversión: 1,605 mdp

Inicio: 1 de marzo de 2025
Término: 28 de febrero de 2028

Meta: 25 km

4,000 empleos generados

250,000 habitantes beneficiados


20 minutos de ahorro en tiempo

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

Aval

TERRACERIAS TRONCAL						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	25/07/25 al 31/07/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Corte (m3)	89,225	88,476.92	748.08	8,210.41	2,630.20	Atraso por logística de obra
Pedraplén (m3)	4,800	1,150	3,650	600	0	Se está regularizando toda vez que se ha cambiado el frente de trabajo por cambios de carril.
Terraplén (m3)	29,823	19,453.24	10,369.76	0	4,023.86	Se inicio antes de lo programado (Agosto)
Subyacente (m3)	27,292	17,723.73	9,568.27	0	3,141.80	Programado (Septiembre)
Subrasante (m3)	24,644	17,554.06	7,089.94	0	2,757.87	Se inicio antes de lo programado (Septiembre)
Base hidráulica (m3)	23,690	15,508.15	8,181.85	0	3,521.26	Se inicio antes de lo programado (Octubre)

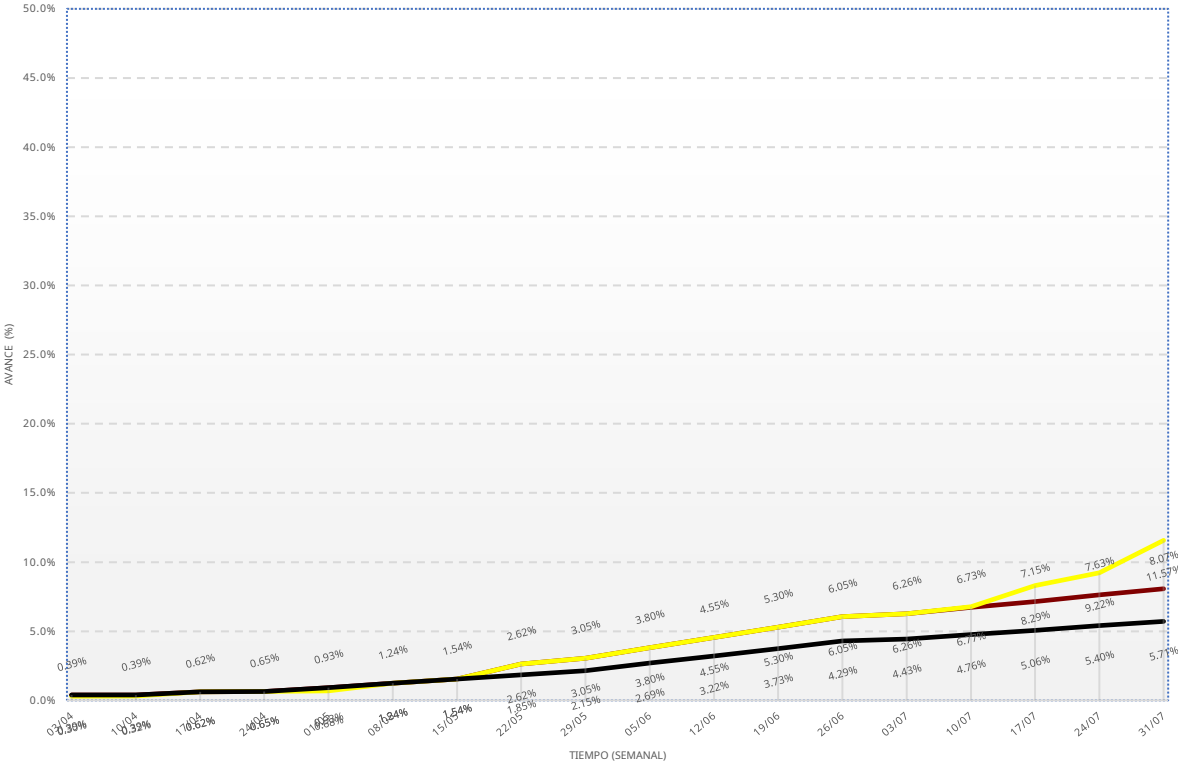

	18 al 24 de julio de 2025	25 al 31 de julio de 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	138	138
Maquinaria	50	50
