

# Colima

## Tramo Armería - Manzanillo

Avance físico

• Programado: 96.69%

• Real: 37.34%

• Semanal: 0.06 %

• Financiero: 35.25%




Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (87%) No se ejecutan trabajos por falta de personal y maquinaria.
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance.
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (100%)
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (42%) Se descabezaron pilas para armado de cabezales.
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (25.25%) En proceso de planeación para montajes.
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (83%) El trabajo programado para esta semana, está concluido.
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) Falta regularizar programa
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (93%)
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (70.66%) Se reportan trabajos ejecutados del proceso constructivo pero estos no generan avances directamente
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900 (52%) Se reportan trabajos ejecutados del proceso constructivo pero estos no generan avances directamente
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (67%) El trabajo programado para esta semana, está concluido
18	PSV Panteones km 87+300 (21%) Son se ha comenzado con esta estructura por priorizar entrega de tramos 1 y 2.
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
21	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (53%)
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (16%) No hay trabajos por logística de perforación.
24	Entronque Jalipa km 94+100 (9%) Hay que cambiar el tránsito al cuerpo izquierdo del paso del puente
25	Puente Jalipa km 94+158 (57%) El trabajo programado para esta semana, está concluido

# Colima

## Tramo Armería - Manzanillo

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

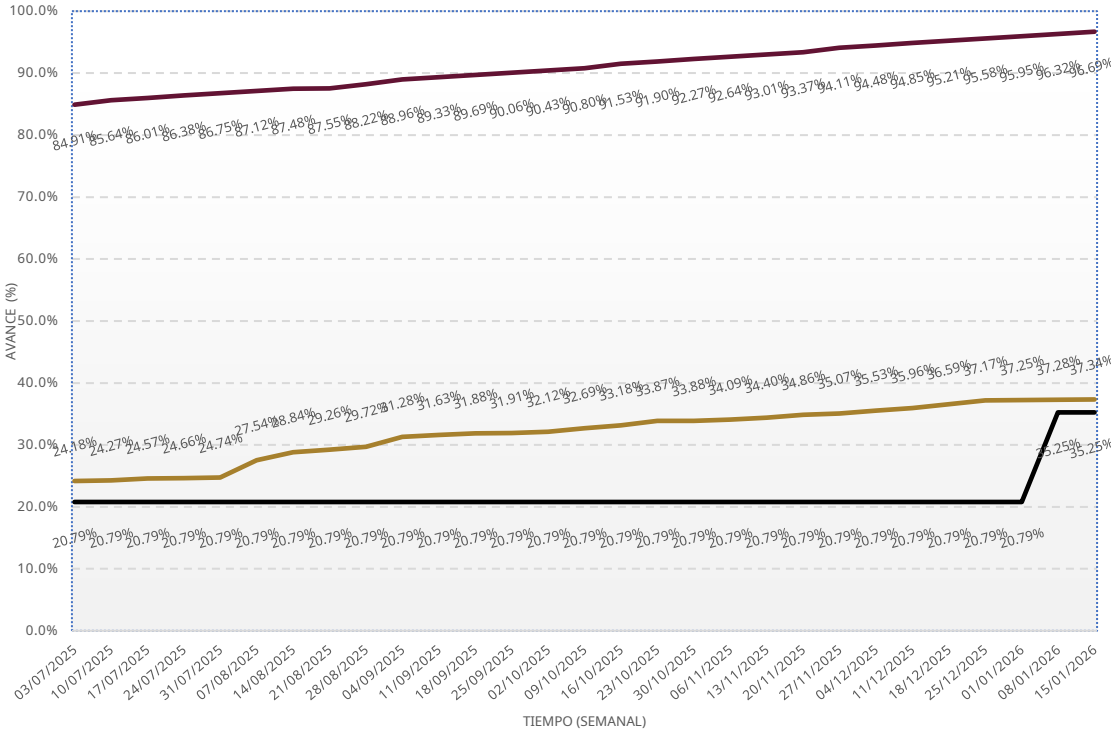

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	09/01/26 al 15/01/26		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	276,209	0	0	476	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	543,924	269,985	0	2,241	
Base y sub base (m³)	260,119	173,487	86,632	0	0	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

Tramo	Cadenamiento
2	54+000 al 64+000
6	90+100 al 95+600

Avance ProgramadoAvance FísicoAvance Financiero

	02 de enero al 08 de enero	09 de enero al 15 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	33	73
Maquinaria	15	41
Frente de trabajo	Tramo 2 km 58+674 a 60+600, PIV Retorno en U 77+600,	Tramo 2 km 59+520 a 60+700, PIV Retorno en U 77+600, PSFFC Tepalcates I km 79+900, Tramo 6 km 90+870 al 92+090, PIV Minatitlán II 93+000
