

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II ok



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 100%
- Semanal: 0.03%
- Real: 99.58%

Avance obra pendiente

- Real: 95.02%

Avance financiero

- Real: 96.5%
- Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,454 mdp por trabajos ejecutados.



| Descripción | |
|-------------|--|
| 1 | PIV km 87+900. 40% Conflicto entre sindicatos de camioneros |
| 2 | PIP km 91+530. 100% |
| 3 | PIPR km 92+436. 100% |
| 4 | PIV km 92+438. 99.5% |
| 5 | PIP km 92+680. 0% |
| 6 | Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% Problemas D.V. |
| 7 | Entronque Llano Laguna km 98+200. 99.13% |

| Descripción | |
|-------------|---|
| 8 | Entronque Cerro Pascale km 100+500. 99.36% |
| 9 | PIP km 106+570. 100% |
| 10 | PIP km 108+570. 98% |
| 11 | PIV km 109+247. 99.3% |
| 12 | PIV km 110+460. 99% |
| 13 | Entronque Danigare km 111+600. 99% |

| Descripción | |
|-------------|---|
| 14 | PIP km 112+270. 97% |
| 15 | PIV km 114+766. 98% |
| 16 | Entronque Agua Blanca Km 122+600. 98.8% |
| 17 | Entronque Quiavicuzas Km 137+900. 99.78% |
| 18 | PIPG Km 146+840. 95% |
| 19 | PIPG km 159+400. 95% |



Inversión: 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos



Término: Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)



Meta: 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre. En proceso: Trabajos en la troncal, 6 entronques y 10 pasos de servidumbre

❖ **Nota:** Se negoció cambiar 4 pasos de servidumbre por caminos laterales a la troncal, por lo que redujo de 21 a 17 pasos de servidumbre



12,204 empleos generados



+1 millón 400 mil habitantes beneficiados



2 hrs de ahorro en tiempo

Concesionaria: IDEAL


❖ No hay avances debido a la falta de asignación de recursos y lluvias en la zona

Mitla-Entronque Tehuantepec II



Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

| Elemento | Meta | Ejecutado acumulado | Faltante | 11/07/25 al /07/25 | | Observaciones |
|-----------------------------------|---------|---------------------|----------|--------------------|-----------|--|
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| Entronque Llano Laguna km 98+200 | | | | | | |
| Defensa metálica | 1,231 m | 1231 | 0 | 523 | 523 | <ul style="list-style-type: none">• Se concluyeron lavaderos• Se concluyó defensa metálica |
| Entronque Cerro Pascle km 100+500 | | | | | | |
| Señales | 45 pza | 13 | 32 | 4 | 4 | <ul style="list-style-type: none">• Se realizó colocación de señalamiento vertical |
| PIV km 110+460 | | | | | | |
| Accesos | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | <ul style="list-style-type: none">• Se concluyeron juntas de calzada.• En proceso de terminar de acondicionar accesos |
| Entronque Quiavicuzas km 137+900 | | | | | | |
| Señales | 60 pza | 56 | 4 | 9 | 9 | <ul style="list-style-type: none">• Se realiza la actividad de colocación de señales verticales. |

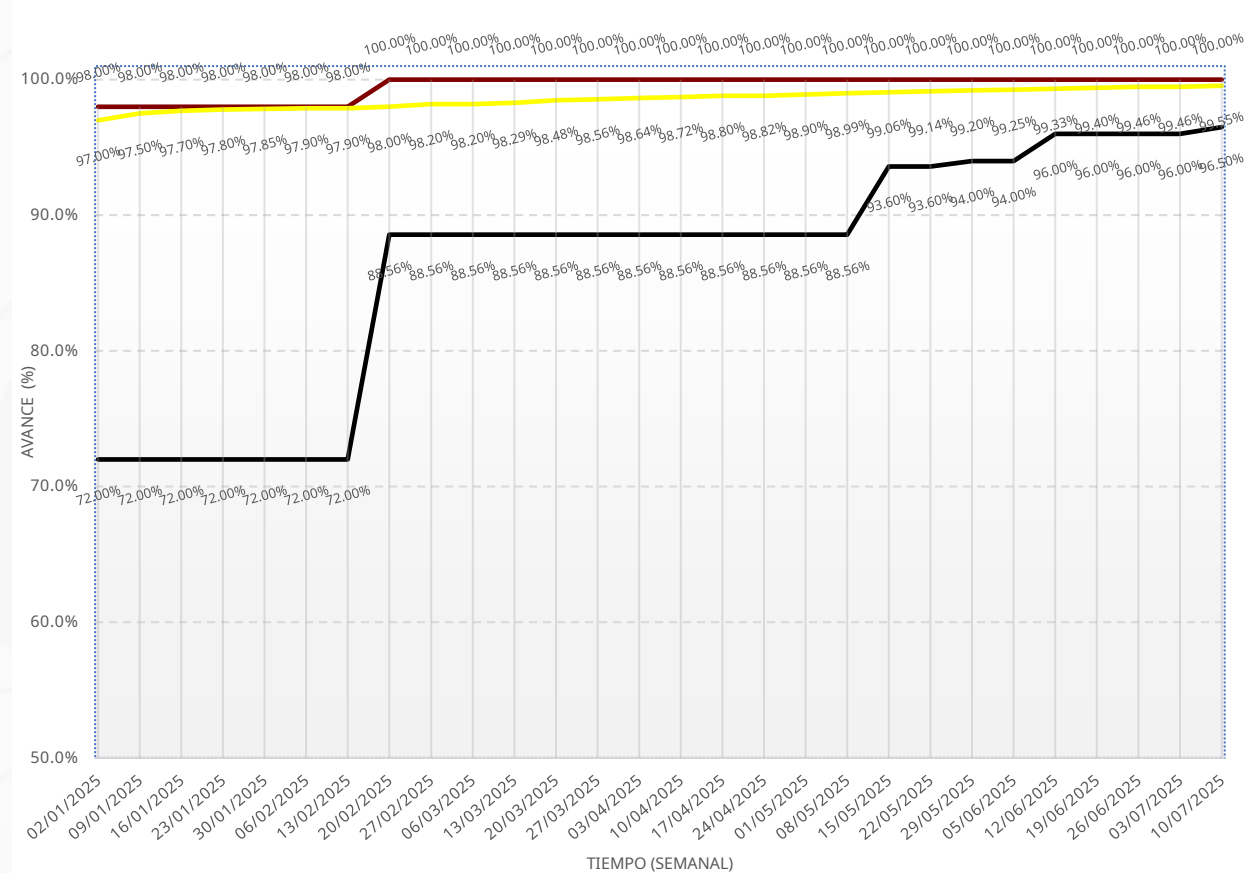

Avance Financiero

| | Del 04 de julio al 10 de julio | Del 11 de julio al 17 de julio |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 200 | 200 |
| Maquinaria | 25 | 25 |
