


Colima

Tramo Colima - Armería


Avance físico • Programado: 20.64% • Real: 2.67% • Financiero: 0.53%




Descripción	
1	Retorno a nivel Km+2.650 (Club de Golf)
2	Vuelta izquierda Km 4+940(Loma de Fátima)
3	Retorno a nivel Km 10+700 (Las Golondrinas)
4	Entronque Los Asmoles Km 14+750 un PIV
5	Estructura Pte. Lupita Km 19+420
6	Estructura Pte. La Grulla Km 19+780
7	Entronque Ixtlahuacán Km 24+300 un PTE
8	PSV Tecolapa km 27+600
9	Estructura Pte. La Vainilla Km 31+650
10	Entronque La Calera K 33+780 un PSV
11	Estructura Caseta de Cobro Tecomán Km 35+960
12	Entronque Tecomán Km 39+320 dos PSV




Inversión:
3,613 mdp




Inicio: 03 Marzo 2025
Término: 15 Octubre 2026




Meta: 43.1 km
7 estructuras y 5 entronques




Avance físico:
Programado: 20.64 %
Real: 2.67 %
Semanal: 0.08 %
Financiero: 0.53 %



10,842 empleos generados
3,614 empleos directos
7,228 empleos indirectos



312,000 habitantes beneficiados




30 minutos de ahorro en tiempo

Colima

Tramo Colima - Armería

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	09/01/26 al 15/01/26		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Despalme(m³)	46,732	46,732				Vol. Corresponden únicamente al tramo con proyecto del km. 14+000 al km. 43+000. Con base al programa en esta semana se esta cumpliendo con los volúmenes de obra.
Corte (m³)	129,248	129,248				
Terraplén (m³)	45,429	45,429				
Base Hidráulica(m³)	9,843	7,077.9	2765.1			
Base Asfáltica(m³)	4,573	4,573				

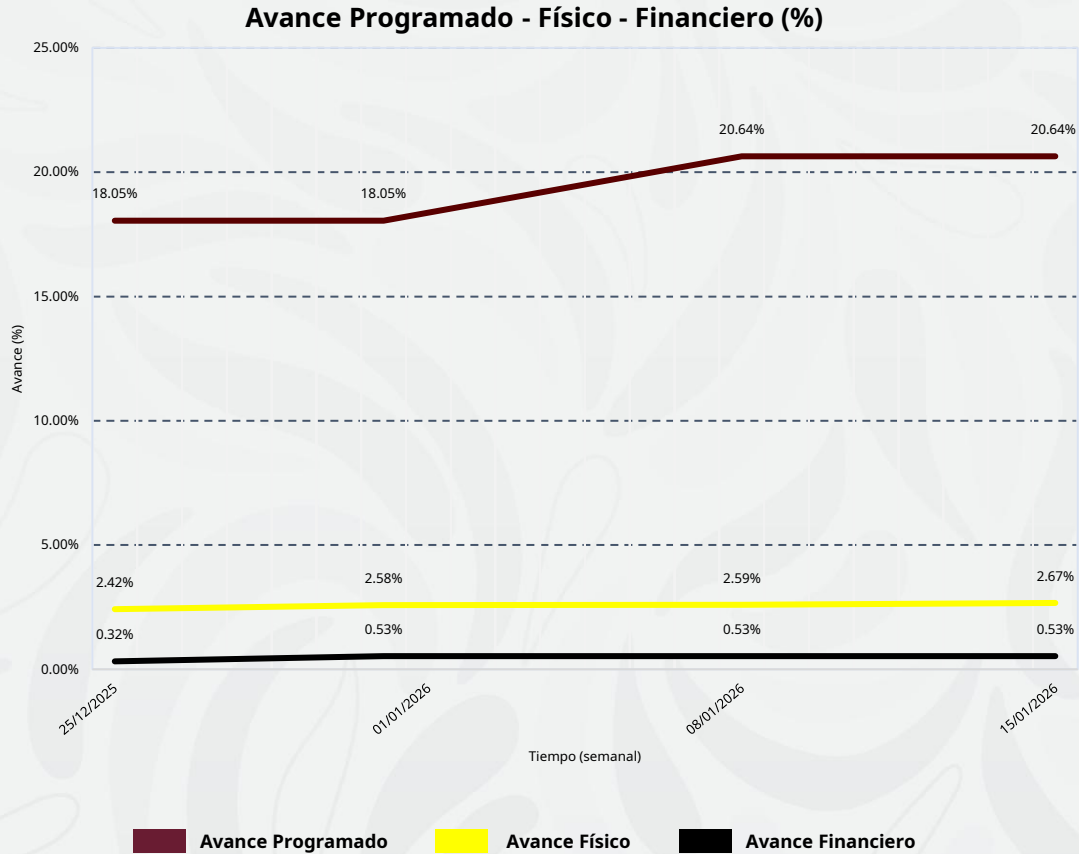

	02 al 08 de enero del 2026	09 al 15 de enero del 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	149	149
Maquinaria	80	80
Frentes de trabajo	Frente 2: km 20+000 al km 25+000 Frente 3: km 25+000 al km 30+000 Frente 4: km 30+000 al km 35+000 Frente 5: km 35+000 al km 40+000	Frente 2: km 20+000 al km 25+000 Frente 3: km 25+000 al km 30+000 Frente 4: km 30+000 al km 35+000 Frente 5: km 35+000 al km 40+000
