

# Tramo Armería-Manzanillo






**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Descripción	
1	Jalipa km 94+100
2	Minatitlán km 92+000
3	Tepalcates II km 81+323
4	Retorno en U km 77+600
5	Cuyutlán km 60+880
6	Salineros km 59+500
7	Tilapia km 54+350
8	Armería II km 50+100
9	Armería I km 45+000

### Simbología

	Por construir
	Proceso
	Concluido

**Avance físico:**  
Real: 19.94%



## Tramo 1 - Tendido de base asfáltica y renivelación de pavimento existente



# Colima

## Tramo Armería-Manzanillo



**Inversión** 4,470 mdp



**Meta:** 51.96 KM, 16 Estructuras,  
9 Entronques.



### Avance físico:

- Programado: 80.03 %
- Real: 19.94 %
- Financiero: 17.65 %



**Inicio:** Marzo-2023  
**Término:** Febrero-2026



**13,410** empleos generados



**218,657** habitantes beneficiados



**30 minutos** de ahorro en tiempo

# Colima

## Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	04/03/25 al 010/04/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	234,684	0	0	691	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	427,530	386,379	0	2,500	
Base y sub base (m³)	260,119	92,346	167,773	0	2,768	

NOTA: En la sección de “Ejecutado Acumulado”, el volumen total supera al de “Intervención” debido a la estructura del catálogo de conceptos, en el cual la partida de “Cortes” considera tanto el corte a desperdicio como el corte aprovechable.

Como resultado de las condiciones del material encontrado en sitio, el cual no cumple con las especificaciones para ser clasificado como aprovechable, se ha registrado un incremento en el volumen de corte a desperdicio. Esta situación se tiene bien identificada e impacta el total reportado, ya que la partida de “Cortes” integra ambos conceptos.



	27 de marzo al 3 de abril	Semana del 4 al 10 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	207	197
Maquinaria	90	66



# Colima


## Tramo Armería - Manzanillo



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

### Avance Programado - Físico - Financiero (%)

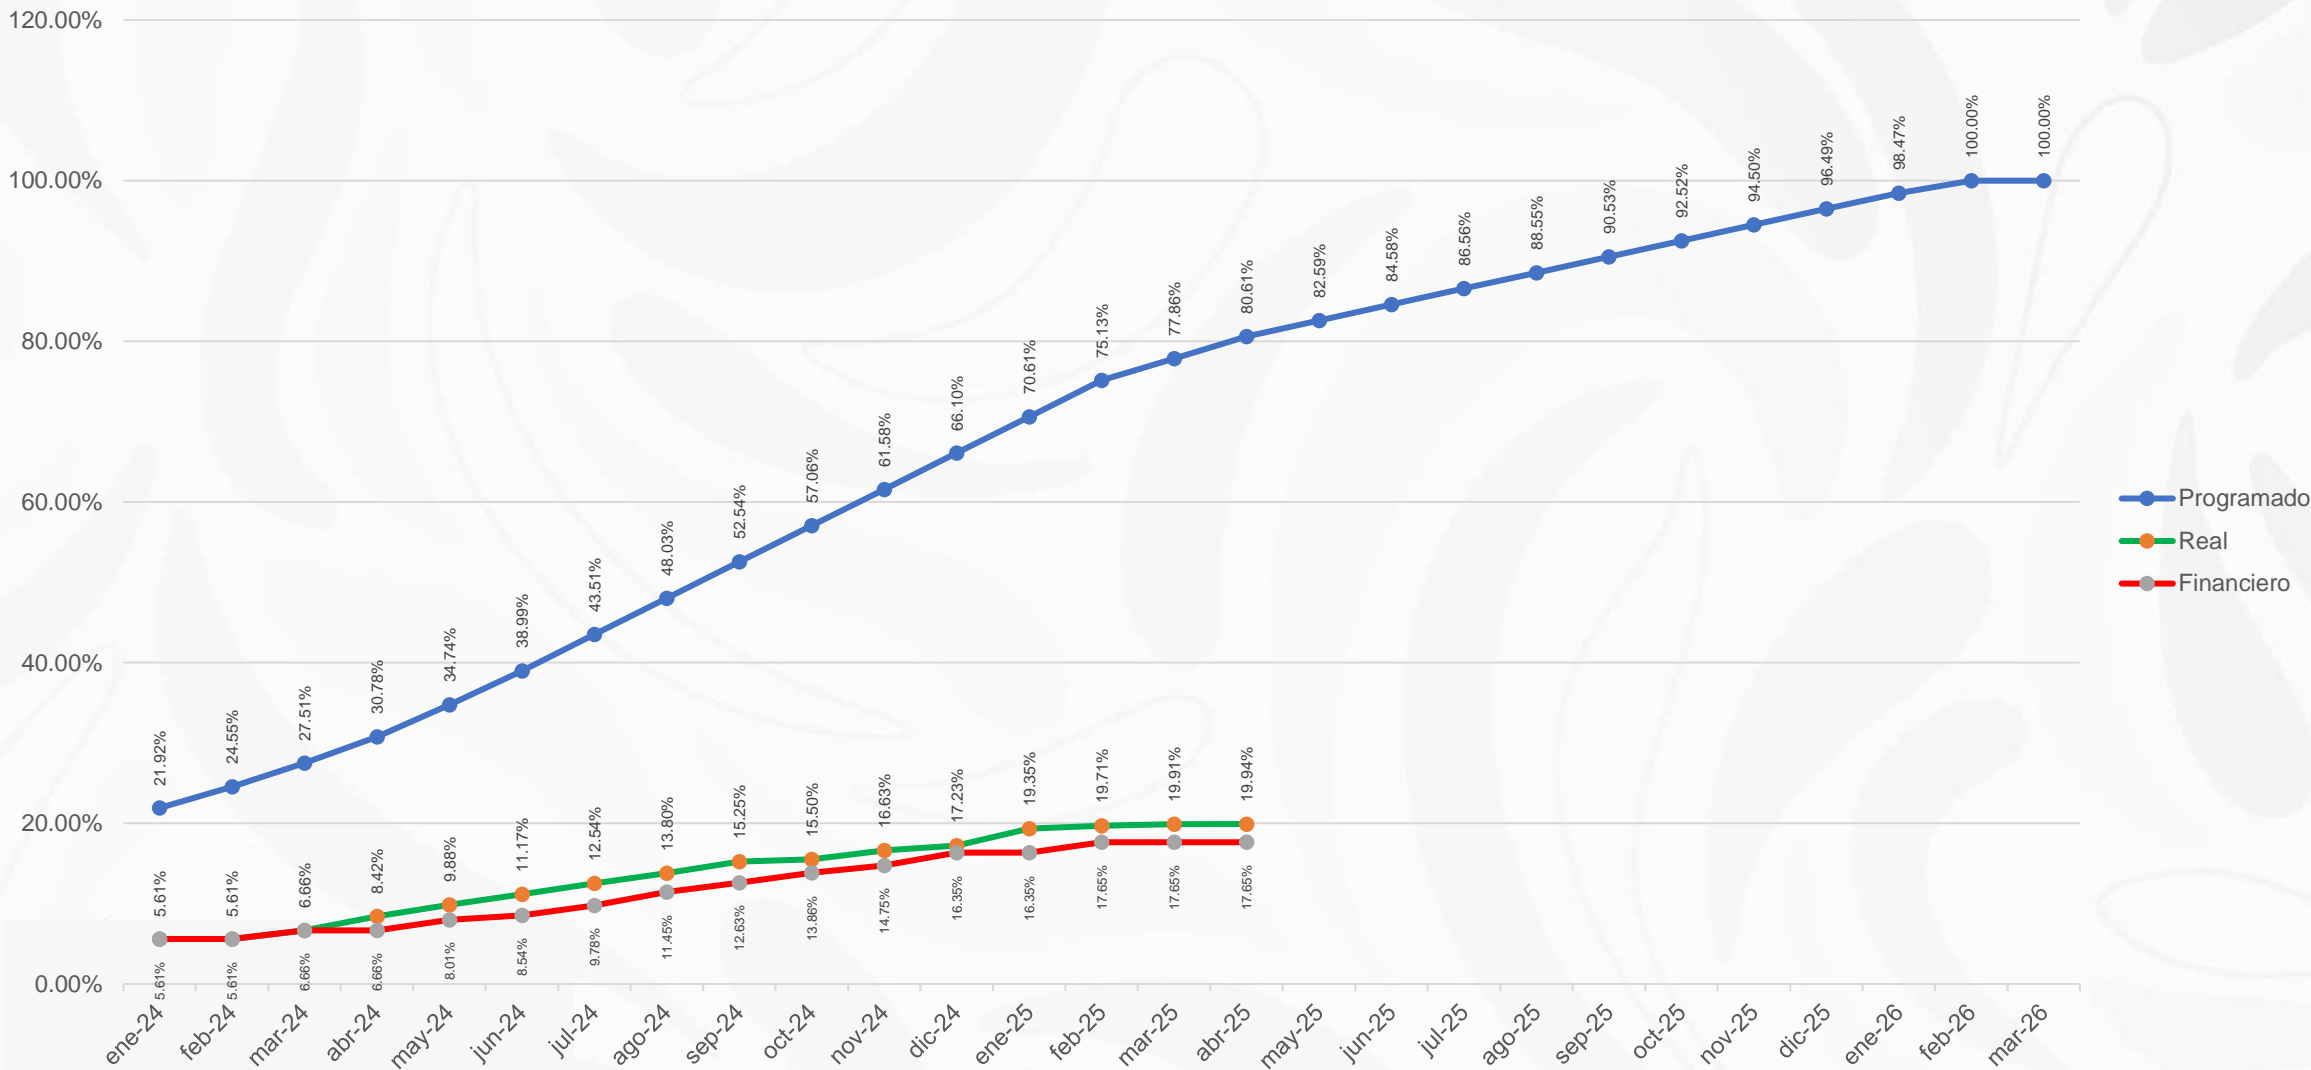

NOTA: El porcentaje de avance reflejado en el presente reporte no considera la obra/inversión no disponible para ejecutar debido a problemáticas ajenas a la concesionaria, así mismo se está trabajando la reprogramación de los trabajos.

El porcentaje programado para el mes correspondiente considera el mes completo, al ser reportes semanales, en la diapositiva No.2 se considera el porcentaje programado semanal.
