


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

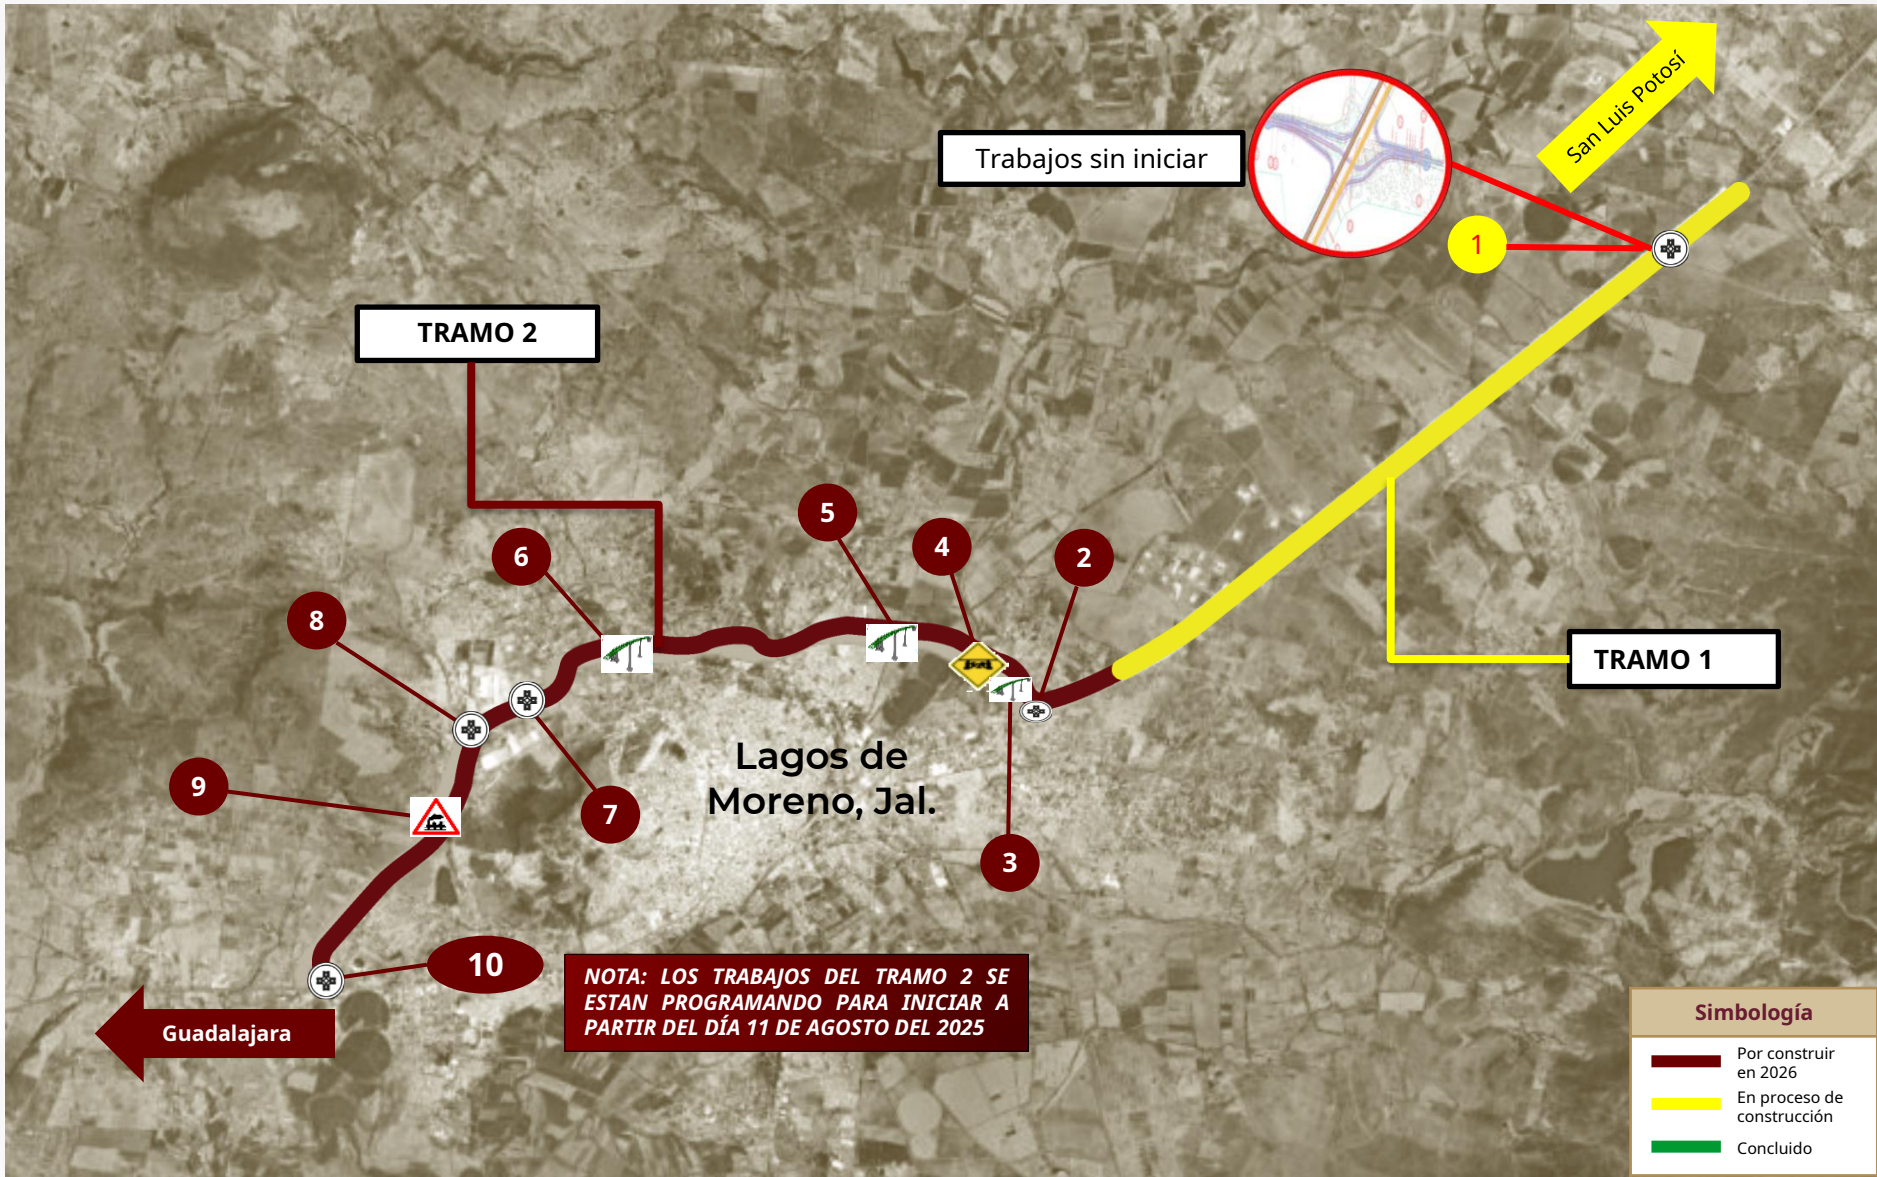

Descripción	
1	Entronque El Maguey km 1+300 - Avance 2.8% Problemas de DDV.
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800
3	PIV Fracc. Andalucía Km 12+129
4	Puente Km 12+800
5	PIV Sepúlveda Km 13+620
6	PSV Draexlmaier Km 15+900
7	Entronque Santorini Km 17-800
8	Entronque Encarnación (Trébol) Km 18+200
9	PSFC Km 19+860
10	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Oeste Km 23+920

Avance físico


- Programado: 9.55%
- Real: 15.80%
- Semanal: 1.98%
- Financiero: 11.17 %


 **Inversión: 1,605 mdp**

 **Inicio:** 1 de marzo de 2025
Término: 28 de febrero de 2028

 **Meta:** 25 km

 **4,000** empleos generados

 **250,000** habitantes beneficiados


 **20 minutos** de ahorro en tiempo

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

TERRACERIAS TRONCAL						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	15/08/25 al 21/08/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pedraplén (m³)	4,800	1,450	3,350	600	300	Atraso por lluvias atípicas
Terraplén (m³)	29,823	28,051.20	1,771.80	7,455.75	1,758.48	Atraso por lluvias atípicas
Subyacente (m³)	27,292	24,904.80	2,387.20	0	4207.4	Se inició antes de lo programado (Septiembre)
Subrasante (m³)	24,644	20,767.04	3,876.96	0	1,380.80	Se inició antes de lo programado (Septiembre)
Base hidráulica (m³)	23,690	17,366.84	6,323.16	0	535.90	Se inició antes de lo programado (Octubre)
Obras Inducidas (%)	100	60	40	0	0	Sin respuesta aún de las dependencias CFE, PEMEX y TELMEX

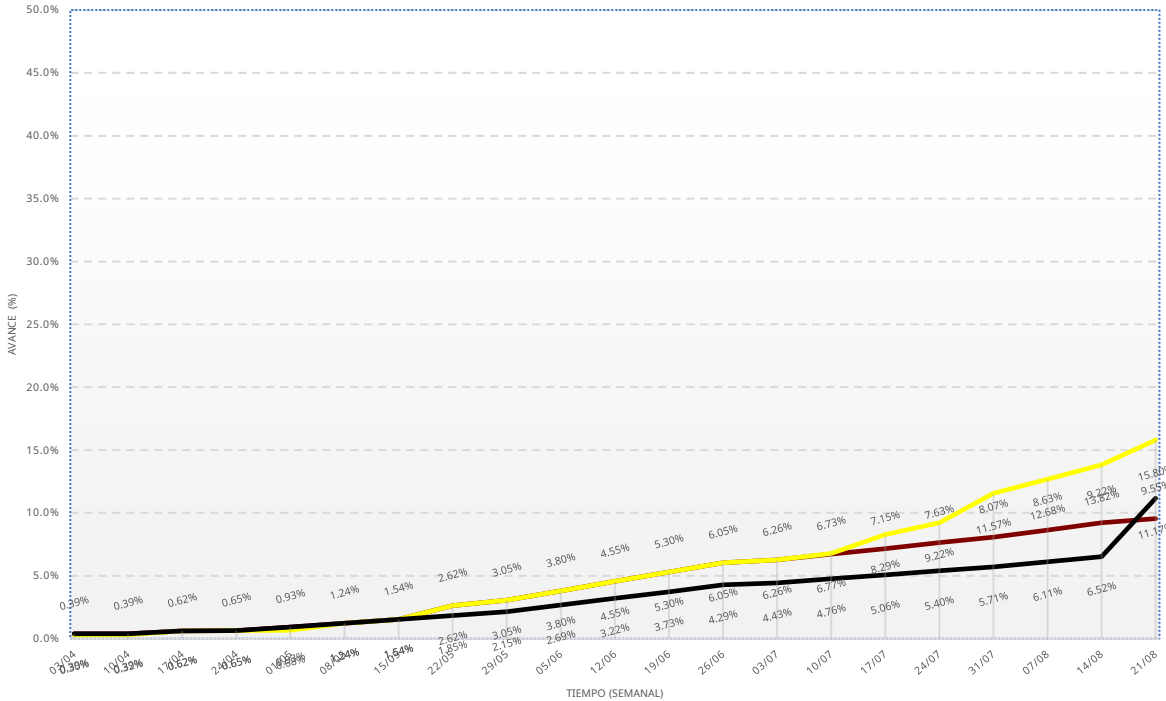

	08 al 14 de agosto de 2025	15 al 21 de agosto de 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	190	190
Maquinaria	60	60



2025
Año de
La Mujer
Indígena
