


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

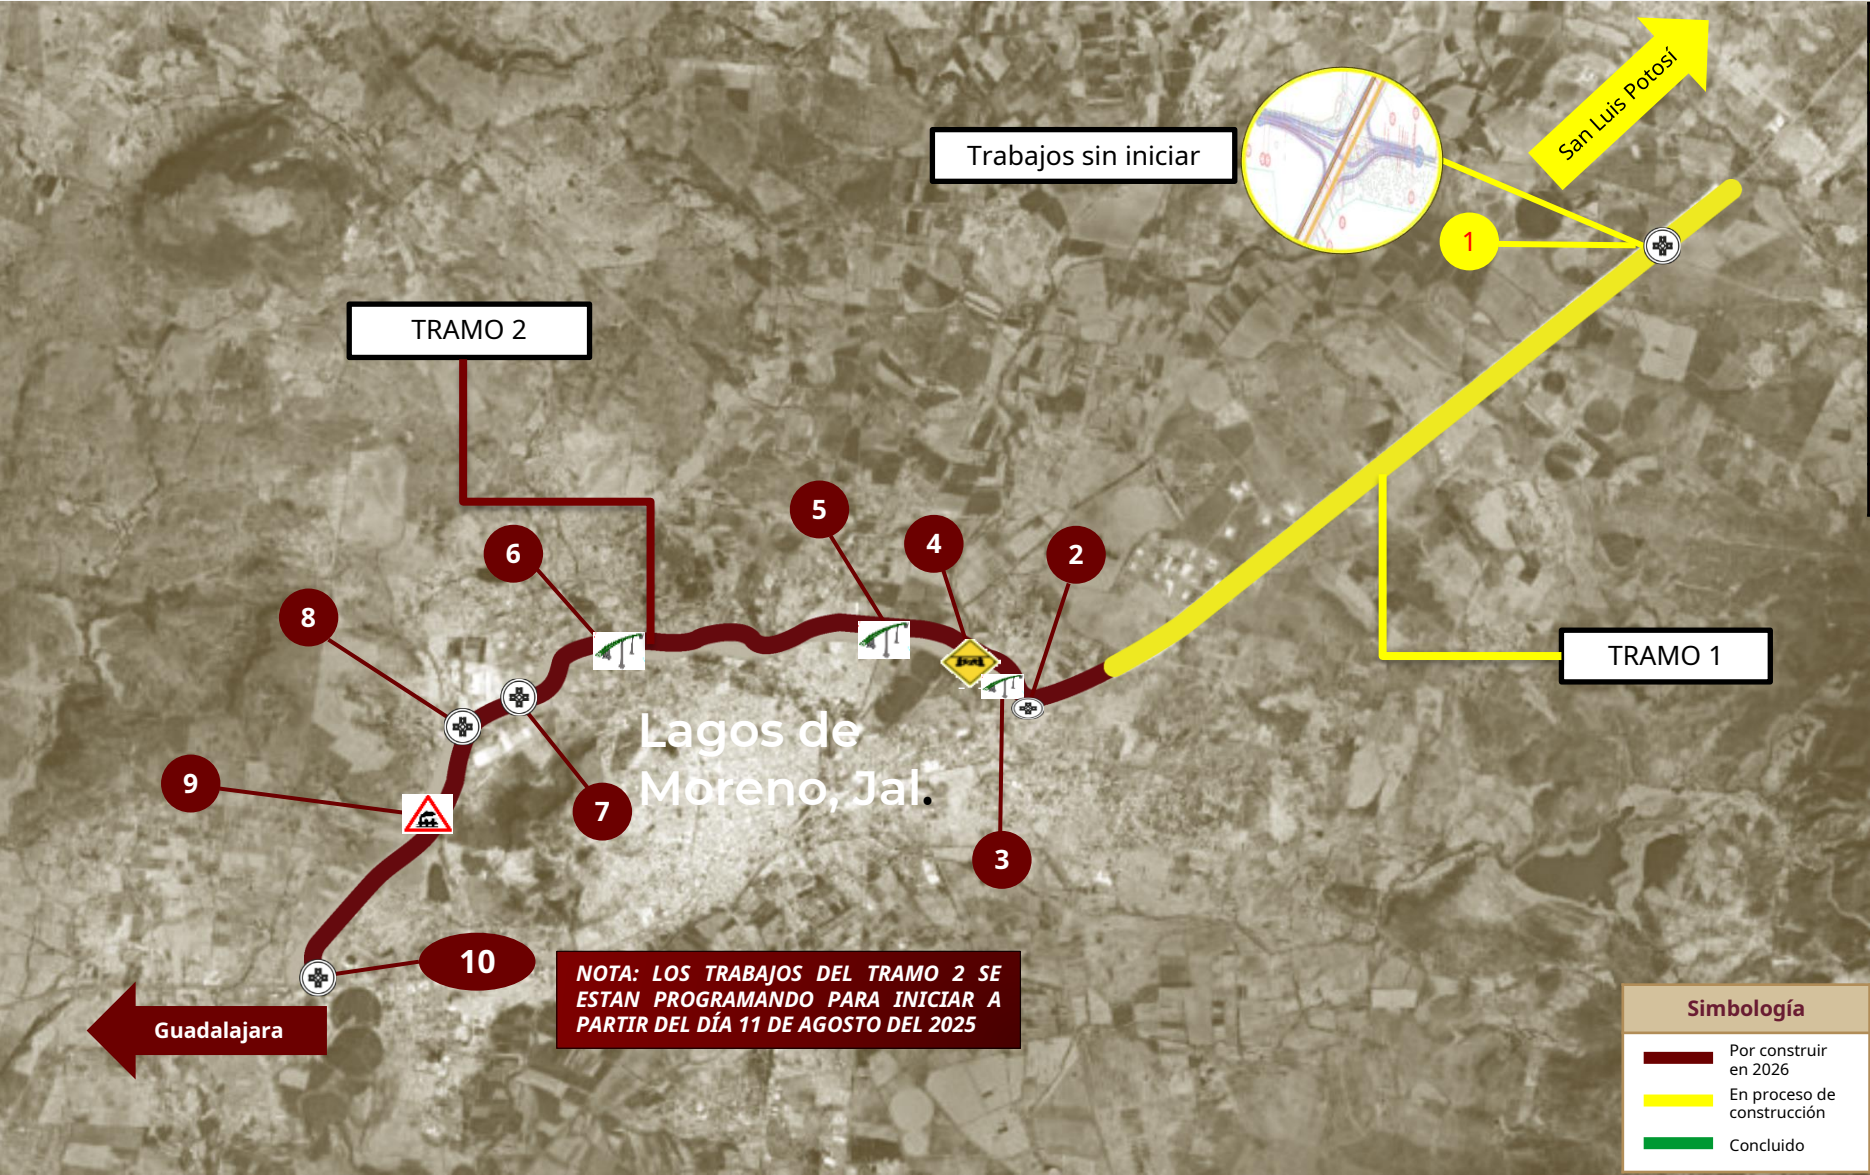

Descripción	
1	Entronque El Maguey km 1+300 - Avance 2.8% Problemas de DDV.
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800
3	PIV Fracc. Andalucía Km 12+129
4	Puente Km 12+800
5	PIV Sepúlveda Km 13+620
6	PSV Draexlmaier Km 15+900
7	Entronque Santorini Km 17-800
8	Entronque Encarnación (Trébol) Km 18+200
9	PSFC Km 19+860
10	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Oeste Km 23+920

Avance físico

- Programado: 9.22%
- Real: 13.82%
- Semanal: 1.14%
- Financiero: 6.52 %

Inversión: 1,605 mdp

Inicio: 1 de marzo de 2025

Término: 28 de febrero de 2028

Meta: 25 km

4,000 empleos generados

250,000 habitantes beneficiados

20 minutos de ahorro en tiempo

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

TERRACERIAS TRONCAL					
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	08/08/25 al 14/08/25	
				Programado	Ejecutado
Pedraplén (m3)	4,800	1,150	3,650	600	0
Terraplén (m3)	29,823	26,274.72	3,548.28	7,455.75	4,206.14
Subyacente (m3)	27,292	20,697.40	6,594.60	0	948
Subrasante (m3)	24,644	19,386.24	5,257.76	0	794
Base hidráulica (m3)	23,690	16,830.94	6,859.06	0	1,109
Obras Inducidas (%)	100	60	40	0	0
Se está regularizando toda vez que se ha cambiado el frente de trabajo por cambios de carril.					
Atraso por logística de obra					
Se inició antes de lo programado (Septiembre)					
Se inició antes de lo programado (Septiembre)					
Se inició antes de lo programado (Octubre)					
Sin respuesta aún de las dependencias CFE, PEMEX y TELMEX					

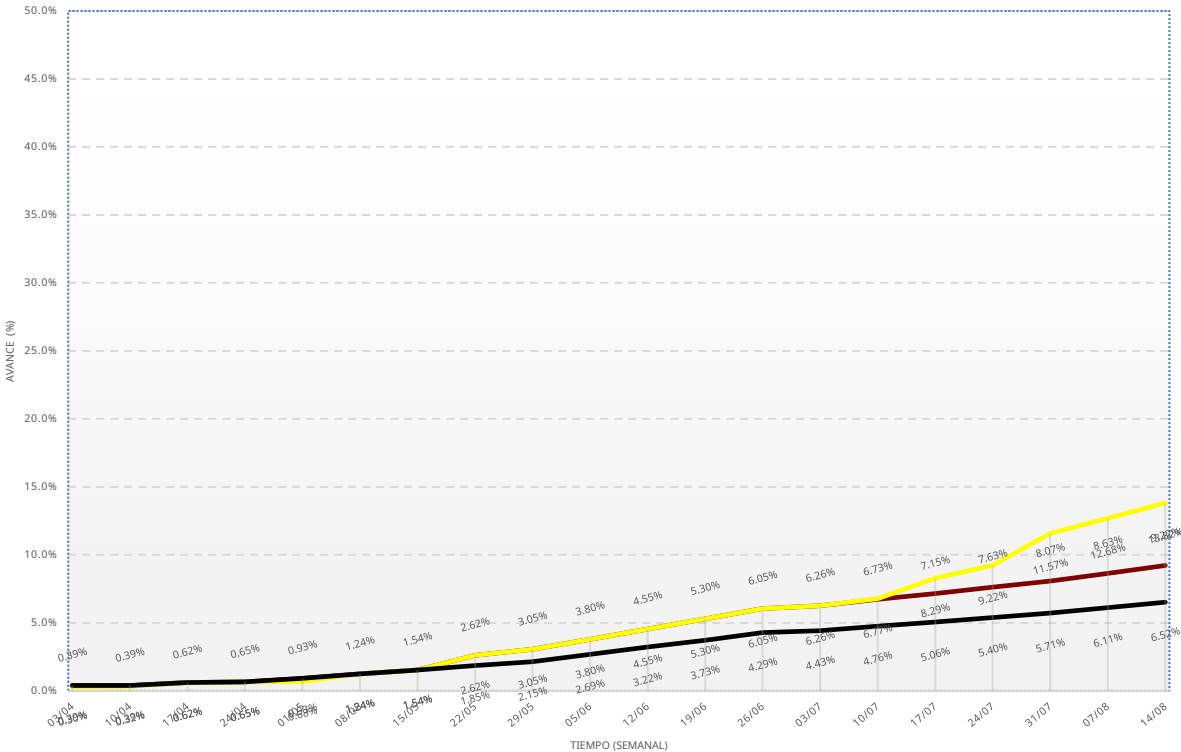

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	01 al 07 de agosto de 2025	08 al 14 de agosto de 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	138	190
Maquinaria	50	60



2025
Año de
La Mujer
Indígena
