



# Nayarit


## Tramo Tepic-Compostela



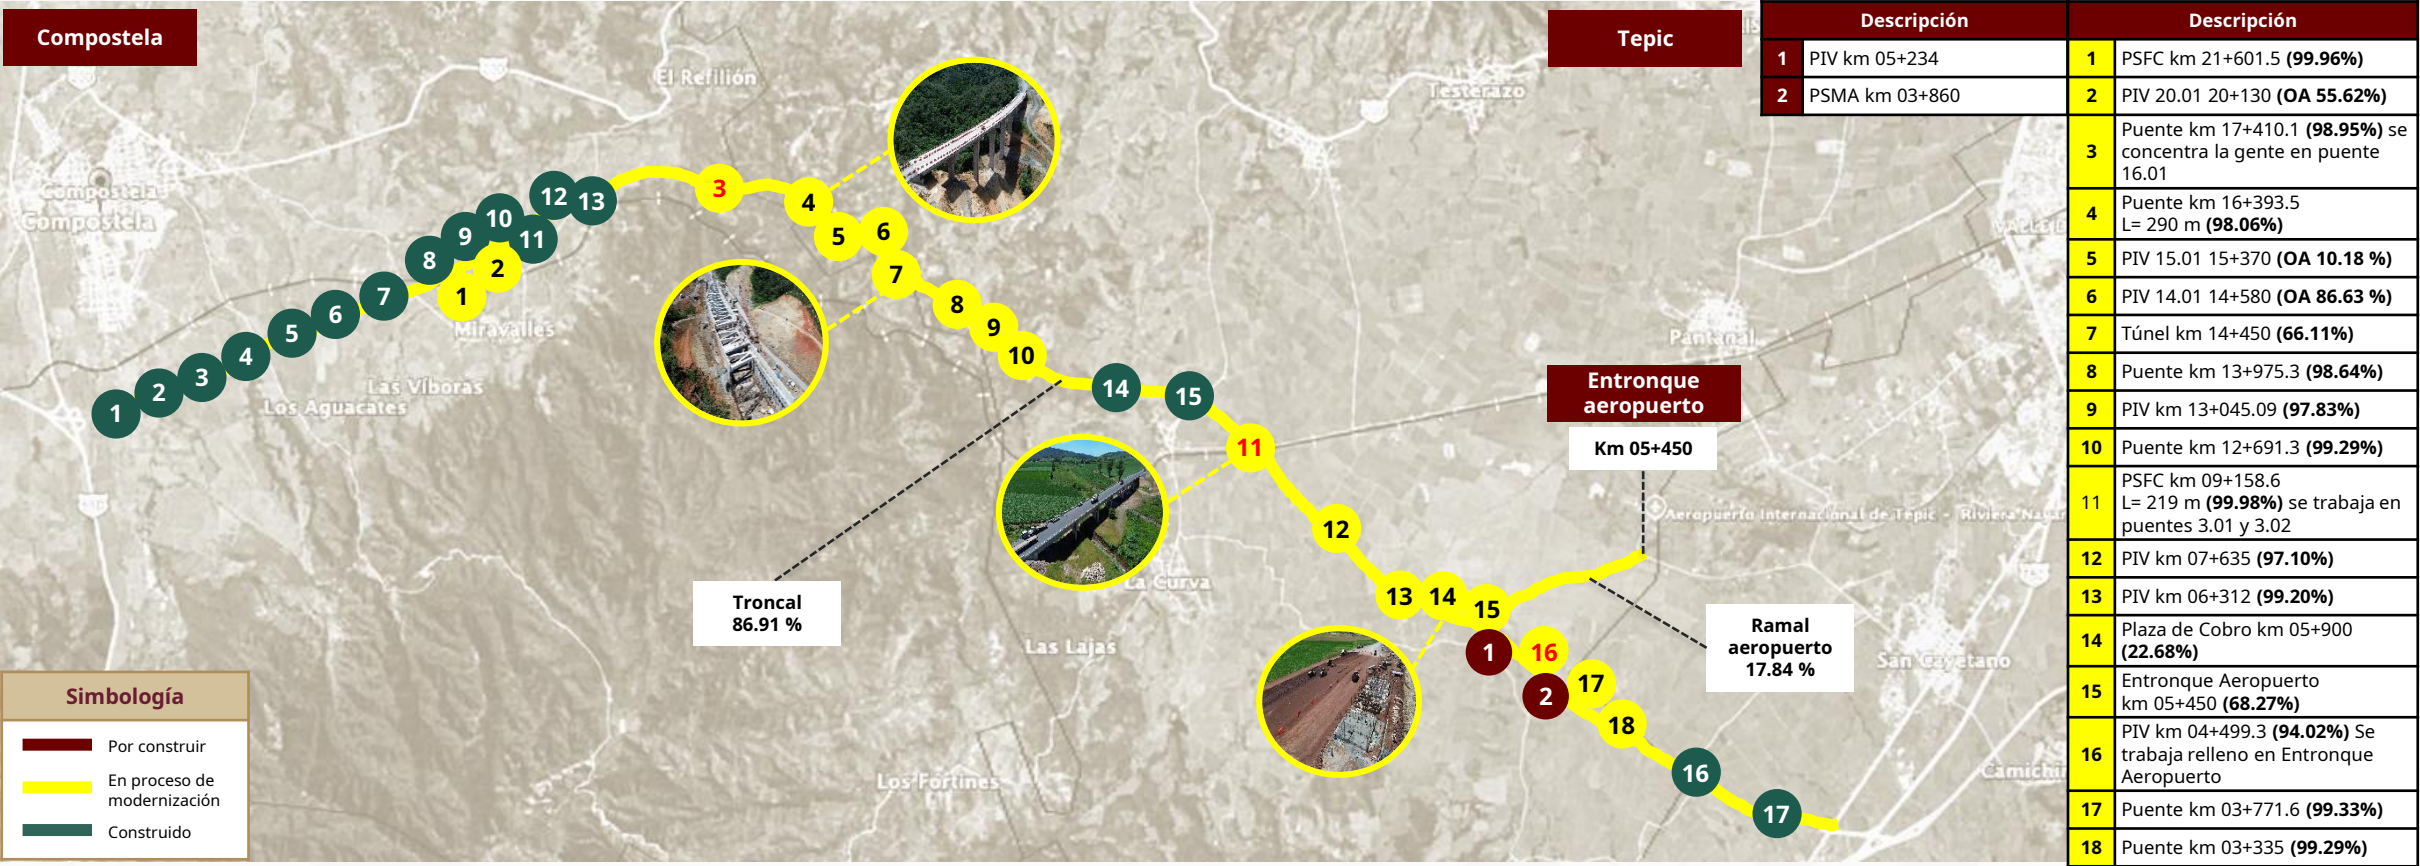


**Avance físico**

- Programado: 100 %
- Real: 97.24 %
- Financiero: 88.28 %
- Semanal: 0.31 %




**Inversión:** 2,473.43 mdp




**Meta:** 28 km

- 1 Plaza de cobro,
- 10 Puentes,
- 2 PSFC,
- 1 Entronque (solo gases)
- 19 Cruces
- Ramal Aeropuerto


**Concesionaria:** FONADIN




**Inicio:** Marzo 2023  
**Término:** 31-Oct-2025



**5,500** empleos generados



**490 mil** habitantes beneficiados




**35 minutos** de ahorro en tiempo

**Nota:**  
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	29/08/25 al 04/09/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	1,982,866.26	1,974,889.62	7,976.64	0.00	15.00	
Subyacente (m³)	290,689.00	273,686.49	17,002.51	4,600.00	4,750.00	
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	1.3	0.7	0	0.1	Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. En revisión fuerza de trabajo necesaria.

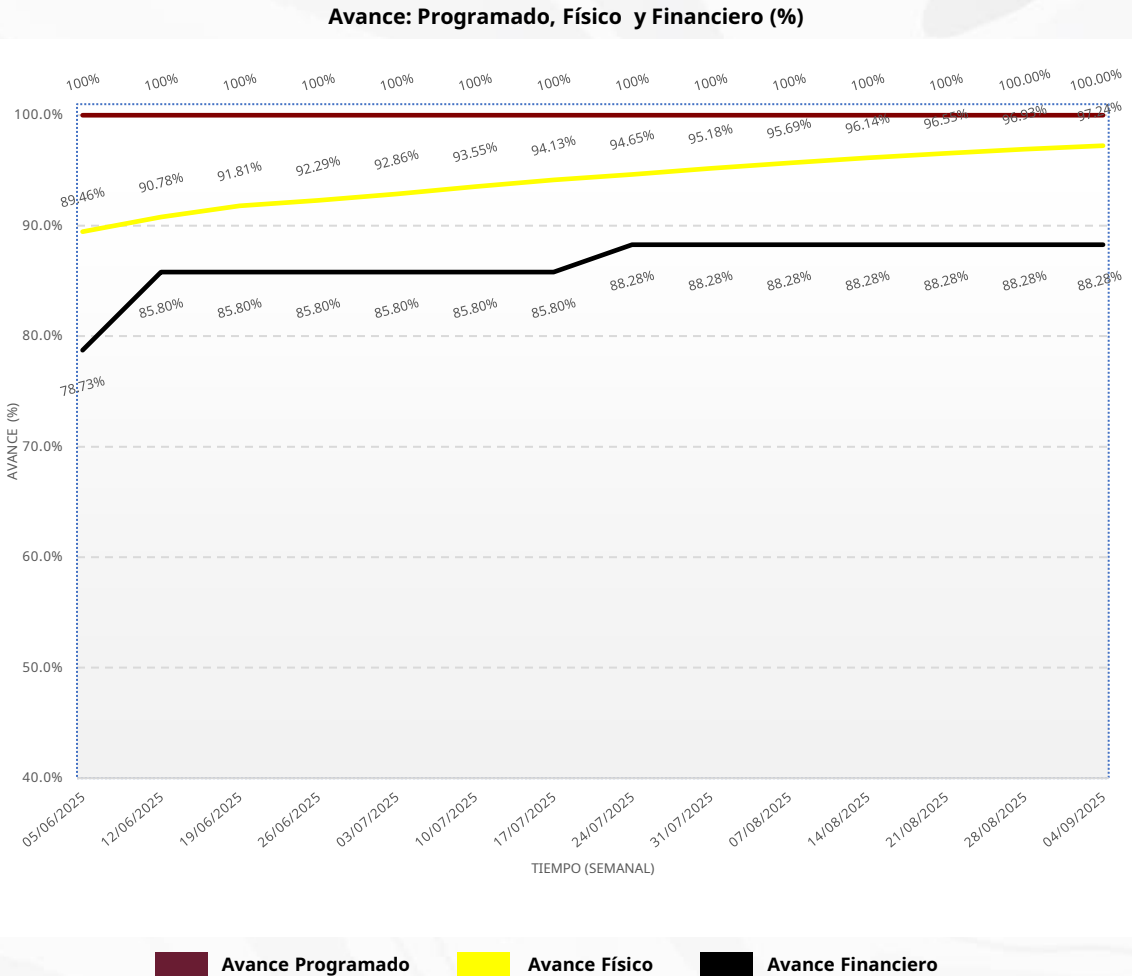

	22 de agosto al 28 de agosto	29 de agosto al 04 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	480	450
Maquinaria	86	71
