

Colima

Tramo Armería - Manzanillo


Avance físico


• Programado: 93.37%


• Semanal: 0.46 %


• Real: 34.86%


• Financiero: 20.79%

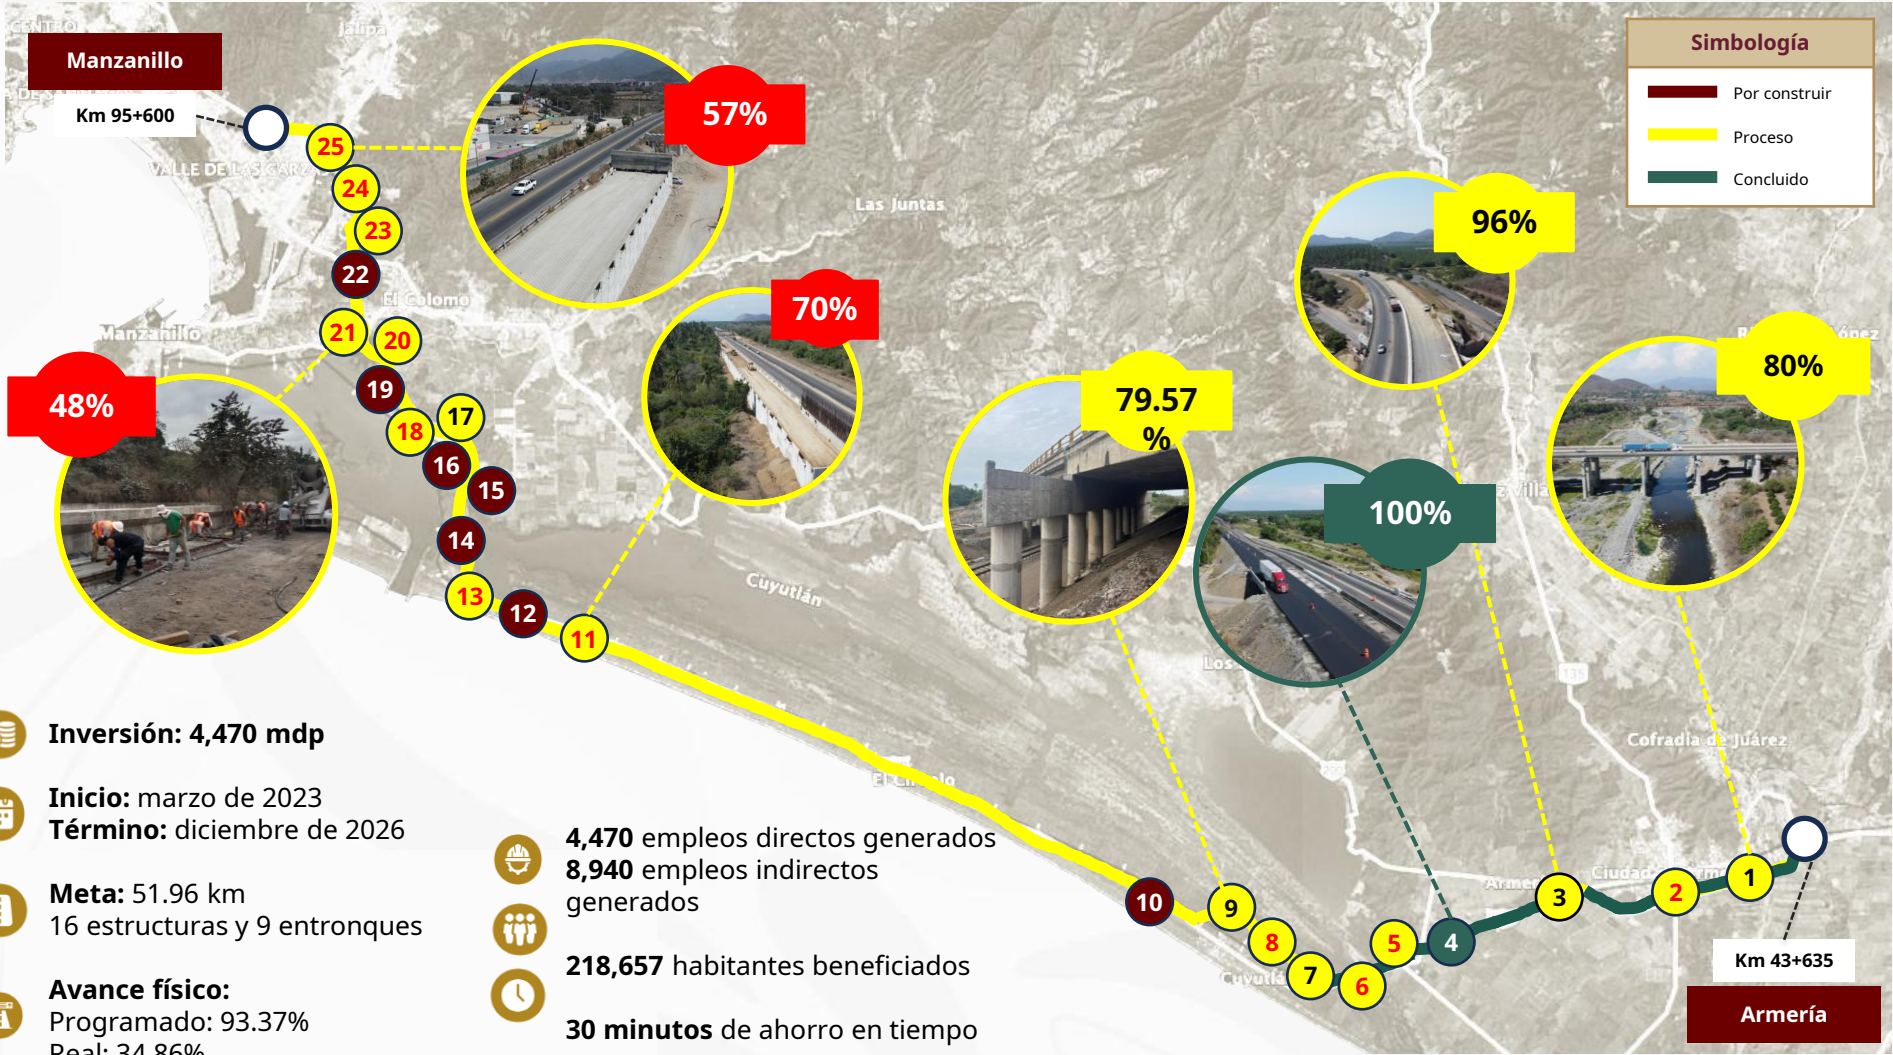



**Inversión: 4,470 mdp**


**Inicio:** marzo de 2023
Término: diciembre de 2026

**Meta:** 51.96 km
16 estructuras y 9 entronques

**Avance físico:**
Programado: 93.37%
Real: 34.86%
Semanal: 0.46%
Financiero: 20.79%

**4,470** empleos directos generados
8,940 empleos indirectos generados

**218,657** habitantes beneficiados

**30 minutos** de ahorro en tiempo


Concesionaria: PINFRA

Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (80%)
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance.
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (96%)
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (42%) Retraso en logística
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (17%) Retraso en logística de perforación.
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (33%)
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) Falta regularizar programa
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (79.57%)
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (70.66%) No se tuvieron trabajos programados
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900 (46%) Sin trabajos programados
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (62%)
18	PSV Panteones km 87+300 (21%) Falta de Fuerza de Trabajo
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
21	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (48%)
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (15.75%) No se ha comenzado en esta estructura por logística de perforación
24	Entronque Jalipa km 94+100 (9%) Hay que cambiar el transito al cuerpo izquierdo del paso del puente
25	Puente Jalipa km 94+158 (57%) El trabajo programado para esta semana, está concluido

Colima

Tramo Armería - Manzanillo

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

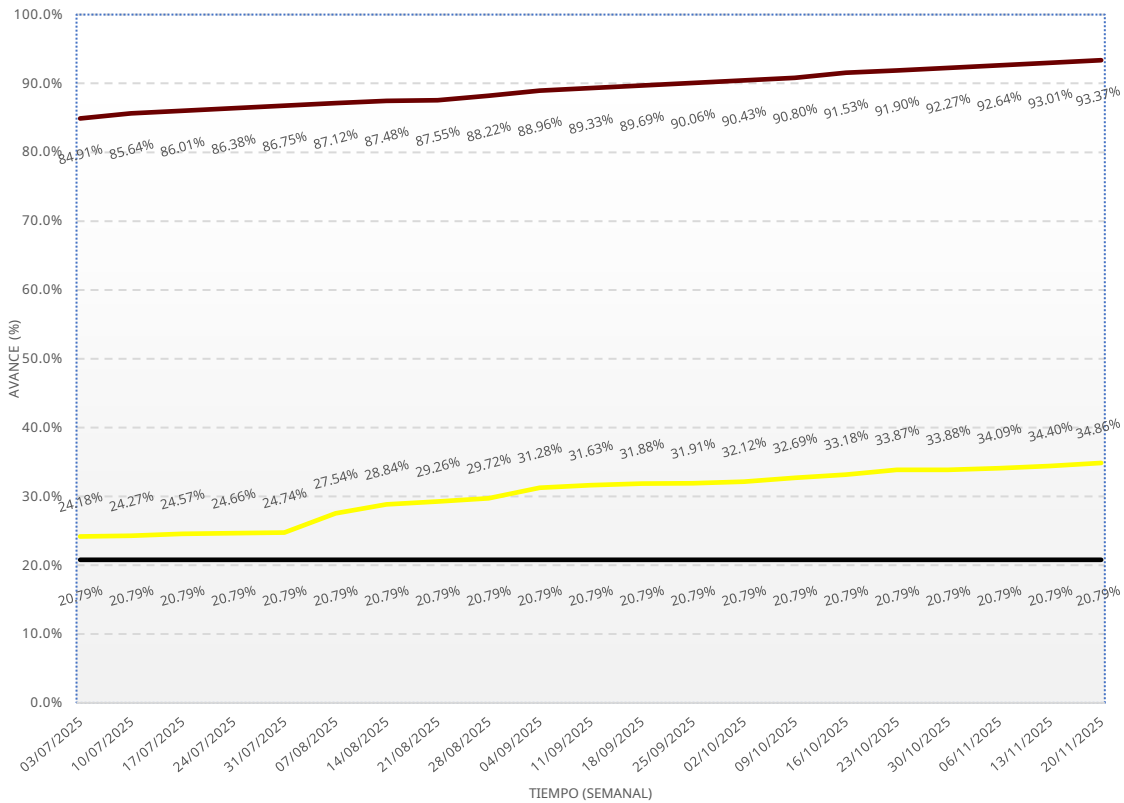

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	07 al 13 de noviembre	14 al 20 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	177	151
Maquinaria	77	63

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	14/11/25 al 20/11/25		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	271,057	0	0	1,224	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	516,838	297,072	0	3,356	
Base y sub base (m³)	260,119	159,413	100,706	0	2,199	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

