

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío



Descripción	
1	Entronque Santa Rosa km 32+420 (93.00%)
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420 (91.12%)
3	Puente Turundeo Km 36+460 (96.01%)
4	Entronque Turundeo I km 37+550 (81.41%)
5	Entronque Turundeo II km 38+780 (92.73%)
6	Entronque Jungapeo km 56+700 (65.15%)
7	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (63.14%)
8	Entronque Valle Verde km 67+220 (66.66%)
9	Entronque Curungueo I Km 68+240 (66.44%)
10	Entronque Curungueo II Km 68+780 (66.44%)
11	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (68.90%)
12	PSV Zitácuaro Km 72+160 (74.55%)

Descripción	
1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Macutzio km 65+620

Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

Avance físico

- Programado: 56.04%
- Real: 51.72%
- Semanal: 0.54%
- Financiero: 8.11%

Inversión: 4,575.3 mdp
Inversión 2020-2025: 3,321 mdp

Meta: 71.3 Km
Meta 2020-2025: 41 km

Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 30 de enero de 2027

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

13,726 empleos generados (4,575 directos y 9,151 indirectos)

126,000 habitantes beneficiados

Ahorro en tiempo: 25 min

Michoacán


Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	10/10/2025 al 16/10/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m³)	705,558.00	706,578.72	1,020.72	475.78	5,090.18	
Terraplén (m³)	445,687.00	353,777.07	91,909.93	7,964.44	2,993.49	SE DEBEN INICIAR TRABAJOS EN TRAMO 8, EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL DERECHO DE VIA.
Subyacente (m³)	256,097.00	238,102.06	17,994.94	1,015.22	2,028.01	
Subrasante (m³)	170,688.00	156,990.10	13,697.91	465.89	1,052.54	

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	10/10/2025 al 16/10/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m³)	125,659.04	102,709.65	22,949.39	332.67	1,166.84	
Bacheo (m³)	1,800.00	1,303.00	497.00	0.00	13.50	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Fresado (m³)	10,676.00	9,984.00	692.00	0.00	37.69	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	24.59	5.65	0.00	0.34	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Geomalla (m²)	84,520.00	67,334.20	17,185.80	0.00	1,453.00	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Base Asfáltica (m³)	120,414.05	102,018.68	18,395.37	537.67	923.27	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Carpeta Asfáltica (m³)	45,247.80	14,439.12	30,808.68	0.00	392.86	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	10/10/2025 al 16/10/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	1.45	0.00	0.00	0.05	CONFORMACION DE TERRACERÍAS DE ACCESO Y SALIDA
PIV JUNGPEO	1.00	0.97	0.03	0.00	0.11	CONTINÚA EL CORTE DE TN EN GASAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.44	0.56	0.00	0.09	FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA EN TALLER
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.83	0.17	0.00	0.02	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO, ARMADO DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO

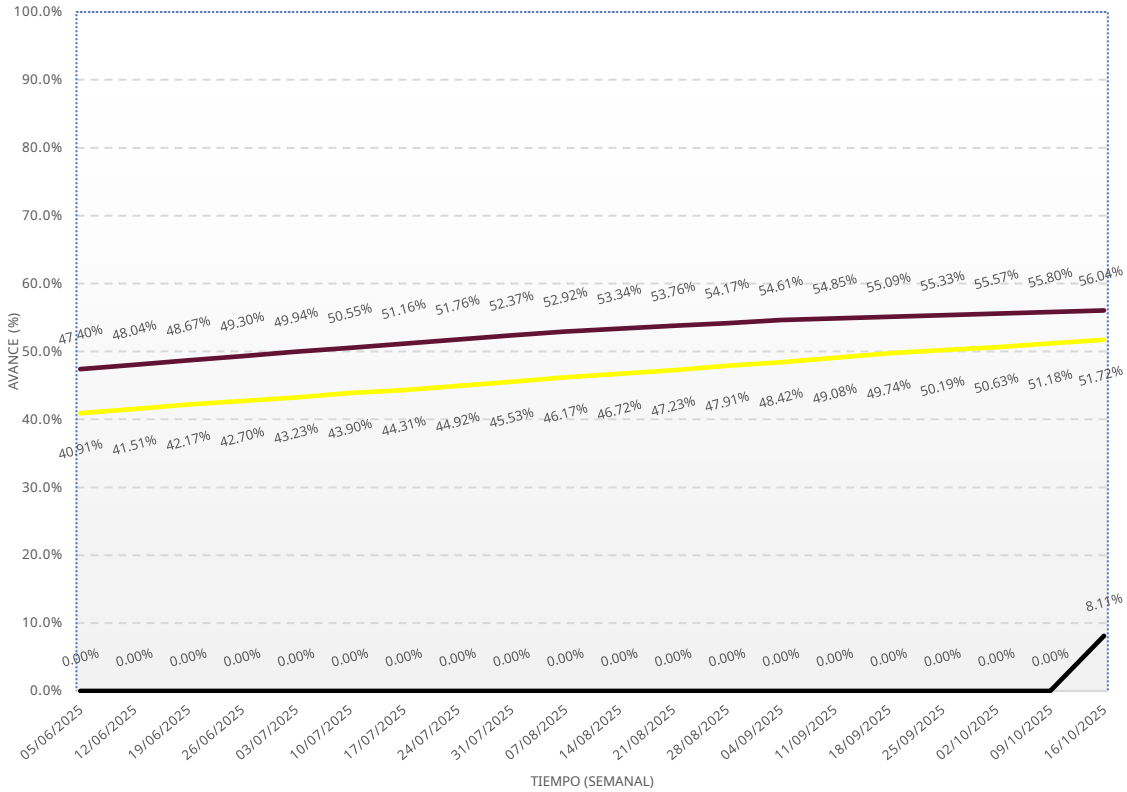

Avance ProgramadoAvance FísicoAvance Financiero

* No presenta avance financiero

	03 de octubre al 09 de octubre	10 de octubre al 16 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	279	278
Maquinaria	180	182
