

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan


Avance físico

• Programado: 99.10%

• Semanal: 0.54 %

• Real: 91.94%


• Financiero: 69.85%

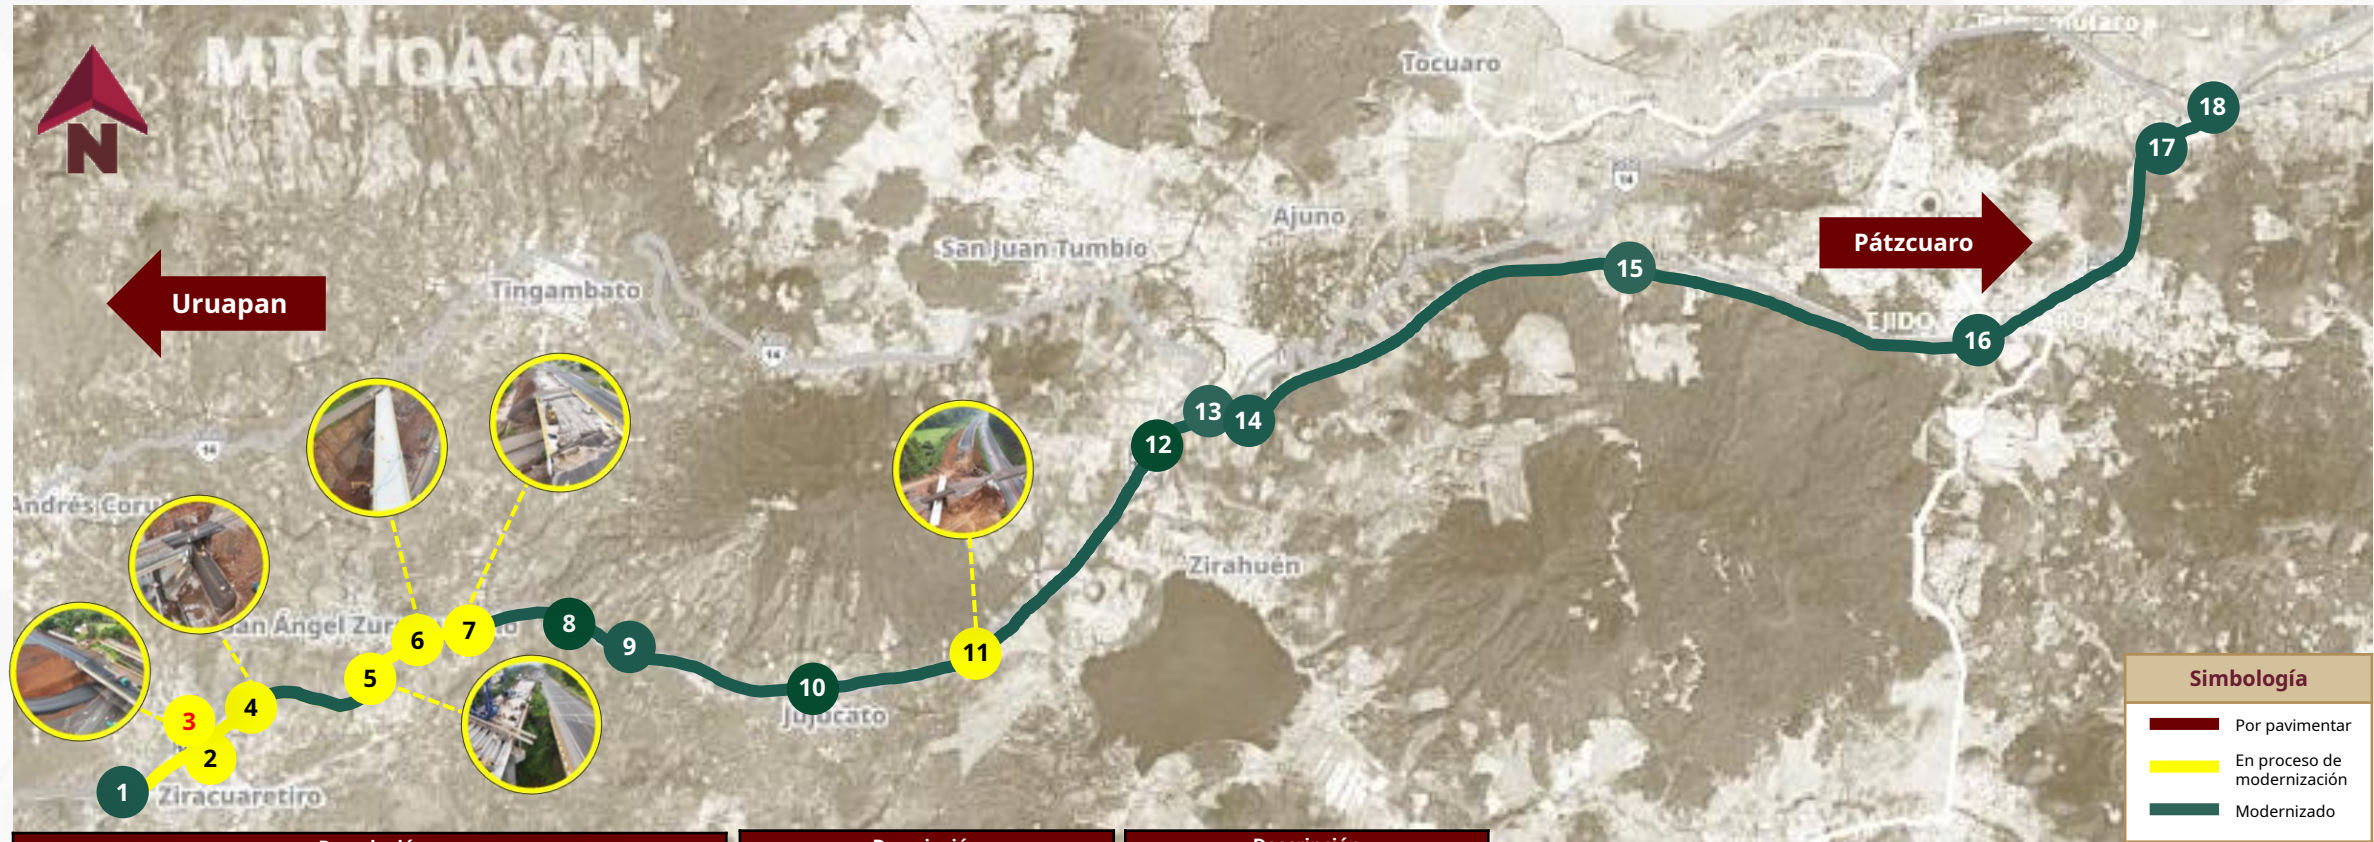



Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500
2	Puente canal km 92+210 (95.21%)
3	Entronque Caracha km 92+100, (75.65%). Trabajos de pavimentos en gasas de acceso para operación parcial de PIV nuevo y continuar con trabajos de demolición de antigua estructura.
4	PIFFCC km 91+754, (36.83%).
5	Puente Canintzio km 88+283, (65.84%)
6	PIV km 88+054, (93.65%)


Descripción	
7	Entronque San Ángel km 87+400, (94.45%)
8	Rampa de emergencia II km 86+500
9	Rampa de emergencia I km 84+100
10	Entronque Jucato km 79+489
11	PIFFCC km 73+584, (34.44%)
13	Viaducto Zirahuén km 70+278
13	Entronque Zirahuén km 68+600


Descripción	
14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
18	Entronque las trojas km 47+00

 **Inversión:** 1,792 mdp

 **Inicio:** Julio 2017
Término: 30 septiembre 2025

 **Meta:** 46.79 km; 58 Totales (1 plaza de cobro, 1 puente, 1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).

 **200 mil** habitantes beneficiados

 **25 minutos** de ahorro en tiempo.


Concesionaria : PINFRA.

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	15/08/2025 al 21/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PSV km 87+494 Accesos	2	0	2	1	1	Conformación y tendido de base hidráulica
PIV km 88+054 Accesos	2	1	1	1	1	Conformación y compactación de material previo a desplante de losa para acceso C1
Puente Canintzio km 88+283 Montaje de trabes	51	43	8	7	7	Maniobras de montaje de trabes de concreto (claro 3-4)
Puente Canintzio km 88+283 Losas	7	5	2	1	1	Colado de concreto para losa (claro 1-2) y armado de acero para losa (claro 3-4)
PIFCC km 91+754 Cabezales	2	1	1	1	1	Habilitado de cimbra de madera previo a colado de concreto para cabezal #2

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

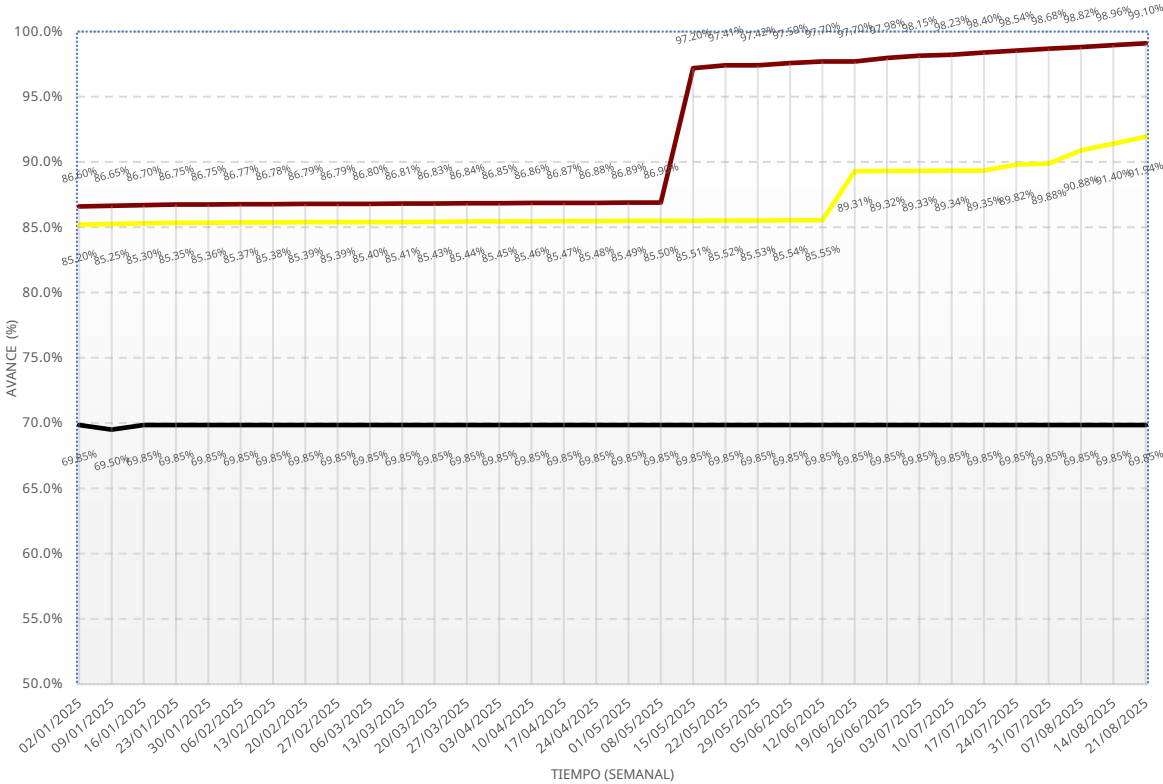

	08 de agosto al 14 de agosto	15 de agosto al 21 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	365	340
Maquinaria	42	45

