

Nayarit


Tramo Tepic-Compostela





Avance físico




- Programado: 100 %
- Real: 96.55 %
- Financiero: 88.28 %
- Semanal: 0.41 %

Concesionaria: FONADIN

 **Inversión:** 2,473.43 mdp

-  **Meta:** 28 km
- 1 Plaza de cobro,
 - 10 Puentes,
 - 2 PSFC,
 - 1 Entronque (solo gazas)
 - 19 Cruces
 - Ramal Aeropuerto

 **Inicio:** Marzo 2023
Término: 31-Oct-2025

-  **5,500** empleos generados
-  **490 mil** habitantes beneficiados
-  **35 minutos** de ahorro en tiempo

Nayarit

Tramo Tepic-Compostela




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	15/08/25 al 21/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m³)	1,982,866.26	1,974,874.62	7,991.64	4,500.00	5,600.00	
Subyacente (m³)	290,689.00	268,936.49	21,752.51	0	0	
Puente 16.01 km 16+393.50						
Cortes (m³) Estabilización de taludes	2,443,497.56	2,375,372.63	68,124.93	10,500.00	12,000.00	
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	1	1	0	0.04	Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. En revisión fuerza de trabajo necesaria.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

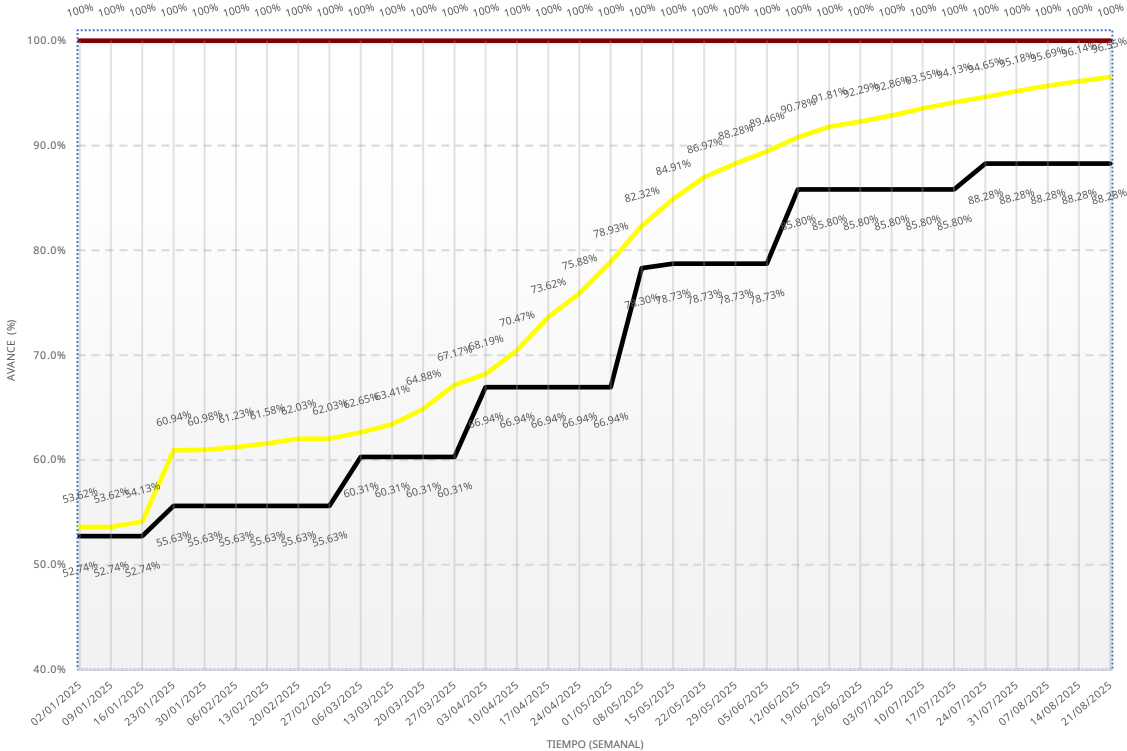

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	08 de agosto al 14 de agosto	15 de agosto al 21 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	480	450
Maquinaria	86	71
