

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde - La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

VERACRUZ

PIV 6.8
Estribo 01 Trabajos de armado de acero de refuerzo en muro frontal y aleros, 3er y ultimo trepado.

Puente 7.8 km. 7+860 pendiente montaje de trabes.

Puente 8.7 km. 8+665 pendiente montaje de trabes



Soyacautla




Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080
8	PIV 6.8 Km 6+806 (33.00%)
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura.
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+860, (45.00%) se continua en espera de montaje de trabes.
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC.
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (45.00%) se continua en espera de montaje de trabes.
14	PSMA 8.9 Km 8+960, (100.00%)
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841


Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido


Avance físico


- Programado: 50.96%
- Real: 23.11% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 15.71%
- Semanal: 0.48%


 **Inversión: 2,252.78 mdp**

 **Inicio:** Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026

 **Meta:** 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMAs, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa

 **2,252.78 (1)=2,253** empleos directos generados/millón de inversión
2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión

 **128,000** habitantes beneficiados

 **45 minutos** de ahorro en tiempo, Tramo 4

Laguna Verde - La Mancha



Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.






Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 74.48%
- Semanal: 0.00%

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512) (100.00%)
2	ODT 92+827.25 (100.00%)
3	PSPyG 92+832.22 (100.00%)
4	Ampliación de ODT 100+102, (100.00%)

Simbología


-  Por construir
 En proceso de construcción
 Concluido

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde - La Mancha

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	08/01/26 al 15/01/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Despalme	229,302.80	62,999.21	166,303.59	7,165.00	3,935.13	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 5 km.
Subyacente	162,462.20	48,835.66	113,626.54	27,077.03	189.17	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 5 km.
Subrasante	124,961.00	4,205.23	120,755.77	17,851.57	449.38	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 5 km.
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Zapata	4	2	2	0	0	PIV 6.8 Km 6+806 Estribo 01 se concluyeron los trabajos de colado de zapata.
Muros	2	1	1	1	0	Se realizan los trabajos de armado de acero de refuerzo en muro tercer trepado en estribo 1 del PIV 6.8 Km 6+806
Aleros	4	2	2	2	0	Se realizan los trabajos de armado de acero de refuerzo en aleros 1 y 2 tercer trepado en estribo 1 del PIV 6.8 Km 6+806

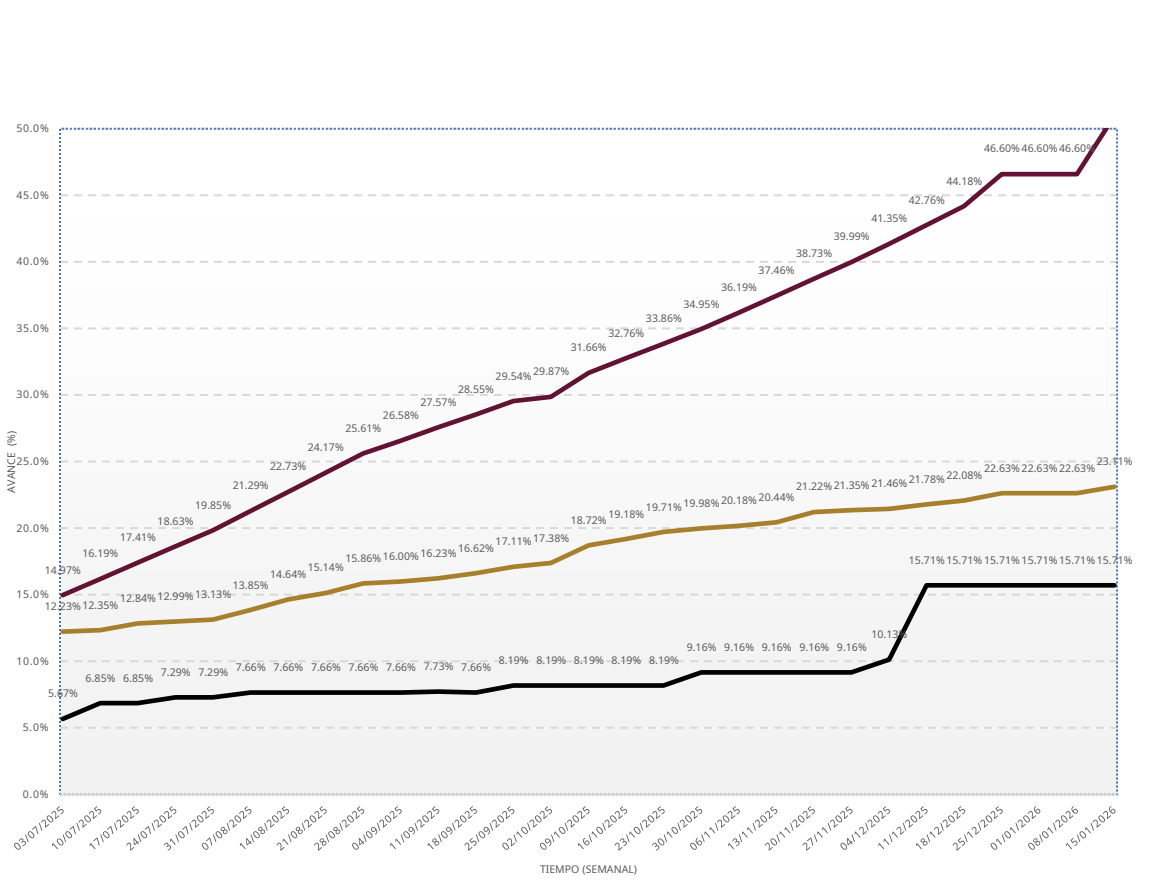

Avance Programado Avance Físico *Avance Financiero

	18 de diciembre al 25 de diciembre	09 de enero al 15 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	68	92
Maquinaria	23	20
Frente de Trabajo	Del km 4+435 al 11+500	PIV 6.8 Km 6+806
