

Colima

Tramo Armería-Manzanillo


Avance físico

• Programado: 88.96%

• Semanal: 1.56 %

• Real: 31.28%

• Financiero: 20.79%

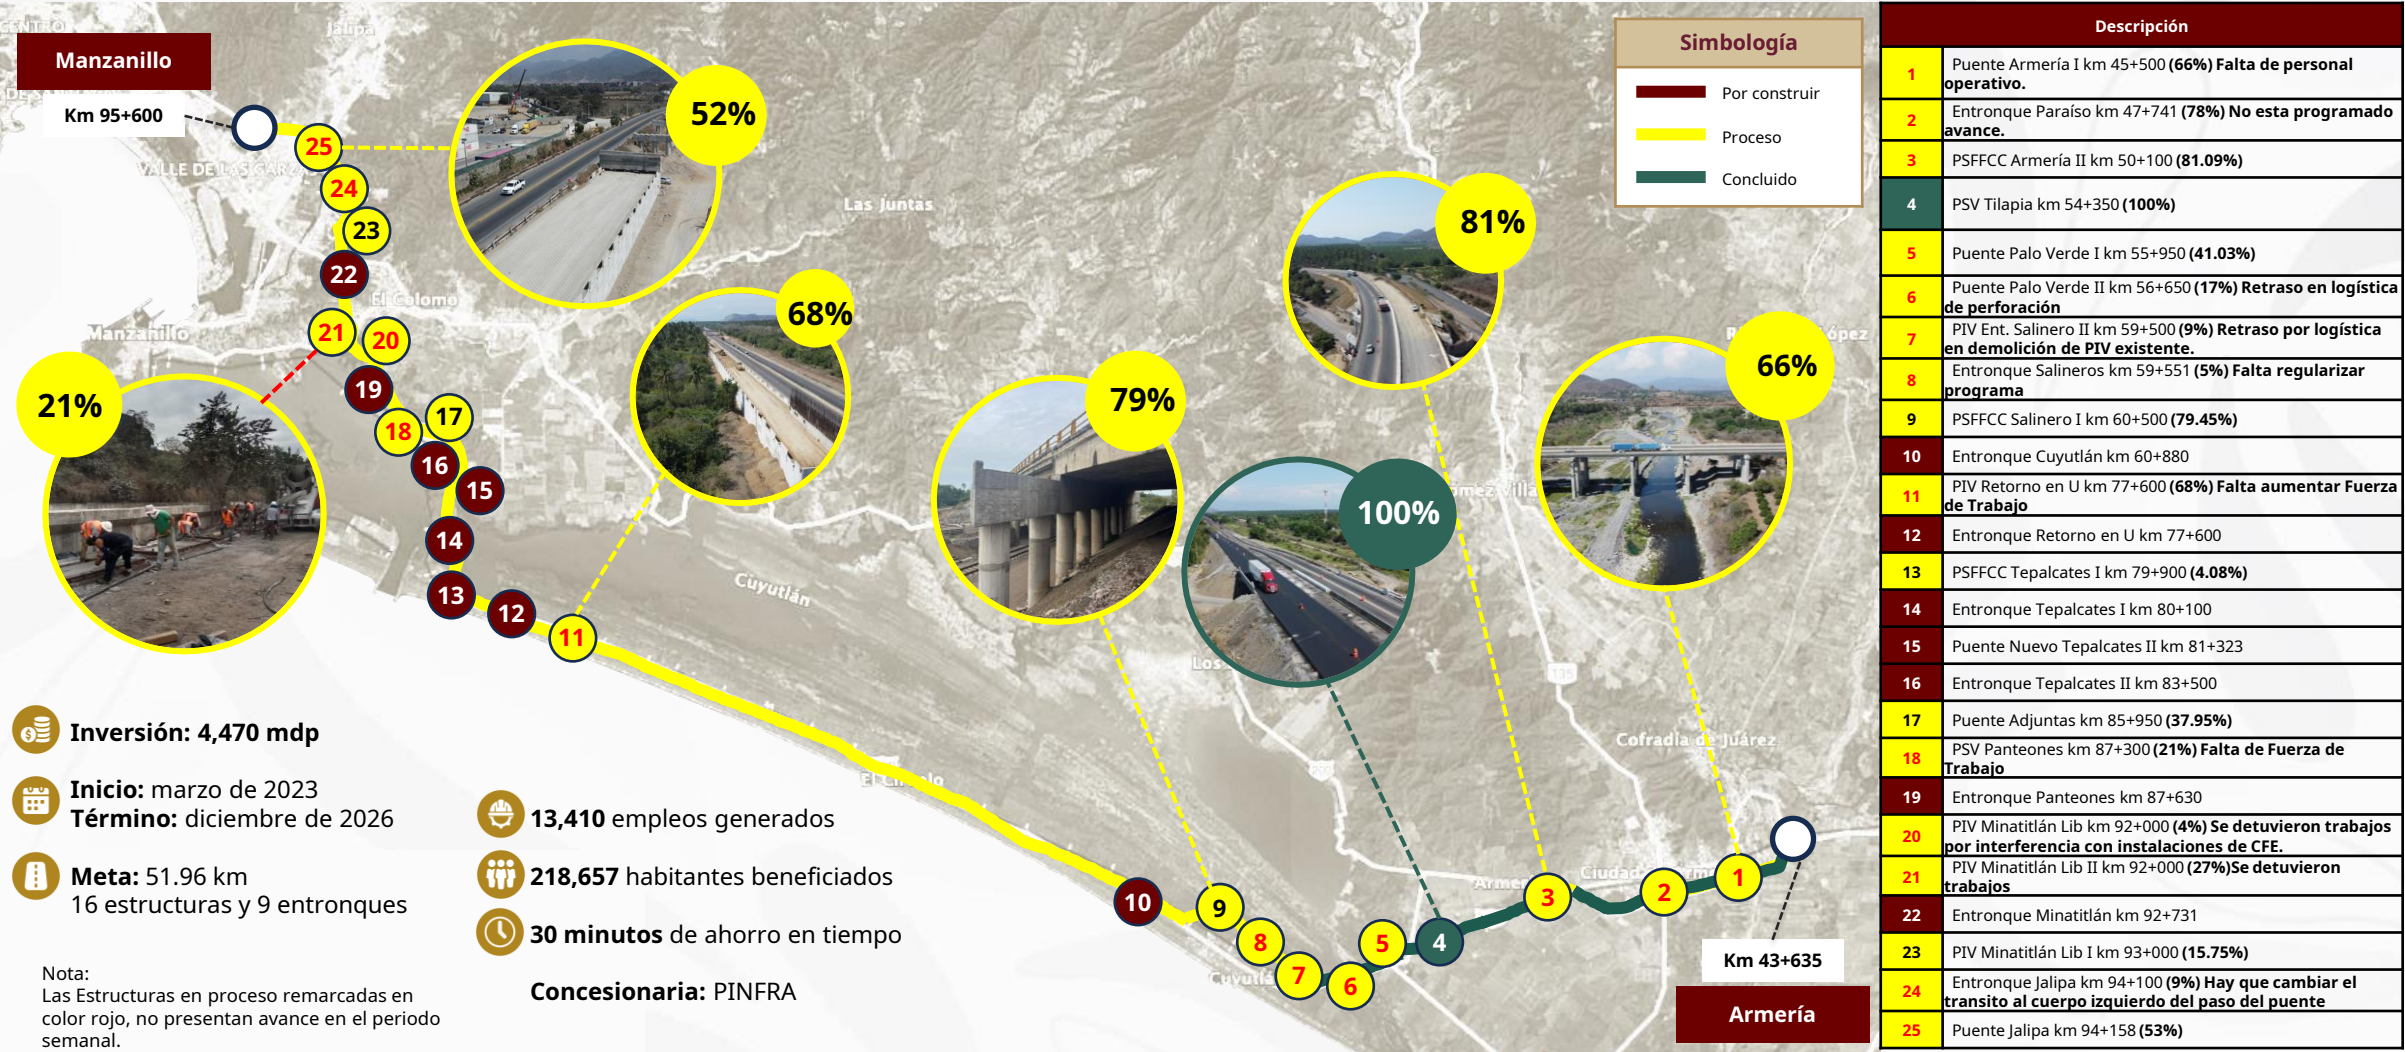


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Meta	Ejecutado	Faltante	29/08/25 al 04/09/25		Observaciones
		acumulado		Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Terraplenes (m³)	813,909	494,138	319,771	0	1,103	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Base y sub base (m³)	260,119	135,425	124,694	0	3,069	

Nota: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

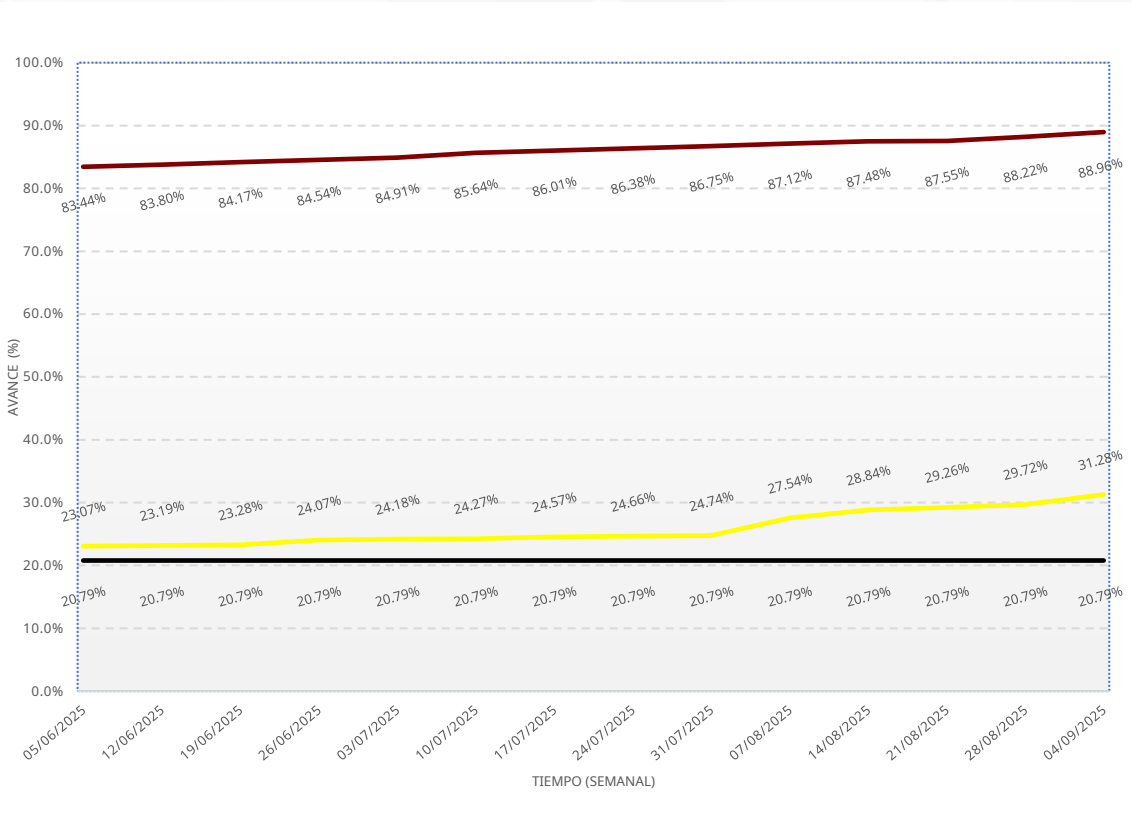

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	22 de agosto al 28 de agosto	29 de agosto al 04 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	158	156
Maquinaria	59	31

