


Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Avance físico


- Programado: 99.52%
- Real: 93.46%
- Semanal: 0.52 %
- Financiero: 69.85%

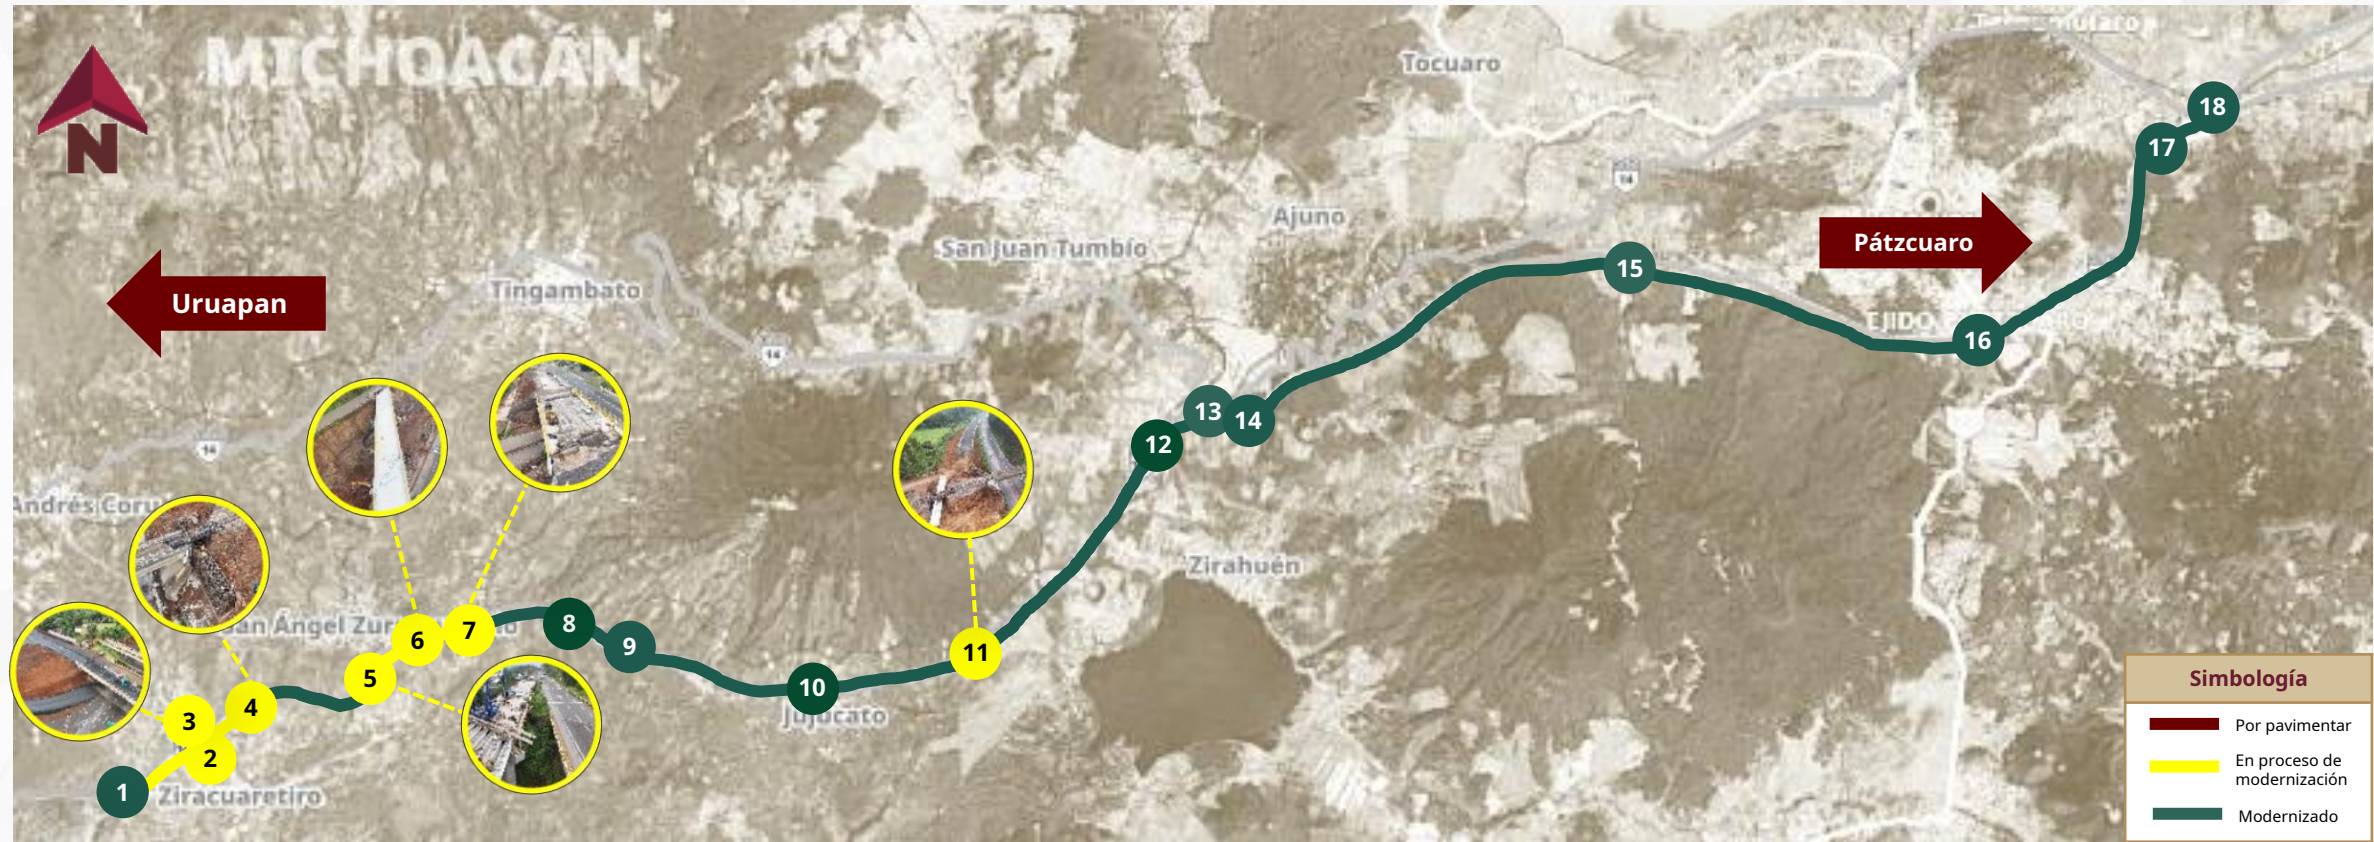



Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500
2	Puente canal km 92+210 (99.00%)
3	Entronque Caracha km 92+100, (84.25%).
4	PIFFCC km 91+754, (38.20%).
5	Puente Canintzio km 88+283, (82.70%)
6	PIV km 88+054, (97.10%)


Descripción	
7	Entronque San Ángel km 87+400, (98.00%)
8	Rampa de emergencia II km 86+500
9	Rampa de emergencia I km 84+100
10	Entronque Jujucato km 79+489
11	PIFFCC km 73+584, (36.80%)
13	Viaducto Zirahuén km 70+278
13	Entronque Zirahuén km 68+600


Descripción	
14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
18	Entronque las trojas km 47+00

 **Inversión:** 1,792 mdp

 **Inicio:** Julio 2017
Término: Diciembre 2025

 **Meta:** 46.79 km; 58 Totales (1 plaza de cobro, 1 puente, 1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).

 **200 mil habitantes beneficiados**

 **25 minutos de ahorro en tiempo.**

Concesionaria : PINFRA.


Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	05/09/2025 al 11/09/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PIFCC km 73+584. Cabezales	2	1	1	1	1	Retiro de cimbra de madera y suministro de vigas cajón metálicas para cabezal #1
PSV km 87+494 Cono de derrame	2	1	1	1	1	Colado de losas para conos de derrame lado C2
PIV km 88+054 Juntas de dilatación	5	4	0	1	1	Colocación de juntas de dilatación.
Puente Canintzio km 88+283 Parapeto de concreto.	2	1	1	1	1	Colado de parapeto de concreto (ambos lados)
Puente Canintzio km 88+283 Parapeto metálico.	2	1	1	1	1	Suministro y colocación de parapeto metálico
PIFCC km 91+754. Obra falsa	2	1	1	1	1	Corte y retiro de material previo a trabajos de maniobras de montaje de vigas cajón metálicas

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

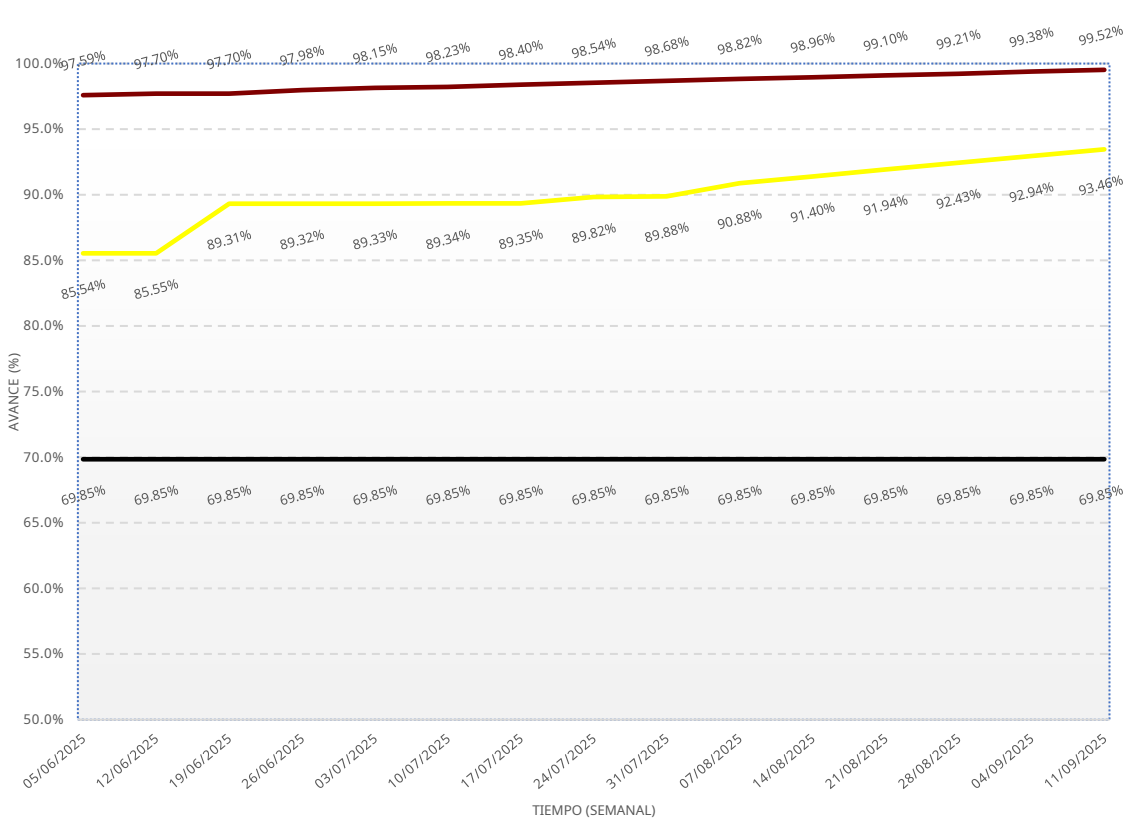

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	29 de agosto al 04 de septiembre	05 de septiembre al 11 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	120	120
Maquinaria	31	32



2025
Año de
La Mujer
Indígena
