

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco



Descripción	
1	Entronque Chiluca 15.00%, sin actividad, falta de recursos
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 53.00%, sin actividad, falta de recursos
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 53.08%
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 32.52%
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 46.25%, sin actividad, sin recursos
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 32.87%
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 25.47%, sin actividad, falta de recursos
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 00.22%, sin actividad, problemas sociales
11	Viaducto El Llano km 51+016.00 00.90%, sin actividad, problemas sociales
12	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 03.80%, sin actividad, problemas sociales
13	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 00.00%
14	Viaducto El Pescado km 75+482.00 00.00%
15	Viaducto El Salto km 91+874.00 16.80%, sin actividad, problemas sociales
16	Entronque Atlacomulco

Simbología


Por construir


En proceso de modernización

Modernizado





2025
Año de
La Mujer
Indígena

- 


Inversión: 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)
- 


Meta: 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG


- 

Inicio: 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027
- 

Avance físico:
 - Programado: 71.50%
 - Real: 37.93%
 - Financiero: 22.62%
 - Semanal: 00.20%

- 

132,909 empleos generados
- 

1 millón 244 mil habitantes beneficiados
- 

60 minutos de ahorro en tiempo

Estado de México


Atizapán-Atlacomulco



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	18/07/25 al 24/07/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	184	160	2	0.54	<ul style="list-style-type: none">Falta de personalEn revisión fuerza de trabajo, se requiere incrementar para cumplimiento de alcances
Zapatas	86	39	47	1	0.40	
Columnas	96	18	78	1	0.16	
Cabezales	76	6	70	1	0.19	
Caballetes	24	4	20	1	0.17	
Trabes metálicas	29	0	29	0.5	0.57	

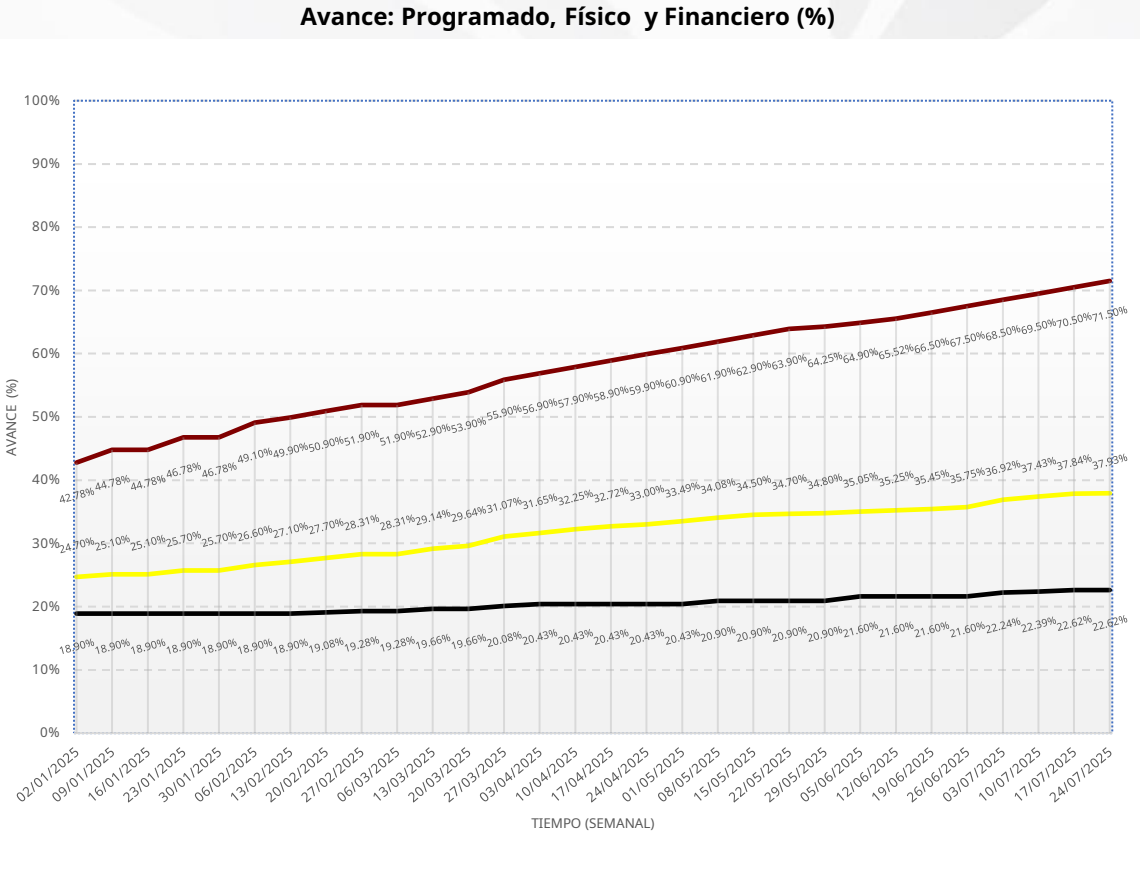

	Avance Programado	Avance Físico	Avance Financiero
	Del 11 julio al 17 de julio	18 de julio al 24 de julio	
Fuerza de Trabajo (personas)	2,275	2,275	
Maquinaria	521	521	



2025
Año de
La Mujer
Indígena
