


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance físico

- Programado: 95..95%
- Semanal: 0.63 %
- Real: 37.25%
- Financiero: 20.79%

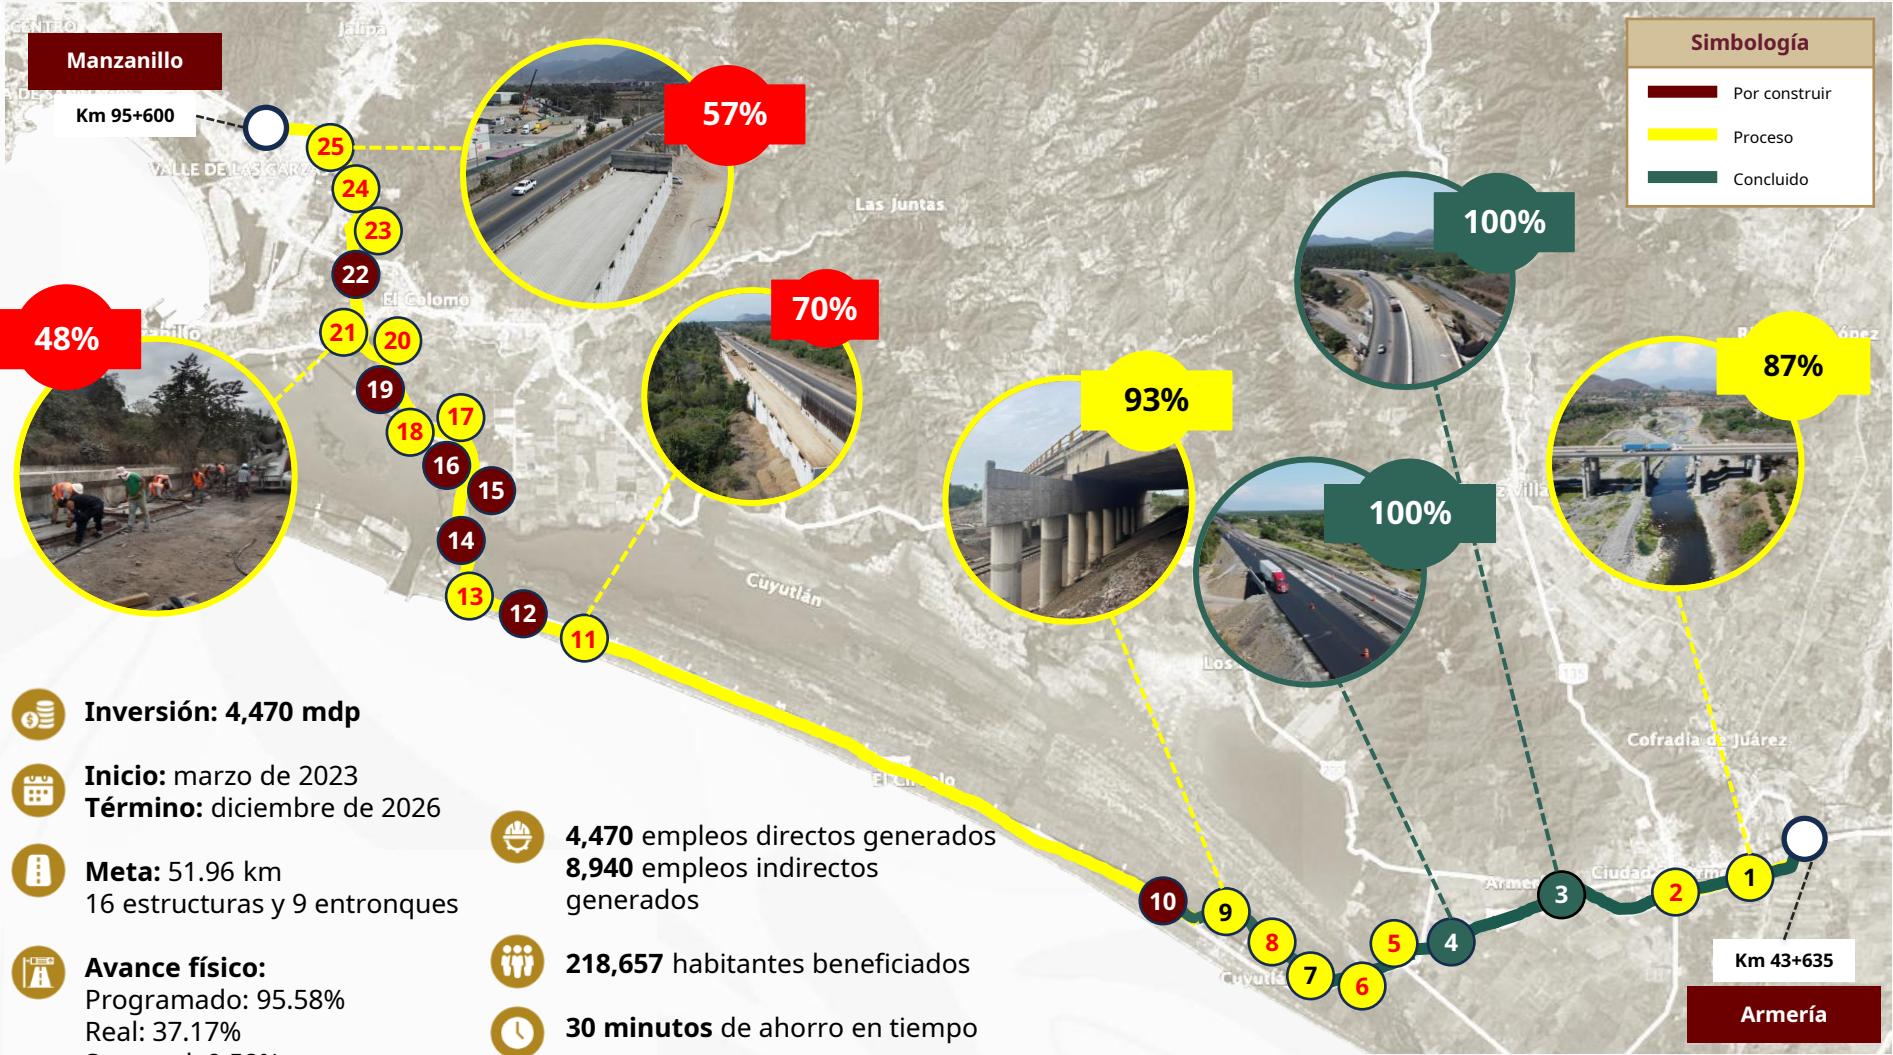

Inversión: 4,470 mdp

Inicio: marzo de 2023
Término: diciembre de 2026

Meta: 51.96 km
16 estructuras y 9 entronques

Avance físico:
Programado: 95.58%
Real: 37.17%
Semanal: 0.58%
Financiero: 20.79%

4,470 empleos directos generados
8,940 empleos indirectos generados

218,657 habitantes beneficiados

30 minutos de ahorro en tiempo

Concesionaria: PINFRA

NOTA: Se trabaja para actualizar el estatus financiero en la siguiente ficha


Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (87%)
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance.
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (100%)
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (42%) Se descabezaron pilas para armado de cabezales.
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (25.25%) En proceso de planeación para montajes.
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (83%)
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) Falta regularizar programa
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (93%)
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (70.66%) No se tuvieron trabajos programados
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900 (52%) Sin actividades programadas
14	Entronque Tepalcates I km 80+100 Falta atención de observaciones a las tarjetas indicadas en el Oficio 3.1.1.-369/2023
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323 La inversión presentada en es base a costos paramétricos, contará con cambios una vez que se tenga el programa definido
16	Entronque Tepalcates II km 83+500 Solo se encuentra aprobado el trazo, ubicado en el mismo cadenamiento conforme el oficio 3.4.3-1696 del entronque Retorno en U
17	Puente Adjuntas km 85+950 (67%) El trabajo programado para esta semana, está concluido
18	PSV Panteones km 87+300 (21%) Falta de Fuerza de Trabajo
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
21	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (48%) Trabajo programado para esta semana concluido
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (16%) No hay trabajos por logística de perforación.
24	Entronque Jalipa km 94+100 (9%) Hay que cambiar el transito al cuerpo izquierdo del paso del puente
25	Puente Jalipa km 94+158 (57%) El trabajo programado para esta semana, está concluido

Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	26/12/25 al 01/01/26		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	275,567	0	0	270	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	542,321	271,588	0	949	
Base y sub base (m³)	260,119	171,496	88,623	0	1,991	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

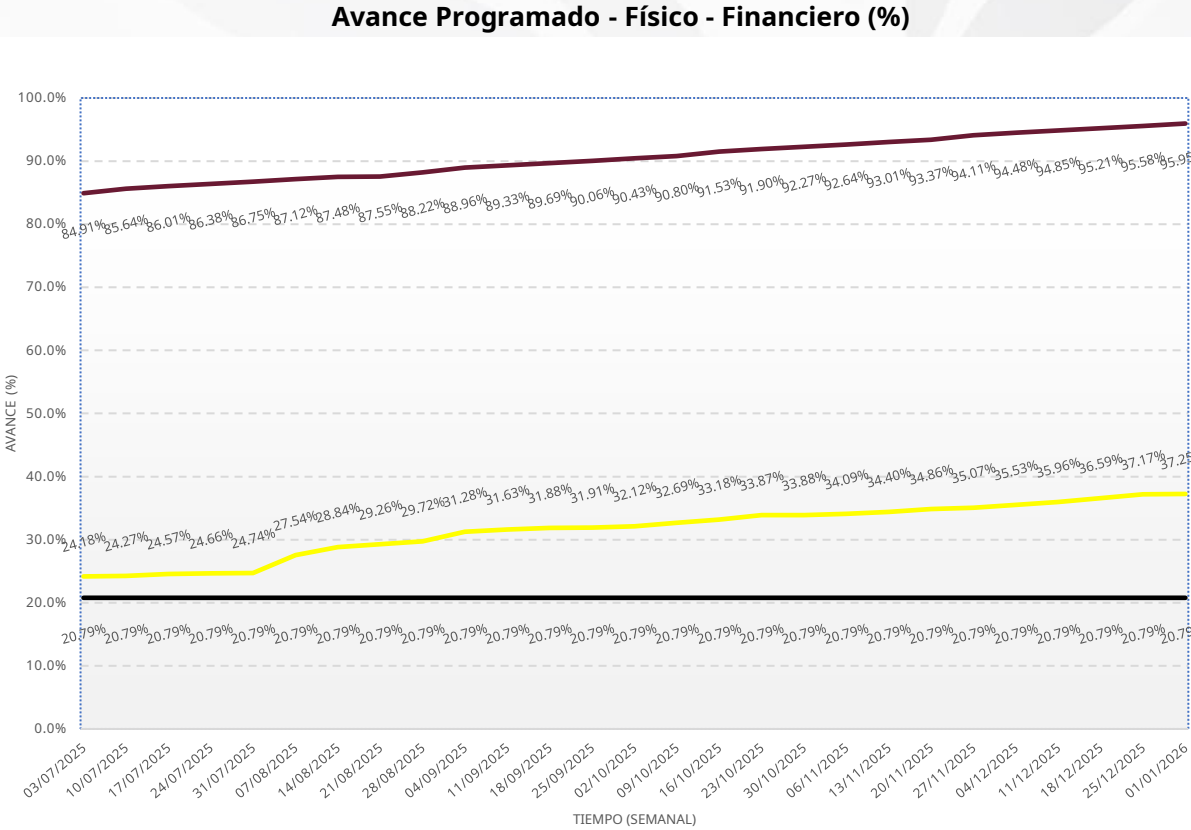

	12 de diciembre al 18 de diciembre	25 de diciembre 2025 al 01 de enero 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	132	51
Maquinaria	59	28
Frentes de trabajo	Tramo 1:Armería I Tramo 2: Minatitlan, Palo Verde II, Salinero II, Minatitlan I, Salinero I, Adjuntas, Panteones, Minatitlan II, Canal	N.D.

