

# Oaxaca

## Mitla-Entronque Tehuantepec II

Avance físico

• Programado: 100%

• Semanal: 0.02%

• Real: 99.60%

Avance obra pendiente

• Real: 95.02%

Avance financiero

• Real: 98.95%

• Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,704.81 mdp por trabajos ejecutados.




| Descripción |   |
|-------------|---|
| 1           | PIV km 87+900. 40% Conflicto entre sindicatos de camioneros |
| 2           | PIP km 91+530. 100%   |
| 3           | PIPR km 92+436. 100%  |
| 4           | PIV km 92+438. 100%   |
| 5           | PIP km 92+680. 0%   |
| 6           | Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% Problemas D.V.       |
| 7           | Entronque Llano Laguna km 98+200. 100%                      |


| Descripción |  |
|-------------|--|
| 8           | Entronque Cerro Pascale km 100+500. 100% |
| 9           | PIP km 106+570. 100%                     |
| 10          | PIP km 108+570. 100%                     |
| 11          | PIV km 109+247. 100%                     |
| 12          | PIV km 110+460. 100%                     |
| 13          | Entronque Danigare km 111+600. 100%      |

\*No hay avances debido a la falta de asignación de recursos


| Descripción |  |
|-------------|--|
| 14          | PIP km 112+270. 100%                   |
| 15          | PIV km 114+766. 100%                   |
| 16          | Entronque Agua Blanca Km 122+600. 100% |
| 17          | Entronque Quiavicuzas Km 137+900. 100% |
| 18          | PIPG Km 146+840. 95%                   |
| 19          | PIPG km 159+400. 95%                   |



**Inversión:** 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos




**Término:** Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)




**Meta:** 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre. En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre


**\*Nota:** De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar  
**\*El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso de determinar su solución**



**12,204** empleos generados



**+1 millón 400 mil** habitantes beneficiados



**2 hrs** de ahorro en tiempo

# Oaxaca

## Mitla-Entronque Tehuantepec II




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

| Elemento                    | Intervención | Ejecutado acumulado | Faltante | 15/08/25 al 21/08/25 |           | Observaciones |
|-----------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------------|-----------|---------------|
|                             |              |                     |          | Programado           | Ejecutado |               |
|                             |              |                     |          |                      |           |               |
| Esta semana no hubo avances |              |                     |          |                      |           |               |

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

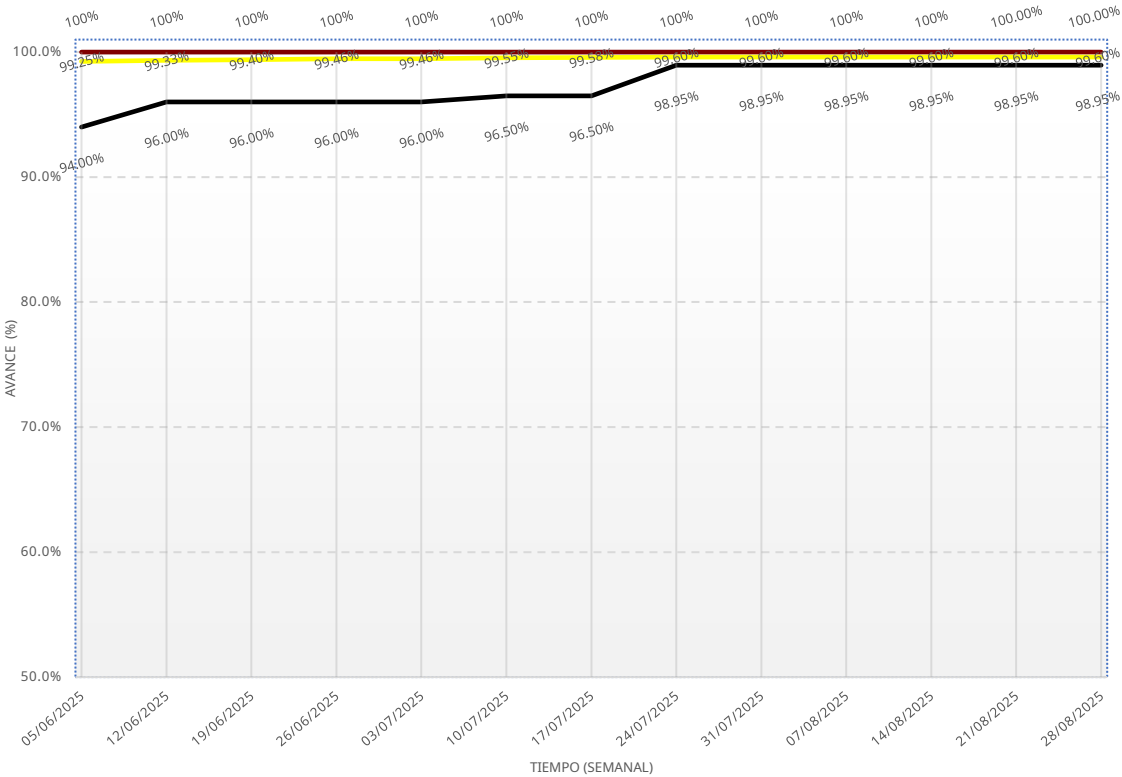

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

|                              | 15 de agosto al 21 de agosto | 22 de agosto al 28 de agosto |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 100                          | 100                          |
| Maquinaria                   | 25                           | 25                           |
