


Nayarit

Tramo Tepic-Compostela



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

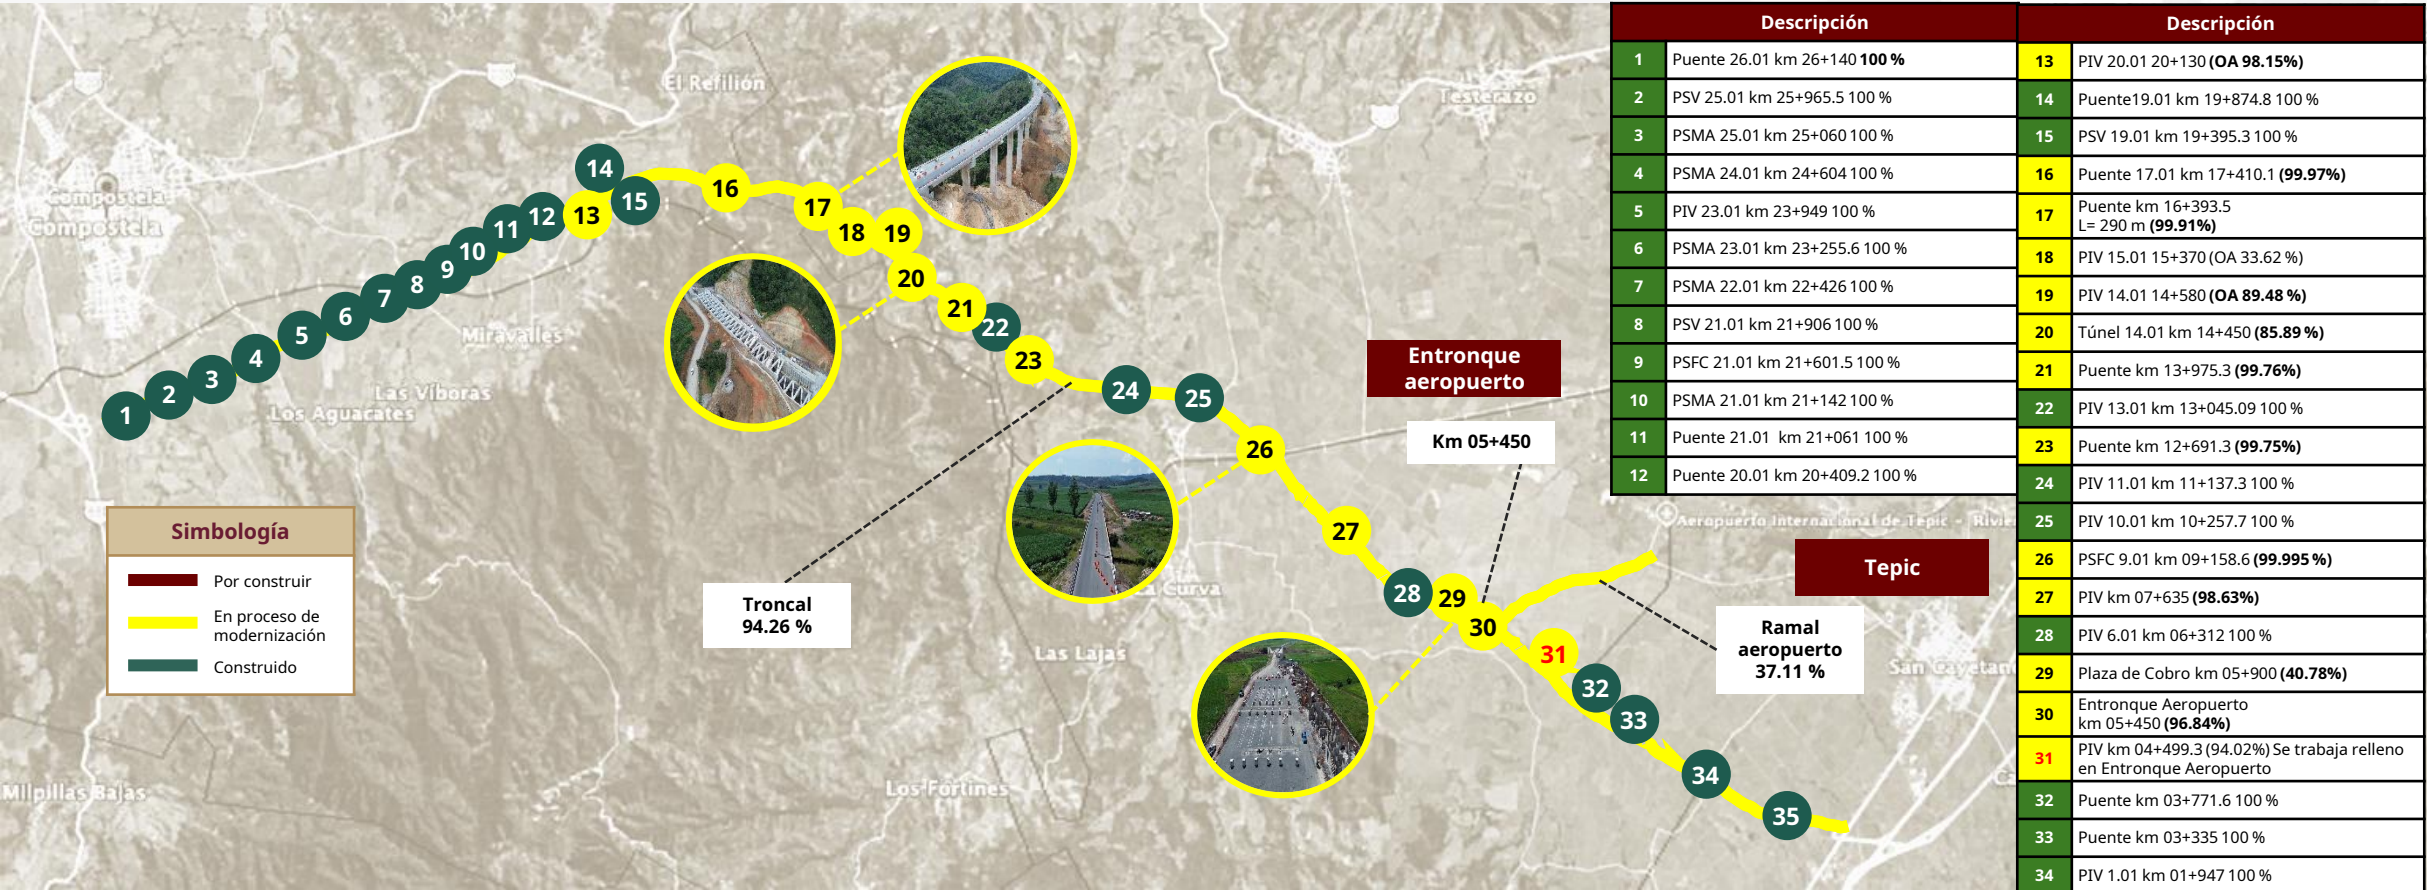

2025
Año de
La Mujer Indígena

Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 98.78 %
- Financiero: 88.28 %
- Semanal: 0.18 %

Concesionaria: FONADIN



Inversión: 2,473.43 mdp



Meta: 28 km

- 1 Plaza de cobro,
- 10 Puentes,
- 2 PSFC,
- 1 Entronque (solo gasas)
- 19 Cruces
- Ramal Aeropuerto



Inicio: Marzo 2023

Término: 31-Oct-2025



2,473 empleos directos generados
4,946 empleos indirectos generados



490 mil habitantes beneficiados




35 minutos de ahorro en tiempo

Nayarit

Tramo Tepic-Compostela

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	10/10/25 al 16/10/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m³)	1,982,866.26	2,038,299.62	-55,433.36	10,000.00	11,850.00	
Subyacente (m³)	290,689.00	273,686.49	17,002.51	0	0	
Puente 16.01 km 16+393.50						
Columnas	8	8	0			Trabajos concluidos.
Cortes (m³) Estabilización de taludes	2,443,497.56	2,423,372.63	20,124.93	0	0	
Obras de drenaje	77	77	0			Trabajos concluidos.
P.S.F.C. 9.01 km 09+158.50						
Losa (claro)	7	7	0			Trabajos concluidos.
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	2	0			Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. En revisión fuerza de trabajo necesaria.

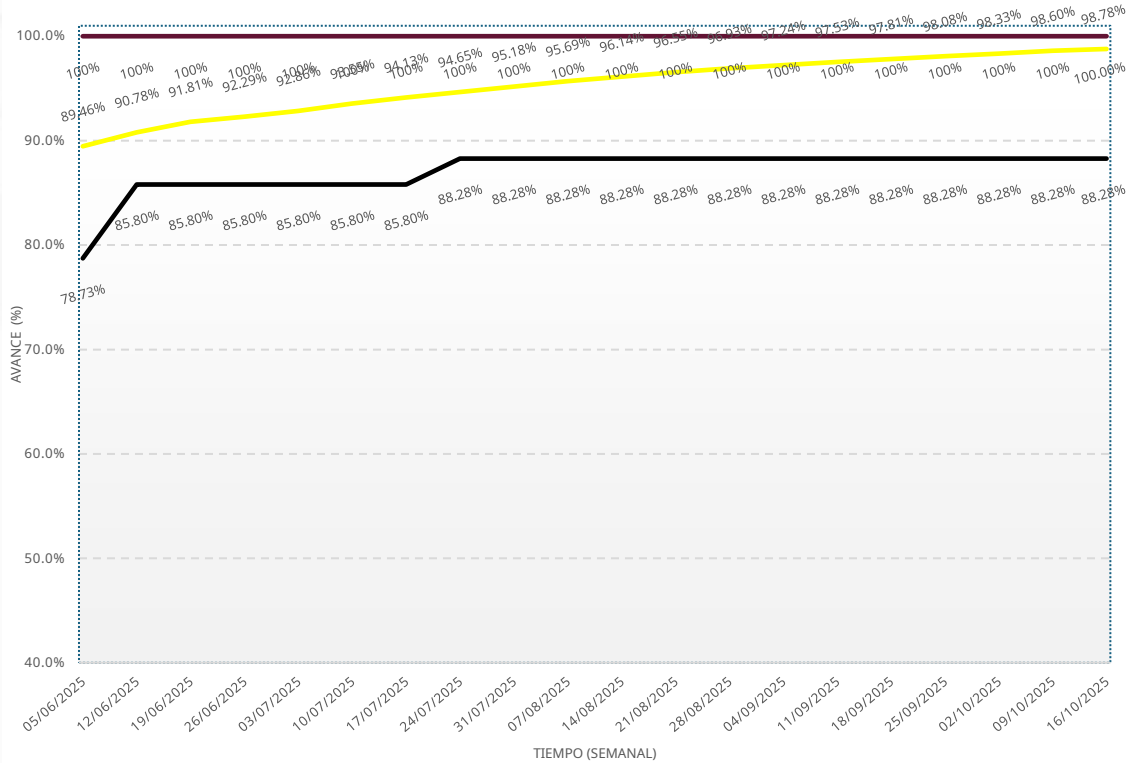

	03 de octubre al 09 de octubre	10 de octubre al 16 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	450	450
Maquinaria	71	71
