

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Avance físico

• Programado: 100%

• Semanal: 0.02%

• Real: 99.60%

Avance obra pendiente

• Real: 95.02%

Avance financiero

• Real: 97.96%


• Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,798 mdp por Trabajos ejecutados.




Descripción	
1	PIV km 87+900. 40% Conflicto entre sindicatos de camioneros
2	PIP km 91+530. 100%
3	PIPR km 92+436. 100%
4	PIV km 92+438. 100%
5	PIP km 92+680. 0%
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% Problemas D.V.
7	Entronque Llano Laguna km 98+200. 100%

Descripción	
8	Entronque Cerro Pascale km 100+500. 100%
9	PIP km 106+570. 100%
10	PIP km 108+570. 100%
11	PIV km 109+247. 100%
12	PIV km 110+460. 100%
13	Entronque Danigare km 111+600. 100%
14	PIP km 112+270. 100%


Descripción	
15	PIV km 114+766. 100%
16	Entronque Agua Blanca Km 122+600. 100%
17	Entronque Quiavicuzas Km 137+900. 100%
TT	Túnel El Tornillo km 139+400 (Colapsado)
18	PIPG Km 146+840. 95%*
19	PIPG km159+400. 95%*



Inversión: 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos



Término: Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)



Meta: 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre. En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre

❖ Nota: De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar

❖ El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso de determinar su solución



29,749 empleos generados y 59,498 empleos indirectos



+1 millón 400 mil habitantes beneficiados



2 hrs de ahorro en tiempo

*No hay avances debido a la falta de asignación de recursos


Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulad o	Faltante	31/10/25 al 06/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Muro de pilas km 92+700						
Perforación de pilastrones	38	17	23	0	0	• Descabezado de pilotes y colado de tramos de columna para soportar viga de coronamiento.
Armado y colado de pilastrones	38	17	24	0	0	

❖Nota: A partir de esta fecha, ya no existirán avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.

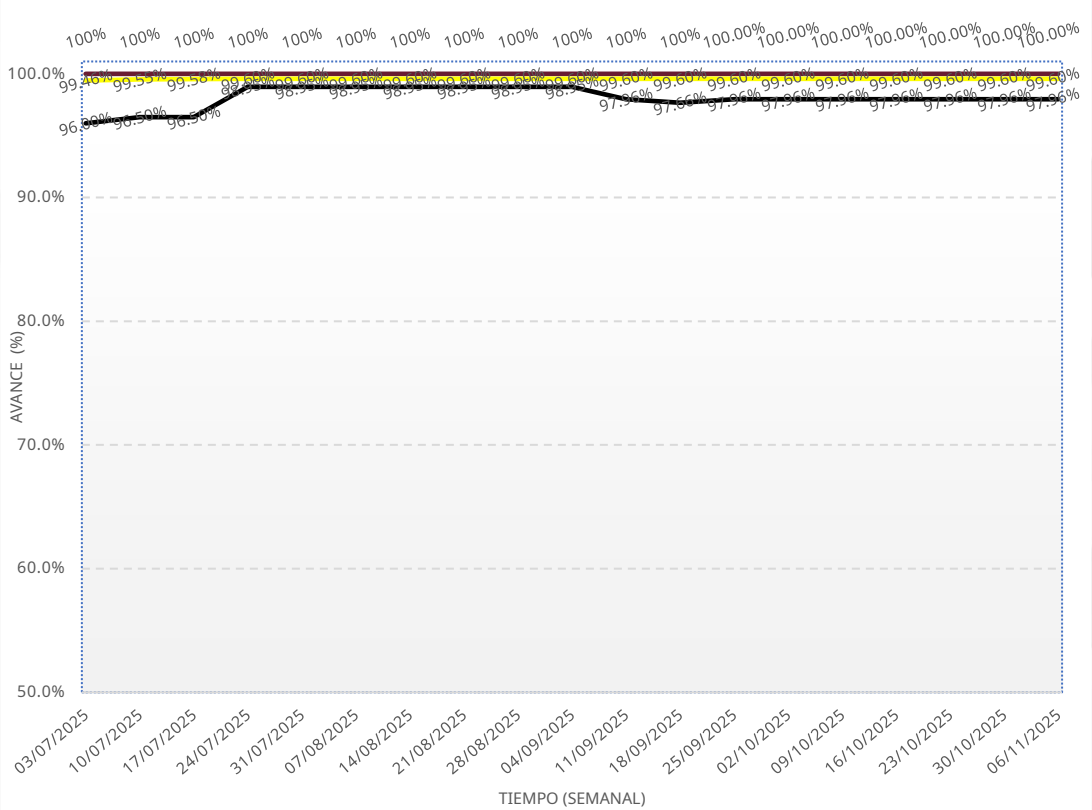

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	24 de octubre al 30 de octubre	31 de octubre al 06 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	30	30
Maquinaria	9	9

