


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance físico

- Programado: 92.64%
- Semanal: 0.21 %
- Real: 34.09%
- Financiero: 20.79%

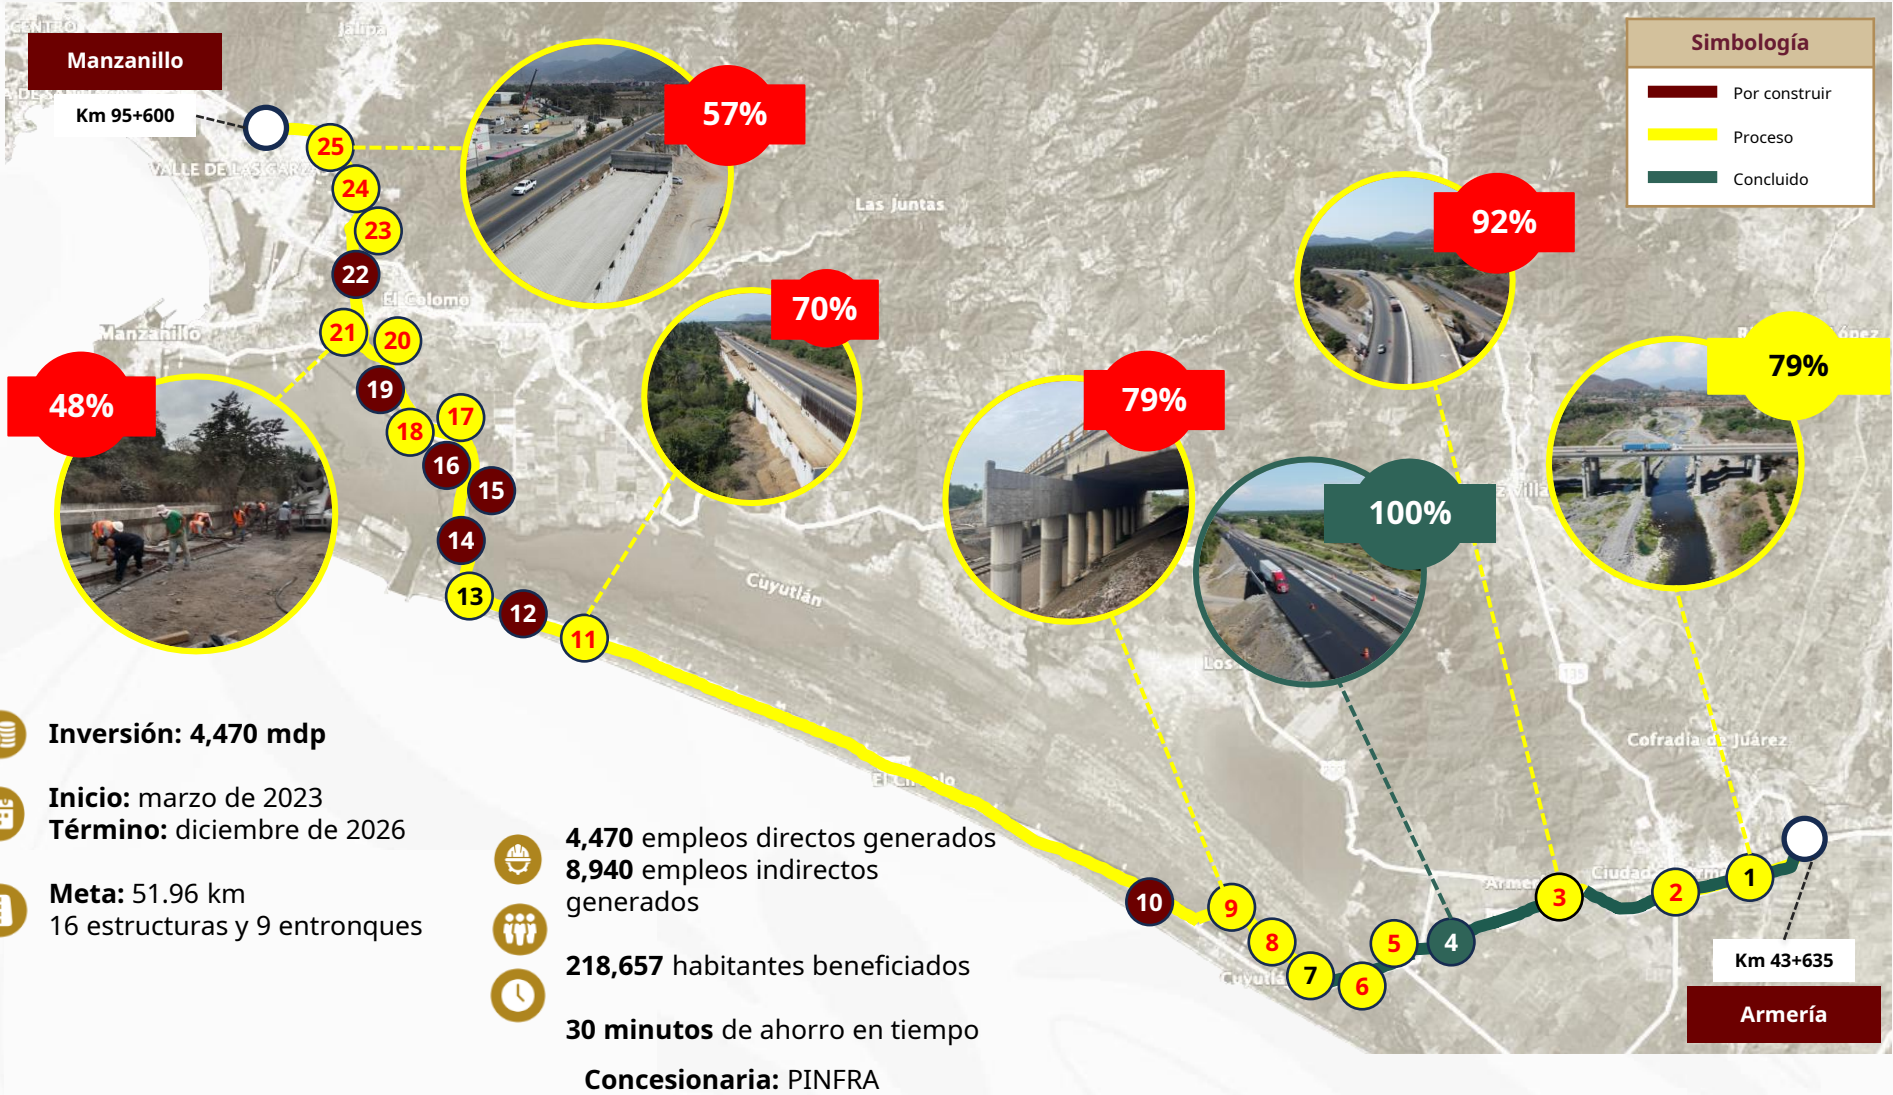

Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (79%)
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance.
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (92%) Se concilian volúmenes de avance
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (42%) No se tuvieron trabajos programados
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (17%) Retraso en logística de perforación.
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (15%)
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) Falta regularizar programa
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (79.45%) Sin trabajos programados para esta semana
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (70.66%) No se tuvieron trabajos programados
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900 (39%)
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (57%) Sin trabajos programados para esta semana
18	PSV Panteones km 87+300 (21%) Falta de Fuerza de Trabajo
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
21	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (48%) Sin trabajos programados para esta semana.
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (15.75%) No se ha comenzado en esta estructura por logística de perforación
24	Entronque Jalapa km 94+100 (9%) Hay que cambiar el transito al cuerpo izquierdo del paso del puente
25	Puente Jalapa km 94+158 (57%) El trabajo programado para esta semana, está concluido


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	31/10/25 al 06/11/25		Observaciones
		acumulado		Programa do	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	269,522	0	0	228	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	513,017	300,893	0	2,058	
Base y sub base (m³)	260,119	154,883	105,236	0	2,723	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

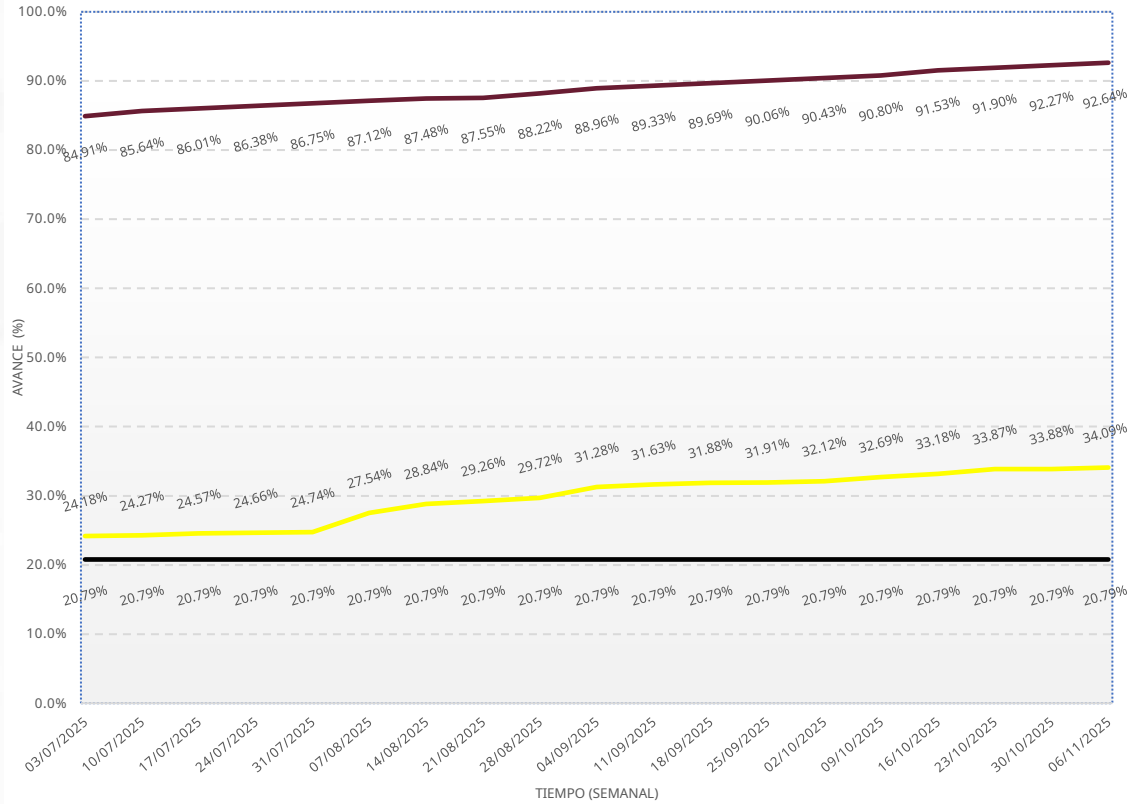

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	24 de octubre al 30 de octubre	31 de octubre al 06 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	163	159
Maquinaria	68	65

