





# Jalisco

## Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

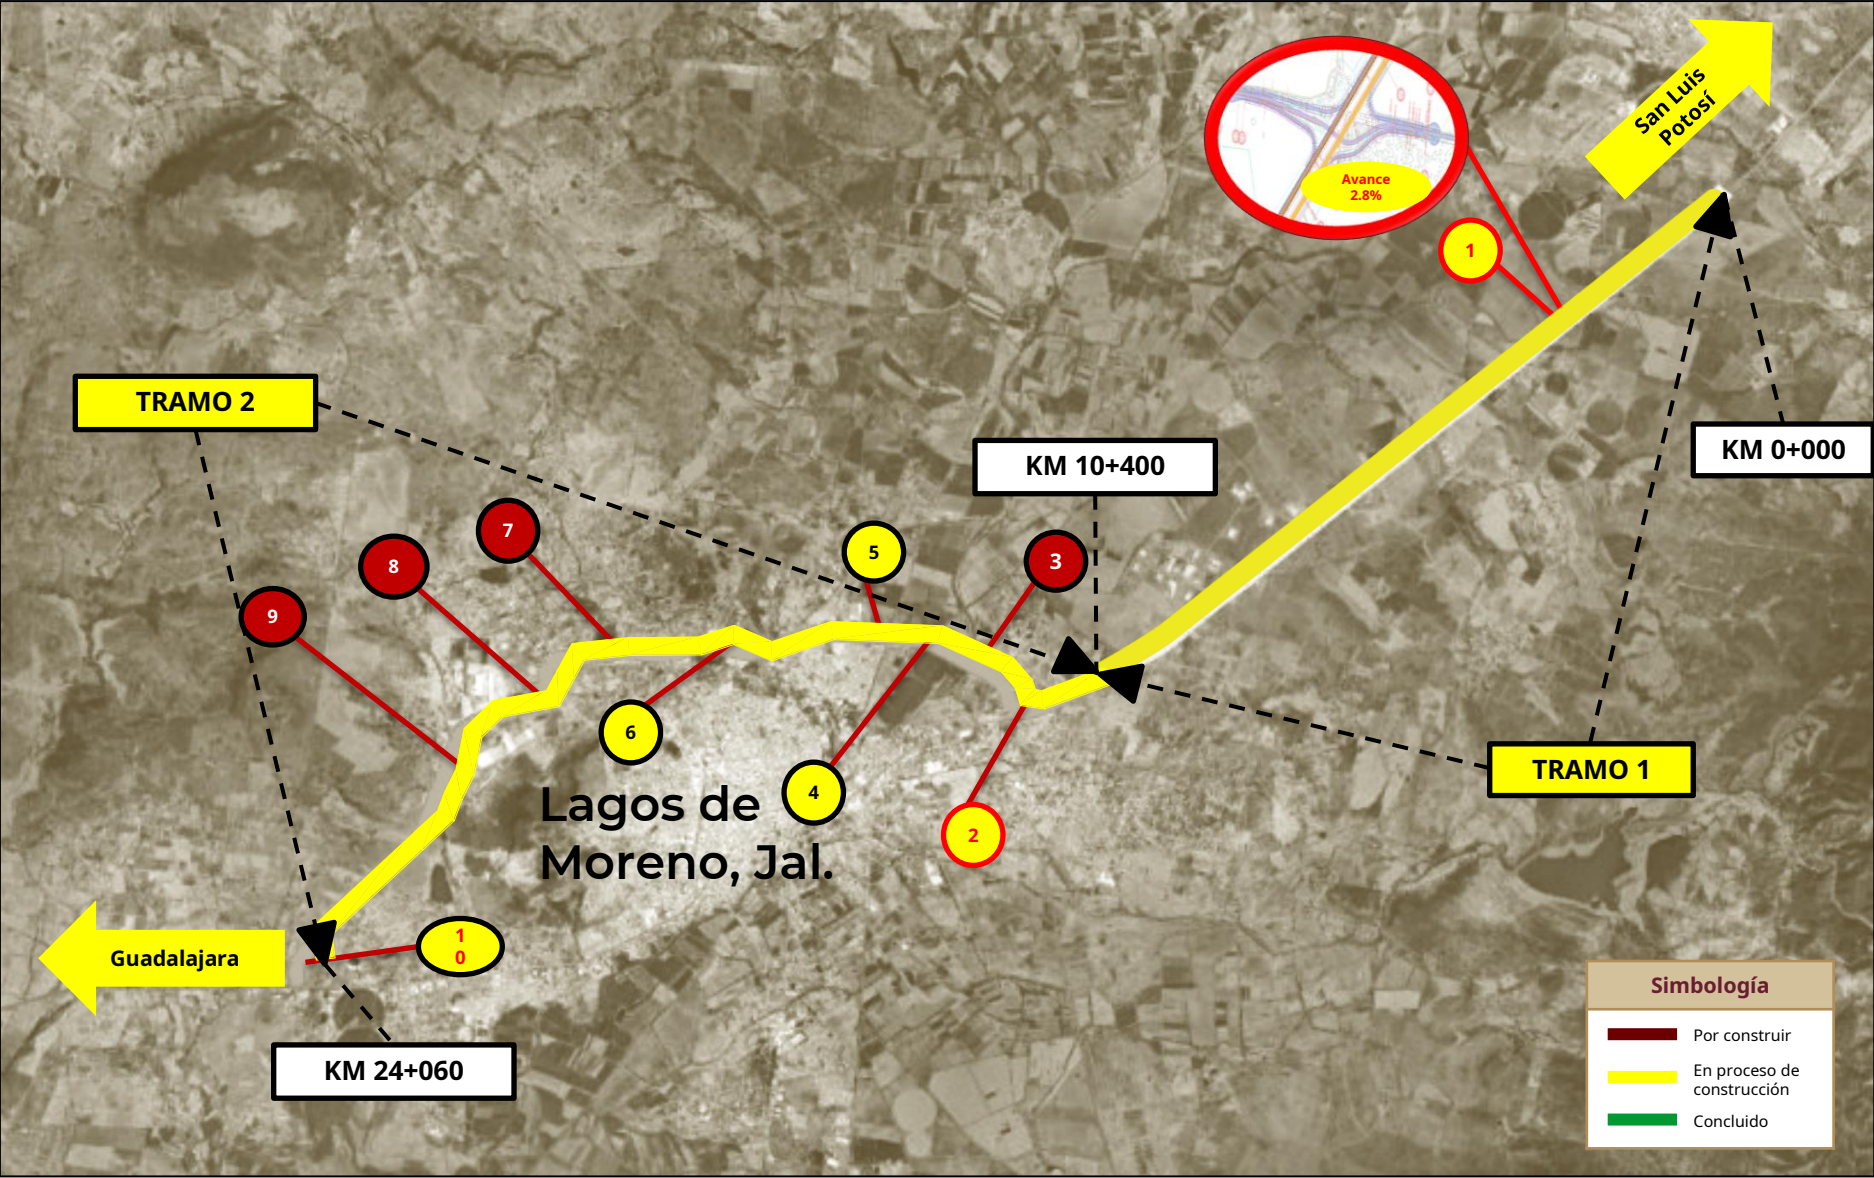

Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - <b>Avance 2.8%. Problemas de DDV.</b>
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 10.97 %, Sin avance esta semana por logística de obra (Proceso constructivo).
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120
4	Puente km 12+450 "Rio Lagos"- Avance 22.97%
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 2.54%
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 2.67%
7	PIV con entronque "Santorini" km 17+800
8	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
9	PSFC con retornos km 19+860
10	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 7.75%, Sin avance esta semana por logística de obra (Proceso constructivo).

### Avance físico general

- Real: 38.14%
- Programado: 25.98%
- Semanal: 1.97%
- Financiero: 21.17 %
-  **Inversión: 2,345 mdp**
-  **Inicio:** 1 de marzo de 2025  
**Término:** 28 de febrero de 2028
-  **Meta:** 25 km
-  **7,035 empleos generados**  
(2,345 empleos directos y 4,690 empleos indirectos)
-  **250,000 habitantes beneficiados**
-  **20 minutos** de ahorro en tiempo


# Jalisco

## Ampliación Libramiento Lagos de Moreno



Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TRONCAL TRAMO 2							
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	07/11/25 al 13/11/25		Observaciones	
				Programad o	Ejecutado		
Subyacente	49,010	15,000	34,010	717.50	4,684.91	En proceso	
Subrasante	46,635	14,500	32,135	682	3,208.22	En proceso	
Base hidráulica	34,468	10,300	24,168	641	3,388	En proceso	
Pedraplén	26,600	6,500	20,100	390	500	En proceso	
Base asfáltica	35,228	650	34,578	644	650	En proceso	
TRAMO 2 PSV AVANCE DE ESTRUCTURAS							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	07/11/25 al 13/11/25		Observaciones
					Program ado	Ejecutado	
Puente km 12+450	%	100%	22.97%	77.03%	0.00	0.33%	En proceso
PIV KM 13+600	%	97.46%	2.54%	77.36%	0.00	1.68%	En proceso
PSV km 15+900	%	100%	2.67%	97.35%	0.00	0.02%	En proceso
PIV km 23+920	%	100%	7.75%	92.25%	0.00	0.04%	En proceso

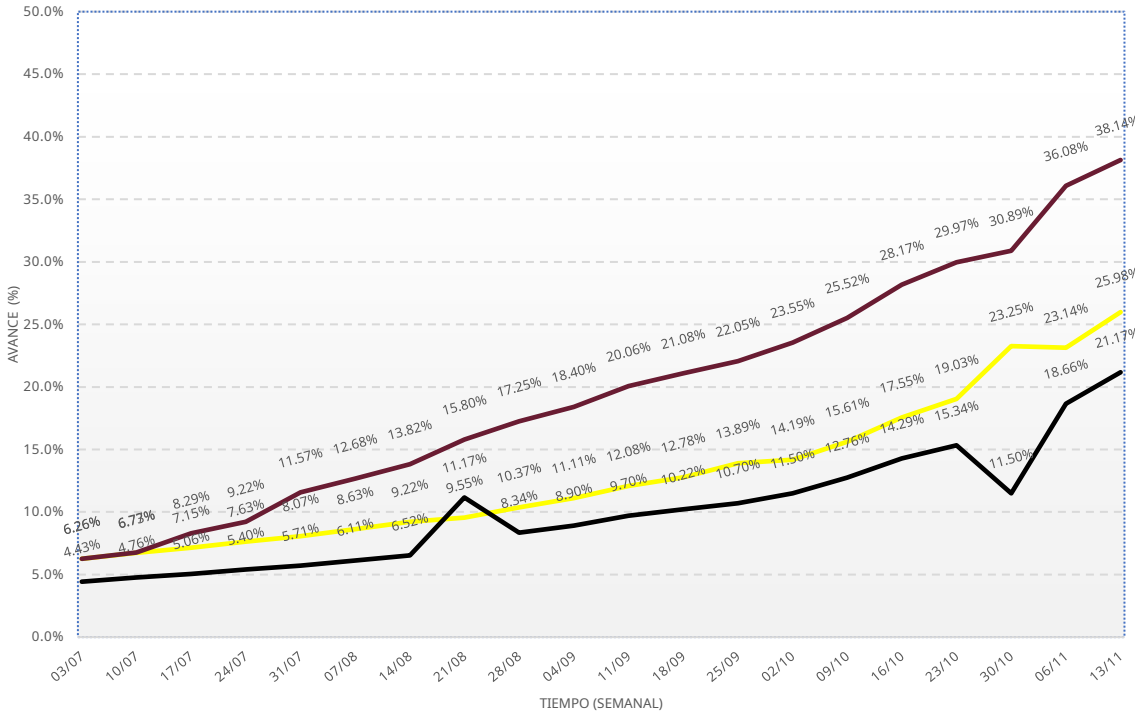

Avance Programado Avance Físico \*Avance Financiero

	31 de octubre al 06 de noviembre	07 de noviembre al 13 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	107	103
Maquinaria	18	14



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena
