

# Michoacán

## Uruapán-Nueva Italia


Avance físico

• Programado: 6.5%

• Real: 6.0%

• Semanal: 0.1 %

• Financiero: 0%

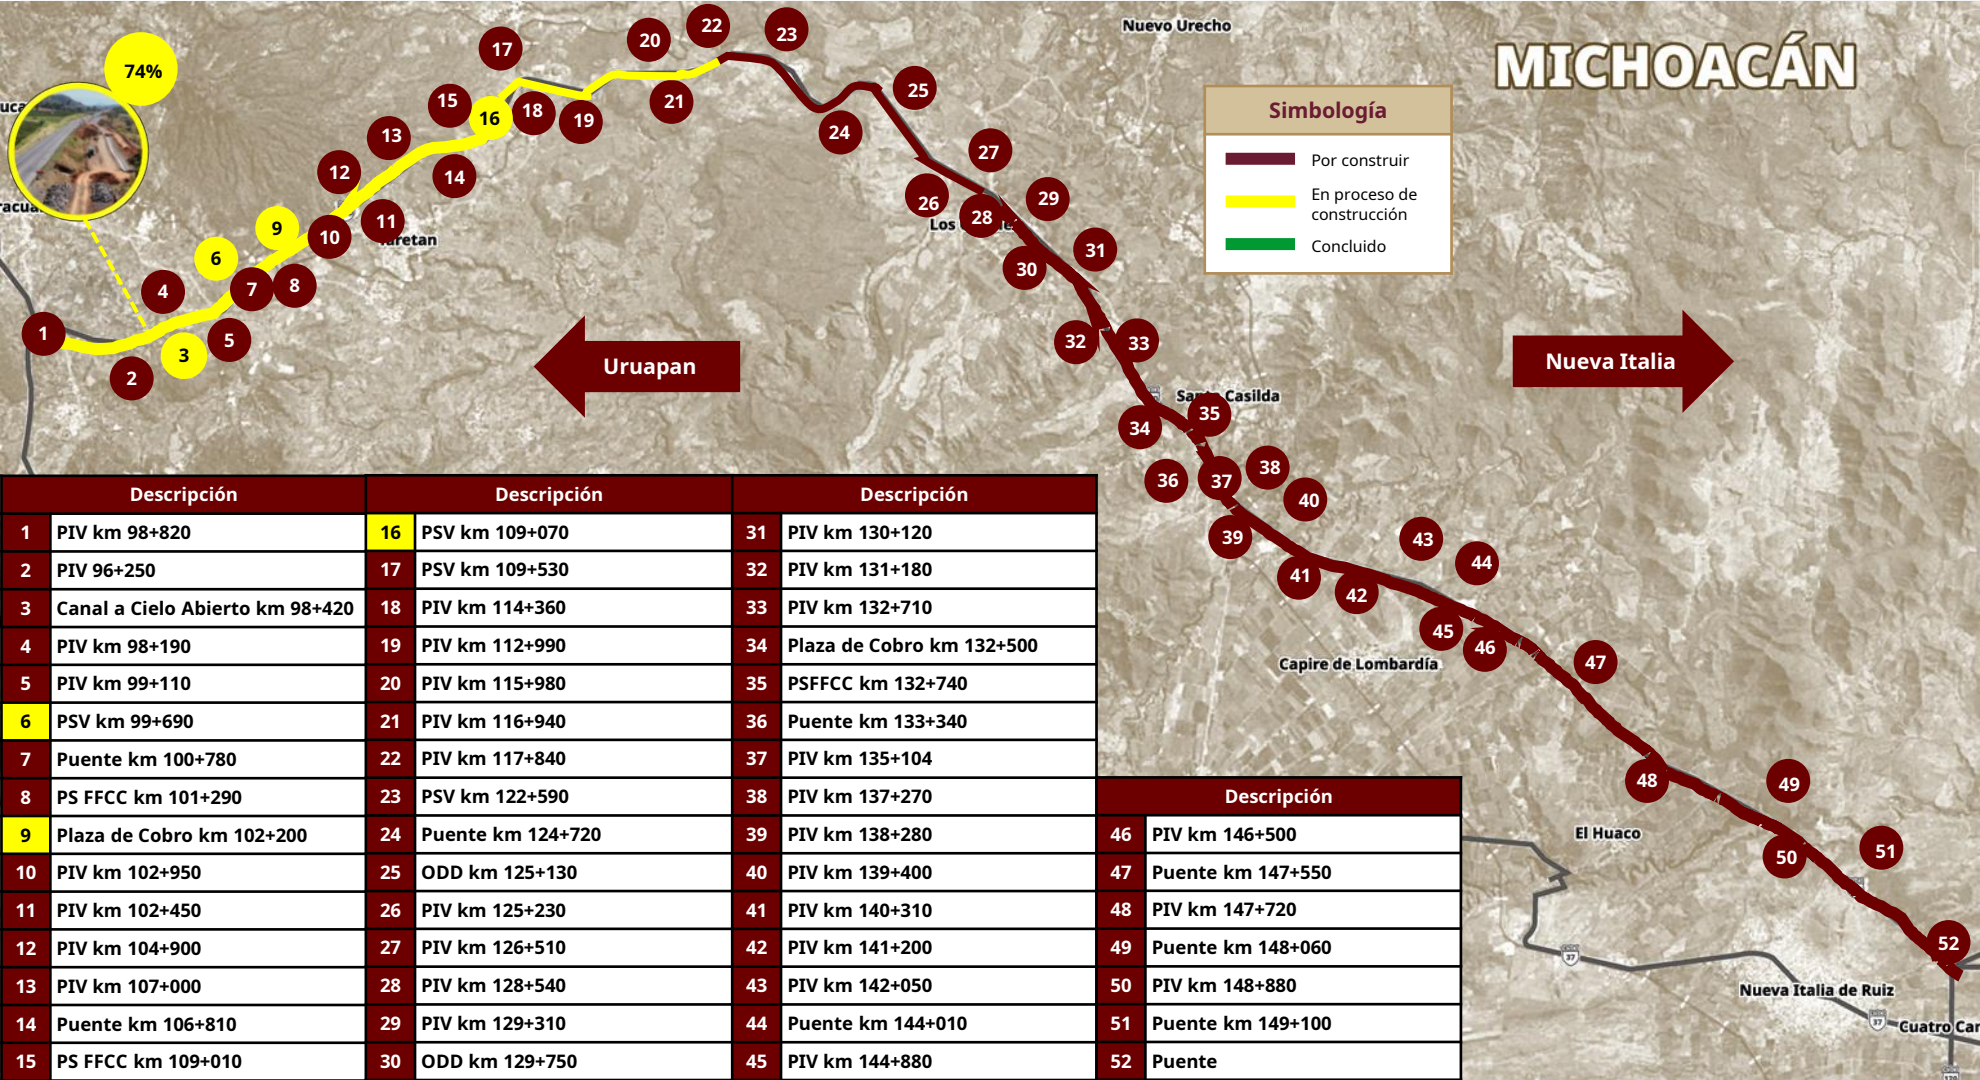

- Inversión: 7,049 mdp
- Inicio: noviembre de 2023  
Término: agosto de 2027
- Meta: 65 km, 2 plazas de Cobro, 10 puentes, 6 entronques, 54 cruces, múltiples obras de drenaje
- 21,147 empleos generados
- 12,480 habitantes beneficiados
- 10 minutos de ahorro en tiempo

# Michoacán

## Uruapán-Nueva Italia




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	18/04/25 al 24/04/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Carpeta	65 km	4.1 km	60.9 km	.500 km	.500 km	En revisión programa de obra
Base	65 km	4.2 km	60.8 km	.500 km	.500 km	
Subbase	65 km	4.7 km	60.3 km	.600 km	.400 km	
Subyacente	65 km	4.8 km	60.2 km	.700 km	.500 km	

Avance Programado-Físico-Financiero (%)

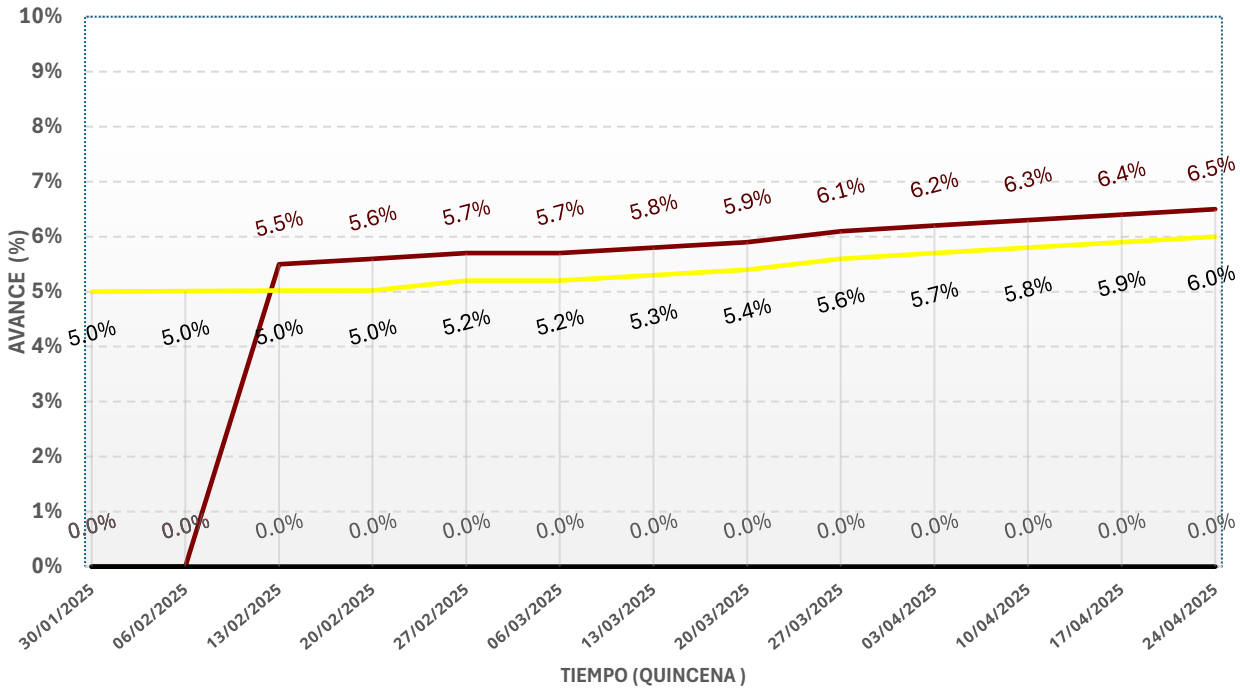

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 11 de abril al 17 de abril	18 de abril al 24 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	1,500	1,500
Maquinaria	550	550



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**
