

# Colima

## Tramo Armería-Manzanillo

### Avance físico

- Programado: 97.06%
- Real: 37.41%
- Semanal: 0.07 %
- Financiero: 35.25%



## Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (87%) No se ejecutan trabajos por falta de personal y maquinaria.
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance.
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (100%)
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (42%) No esta programado avance.
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (25.25%) No esta programado avance.
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (83%) El trabajo programado para esta semana, está concluido.
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) Falta regularizar programa
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (93%)
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (71%)
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900 (52%) Sin trabajos programados
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (67%) El trabajo programado para esta semana, está concluido
18	PSV Panteones km 87+300 (21%) Son se ha comenzado con esta estructura por priorizar entrega de tramos 1 y 2.
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
21	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (54%)
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (16%) No hay trabajos por logística de perforación.
24	Entronque Jalipa km 94+100 (9%) Hay que cambiar el transito al cuerpo izquierdo del paso del puente
25	Puente Jalipa km 94+158 (57%) El trabajo programado para esta semana, está concluido

# Colima


## Tramo Armería-Manzanillo

Actualizada

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	16/01/25 al 22/01/25		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	276,685	0	0	0	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	546,165	267,744	0	3,566	
Base y sub base (m³)	260,119	173,487	86,632	0	1,285	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

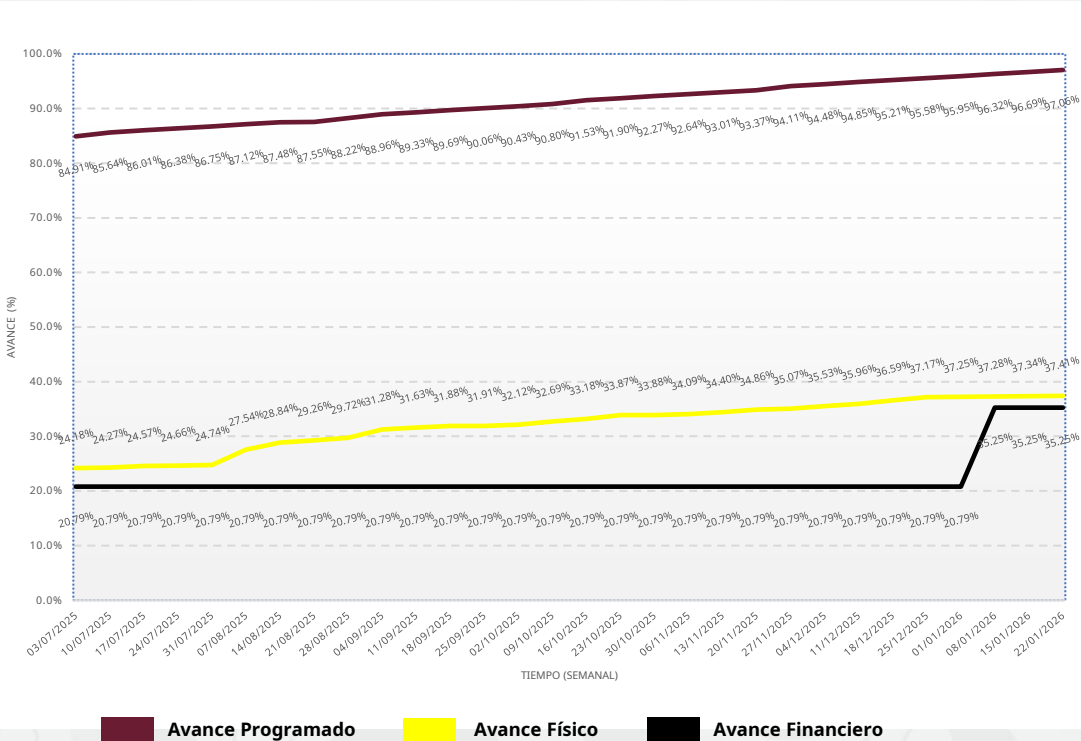

	09 de enero al 15 de enero	16 de enero al 22 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	73	99
Maquinaria	41	41
Frente de trabajo	Tramo 2 km 59+520 a 60+700, PIV Retorno en U 77+600, PSFFC Tepalcates I km 79+900, Tramo 6 km 90+870 al 92+090, PIV Minatitlán II 93+000	Tramo 1 del Km 49+780 al km 49+900 Tramo 2 del Km 59+520 al km 59+560 Tramo 5 del km 84+210 al km 86+200 PSV ADJUNTAS 86+391.12 PSV PANTEONES 87+707.19 PIV MINATITLAN II 93+000 PIV MINATITLAN 93+000

