



Estado de México




Atizapán - Atlacomulco



2025
Año de
La Mujer Indígena

- **Inversión: 9,865.8** mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)
- **Meta:** 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG


- **Inicio:** 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027
- **Avance físico:**
 - Programado: 86.42%
 - Real: 45.75%
 - Financiero: 24.11%
 - Semanal: 00.20%

- **132,909** empleos generados (44,303 directos y 88,606 indirectos)
- **1 millón 244 mil** habitantes beneficiados
- **60 minutos** de ahorro en tiempo

Estado de México

Atizapán - Atlacomulco

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

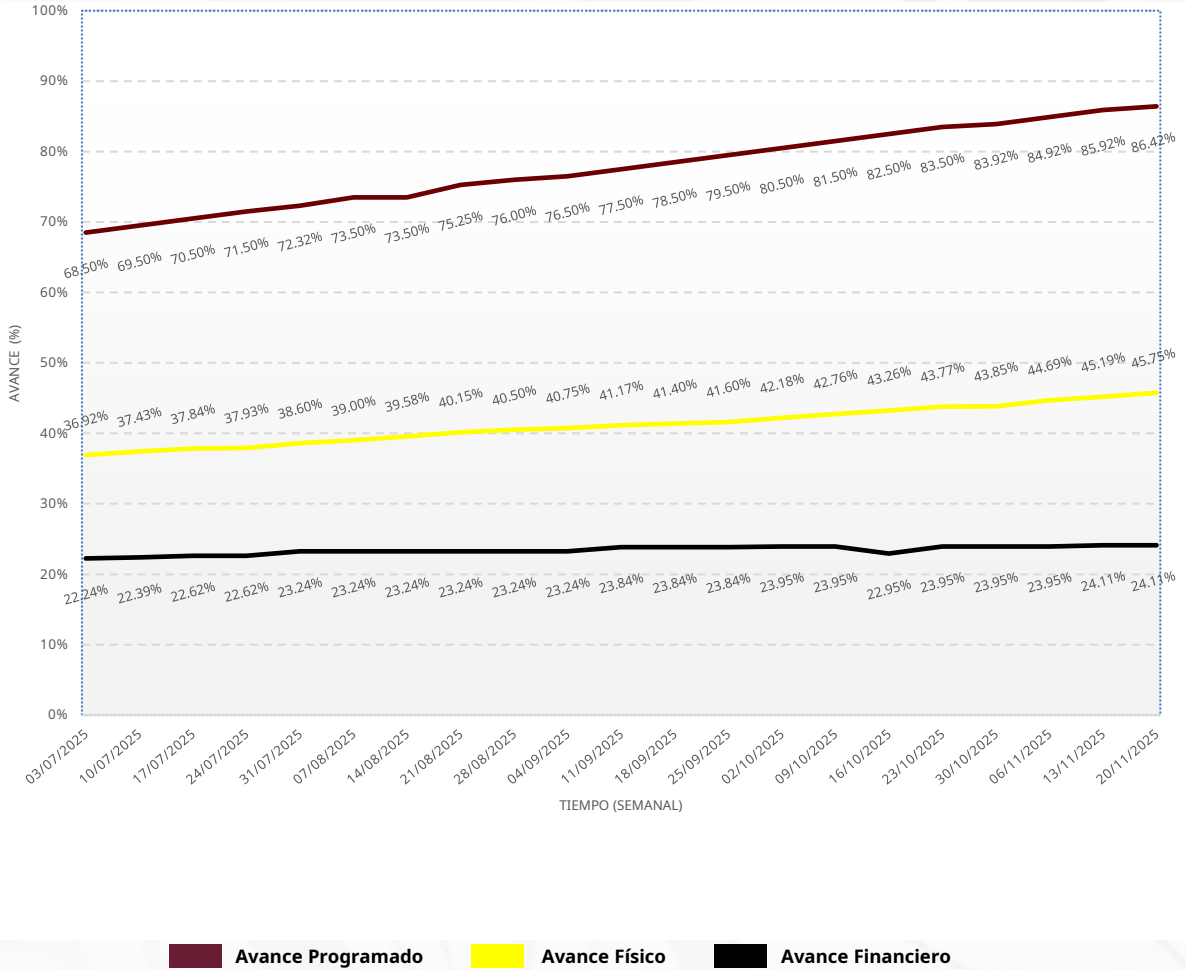

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	14/11/25 al 20/11/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	188	156	2	1.05	• La mano de obra se incrementó para alcanzar las expectativas correspondientes.
Zapatas	86	42	44	1	0.85	
Columnas	96	20	76	1	0.95	
Cabezales	76	9	67	1	0.58	
Caballetes	24	6	18	1	0.25	
Trabes de concreto	395	0	395	0	0	
Trabes metálicas	29	0	29	1.0	1.00	



2025
Año de
La Mujer
Indígena

	Del 07 de noviembre al 13 noviembre	14 de noviembre al 20 noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	1,894	1,902
Maquinaria	493	501
