


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío





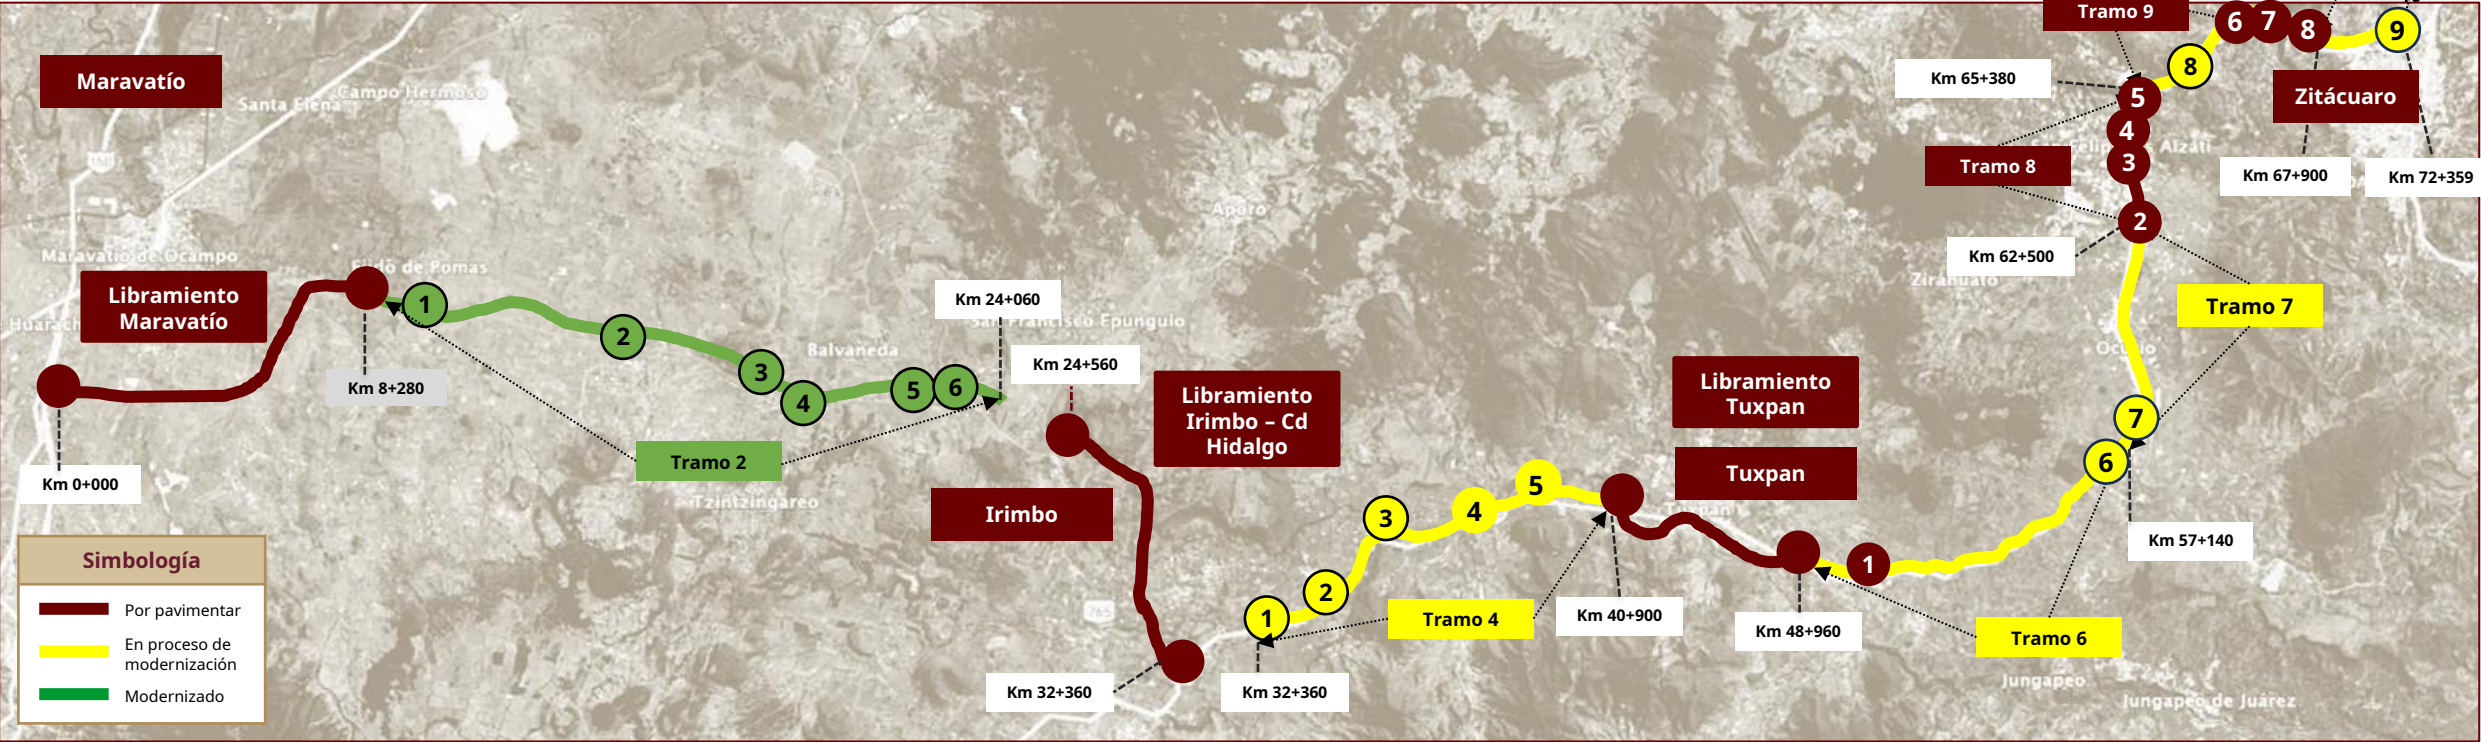



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Descripción	
1	Entronque Santa Rosa km 32+420
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420
3	Puente Turundeo Km 36+460
4	Entronque Turundeo I km 37+550
5	Entronque Turundeo II km 38+780
6	Entronque Jungapeo km 56+700
7	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700
8	Entronque Valle Verde km 67+220
9	PSV Zitácuaro Km 72+160

Descripción	
1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Macutzio km 65+620
6	Entronque Curungueo I Km 68+200
7	Entronque Curungueo II Km 68+400
8	Puente San Juan Viejo Km 69+860

Avance físico:

- Programado: 44.35%
- Real: 39.33%
- Semanal: 0.93%
- Financiero: 0.00%

-  **Inversión:** 4,575.3 mdp
-  **Meta:** 71.3 Km
-  **Inicio:** 27 de enero de 2024
Término: 30 de enero de 2027
-  4,800 empleos generados
-  126,000 habitantes beneficiados
-  Ahorro en tiempo: 25 min

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 09 may al 15 may 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	602,027.23	103,530.77	1,147.27	3,458.21	INICIAN TRABAJOS DE CORTE EN TRAMO 10
Terraplén (m3)	445,687.00	263,526.49	182,160.51	1,434.56	1,469.54	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Subyacente (m3)	256,097.00	203,606.96	52,490.04	693.78	1,020.99	
Subrasante (m3)	170,688.00	131,075.44	39,612.57	0.00	1,075.27	

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 09 may al 15 may 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	70,526.46	55,132.58	728.18	3,052.82	CONTINUAN TENDIDOS EN TRAMOS 4 Y 6
Bacheo (m3)	1,800.00	640.50	1,159.50	40.00	111.00	SE REALIZAN BACHEOS EN TRAMO 7 Y 9
Fresado (m3)	10,676.00	9,038.99	1,637.01	22.67	69.77	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 9 Y 10
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	13.35	16.89	0.15	0.64	
Geomalla (m2)	84,520.00	26,555.60	57,964.40	3,448.89	1,808.00	
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	76,293.10	44,120.95	2,959.83	2,860.36	DISMINUYE EL RITMO DE TRABAJO POR INTERFERENCIAS DEL TRÁNSITO LOCAL
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	12,676.15	32,571.65	398.68	0.00	AÚN NO INICIA LA PRODUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PLANTA JUNGAPEO


ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 09 may al 15 may 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	0.89	0.11	0.01	0.00	COLADO DE COLUMNAS Y CABEZALES
PIV JUNGAPEO	1.00	0.72	0.28	0.00	0.04	COLADO DE ESTRIBOS Y CORTE EN GAZAS.
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.40	0.60	0.00	0.07	COLADO DE MUROS DE ESTRIBOS EN APOYOS 1 Y 4
MURO DE CONTENCIÓN MT4	200.00 ml	190.88 ml	9.12 ml	0.00 ml	1.94 ml	CIMBRADO Y COLADO DE MURO



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

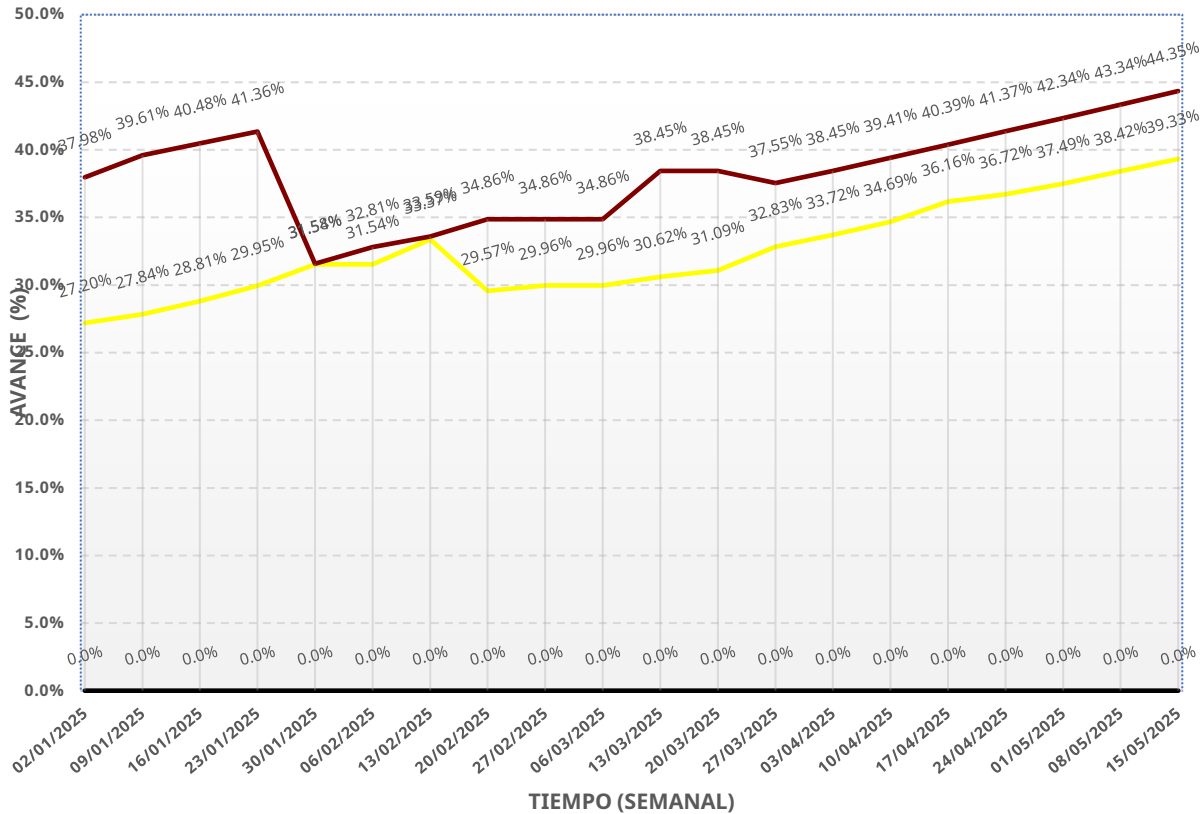

	* No presenta avance financiero	
	02 de mayo al 08 de mayo	09 de mayo al 15 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	288	281
Maquinaria	173	173
