


# Michoacán

## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

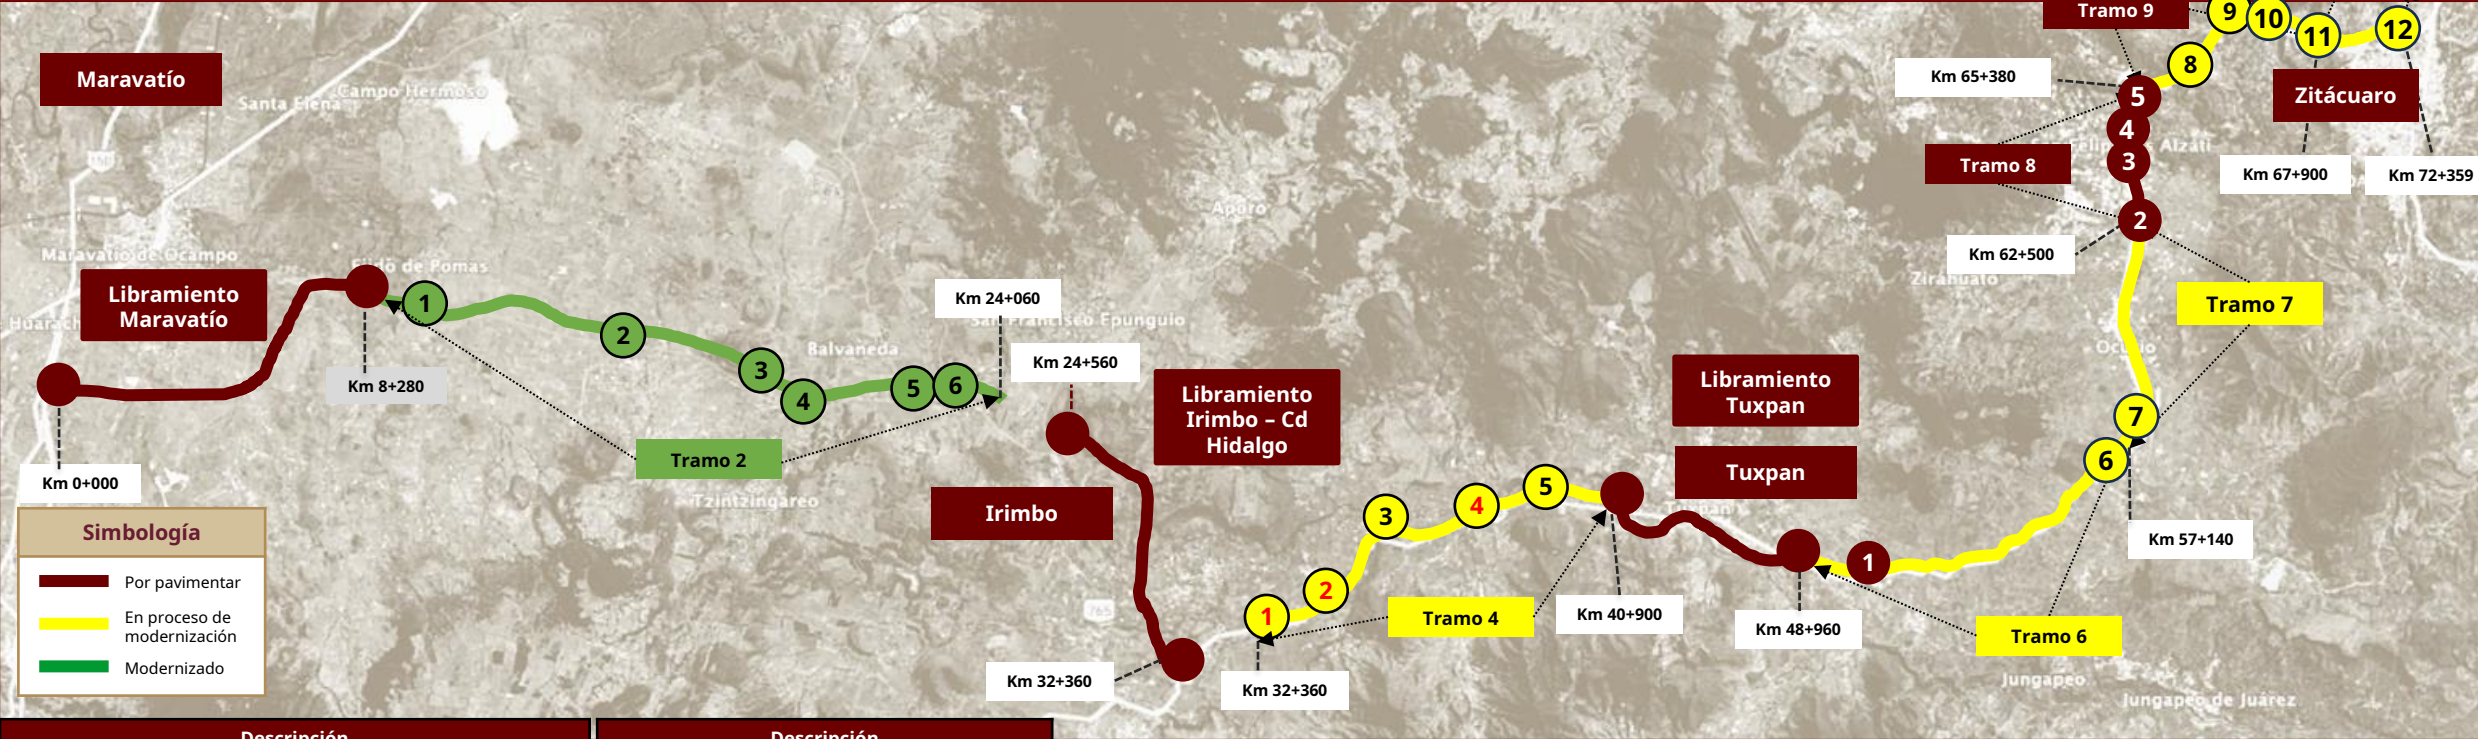

Descripción	
1	Entronque Santa Rosa km 32+420 (78.00%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420 (76.32%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
3	Puente Turundeo Km 36+460 (88.76%)
4	Entronque Turundeo I km 37+550 (76.37%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
5	Entronque Turundeo II km 38+780 (86.85%)
6	Entronque Jungapeo km 56+700 (62.85%)
7	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (57.78%)
8	Entronque Valle Verde km 67+220 (55.42%)
9	Entronque Curungueo I Km 68+240 (46.80%)
10	Entronque Curungueo II Km 68+780 (46.80%)
11	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (32.05%)
12	PSV Zitácuaro Km 72+160 (53.66%)

Descripción	
1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Macutzio km 65+620

**Nota:**  
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

### Avance físico

- Programado: 53.34%
- Real: 46.72 %
- Semanal: 0.55 %
- Financiero: 0.00%



**Inversión:** 4,575.3 mdp  
**Inversión 2020-2025:** 3,321 mdp



**Meta:** 71.3 Km  
**Meta 2020-2025:** 41 km



**Inicio:** septiembre 2020  
**Reinicio:** 27 de enero de 2024  
**Término:** 30 de enero de 2027



4,800 empleos generados



126,000 habitantes beneficiados



Ahorro en tiempo: 25 min

**Concesionaria:** Red de carreteras de occidente

# Michoacán

## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 08 ago al 14 ago 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	660,068.66	45,489.34	4,190.52	6,245.98	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9
Terraplén (m3)	445,687.00	313,383.20	132,303.80	8,280.92	2,655.03	EL AVANCE DEPENDE DE LOS FRENTE DE TRABAJOS DISPONIBLES. SE REACTIVAN TRABAJOS EN TRAMO 7.
Subyacente (m3)	256,097.00	220,470.51	35,626.49	1,045.73	2,237.11	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9
Subrasante (m3)	170,688.00	145,662.55	25,025.45	1,922.88	1,350.25	EL AVANCE DEPENDE DE LOS FRENTE DE TRABAJOS DISPONIBLES. SE REACTIVAN TRABAJOS EN TRAMO 7.

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 08 ago al 14 ago 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	89,842.66	35,816.38	402.46	1,933.01	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Bacheo (m3)	1,800.00	1,107.00	693.00	0.00	42.00	SE REALIZAN TRABAJOS DE BACHEO EN TODOS LOS TRAMOS.
Fresado (m3)	10,676.00	9,559.11	1,116.89	0.00	12.31	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9.
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	20.89	9.35	0.00	0.71	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9.
Geomalla (m2)	84,520.00	53,984.80	30,535.20	0.00	2,182.00	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9.
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	93,936.81	26,477.24	0.00	1,071.09	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9.
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	12,632.00	32,615.80	558.69	0.00	AÚN NO INICIA LA PRODUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PLANTA JUNGPEO. EL AVANCE SE COMPENSARÁ CON EL ALTO RENDIMIENTO EN LA COLOCACION DE LA CAPA.

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 08 ago al 14 ago 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	1.10	0.00	0.00	0.00	COLADO DE GUARNICIÓN Y PARAPETO, RELLENO DE CEPAS DE APOYOS.
PIV JUNGAPEO	1.00	0.91	0.09	0.00	0.01	CONTINUA EL CORTE DE TN EN GAZAS, COLADO DE GUARNICIÓN EN PIV
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.19	0.81	0.00	0.08	SE REINICIAN TRABAJOS DE CONFORMACION DE PLATAFORMAS DE APOYOS 1 Y 2.
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.71	0.29	0.00	0.01	COLADO Y ARMADO DE LOSA DE COMPRESIÓN.

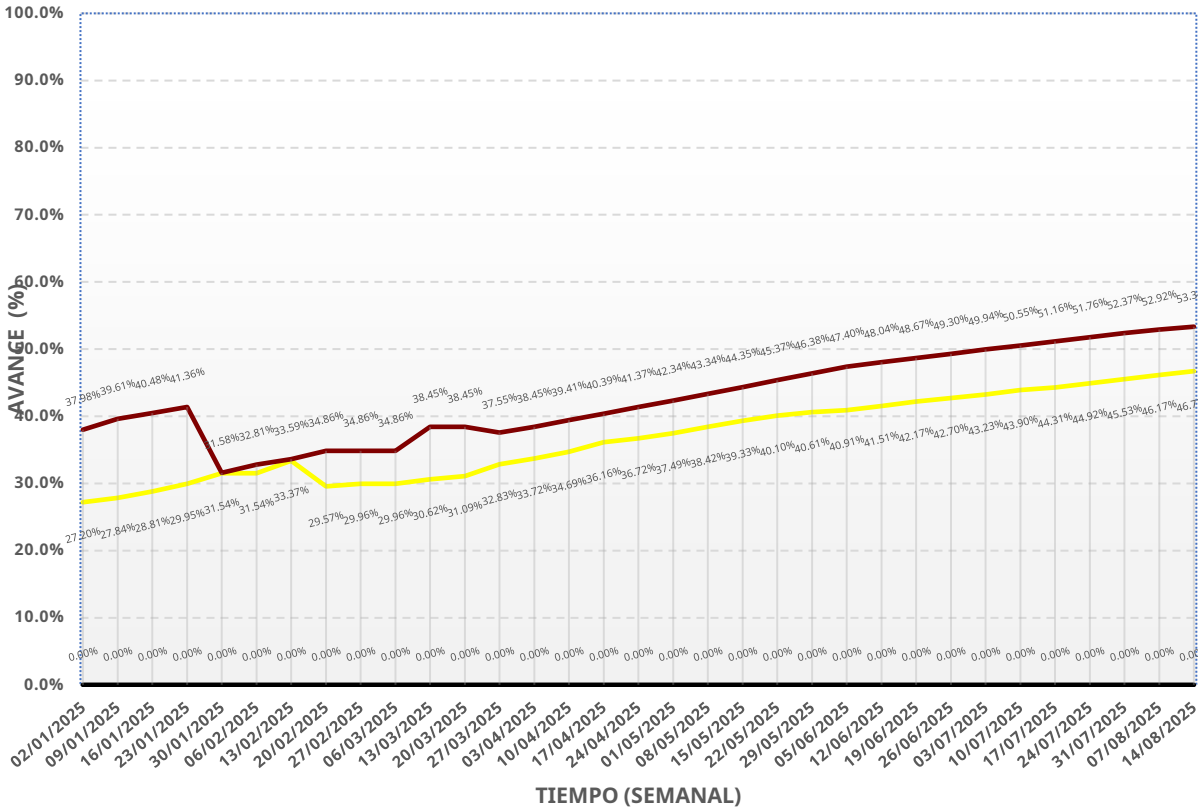

Avance Programado

Avance Físico

\*Avance Financiero

\* No presenta avance financiero

	01 AL 07 DE AGOSTO	08 AL 14 DE AGOSTO
Fuerza de Trabajo (personas)	279	277
Maquinaria	178	185
