

Michoacán


Uruapan-Nueva Italia



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico: • Programado: 9.85 % • Semanal: 0.10 %
• Real: 9.46 % • Financiero: 0%

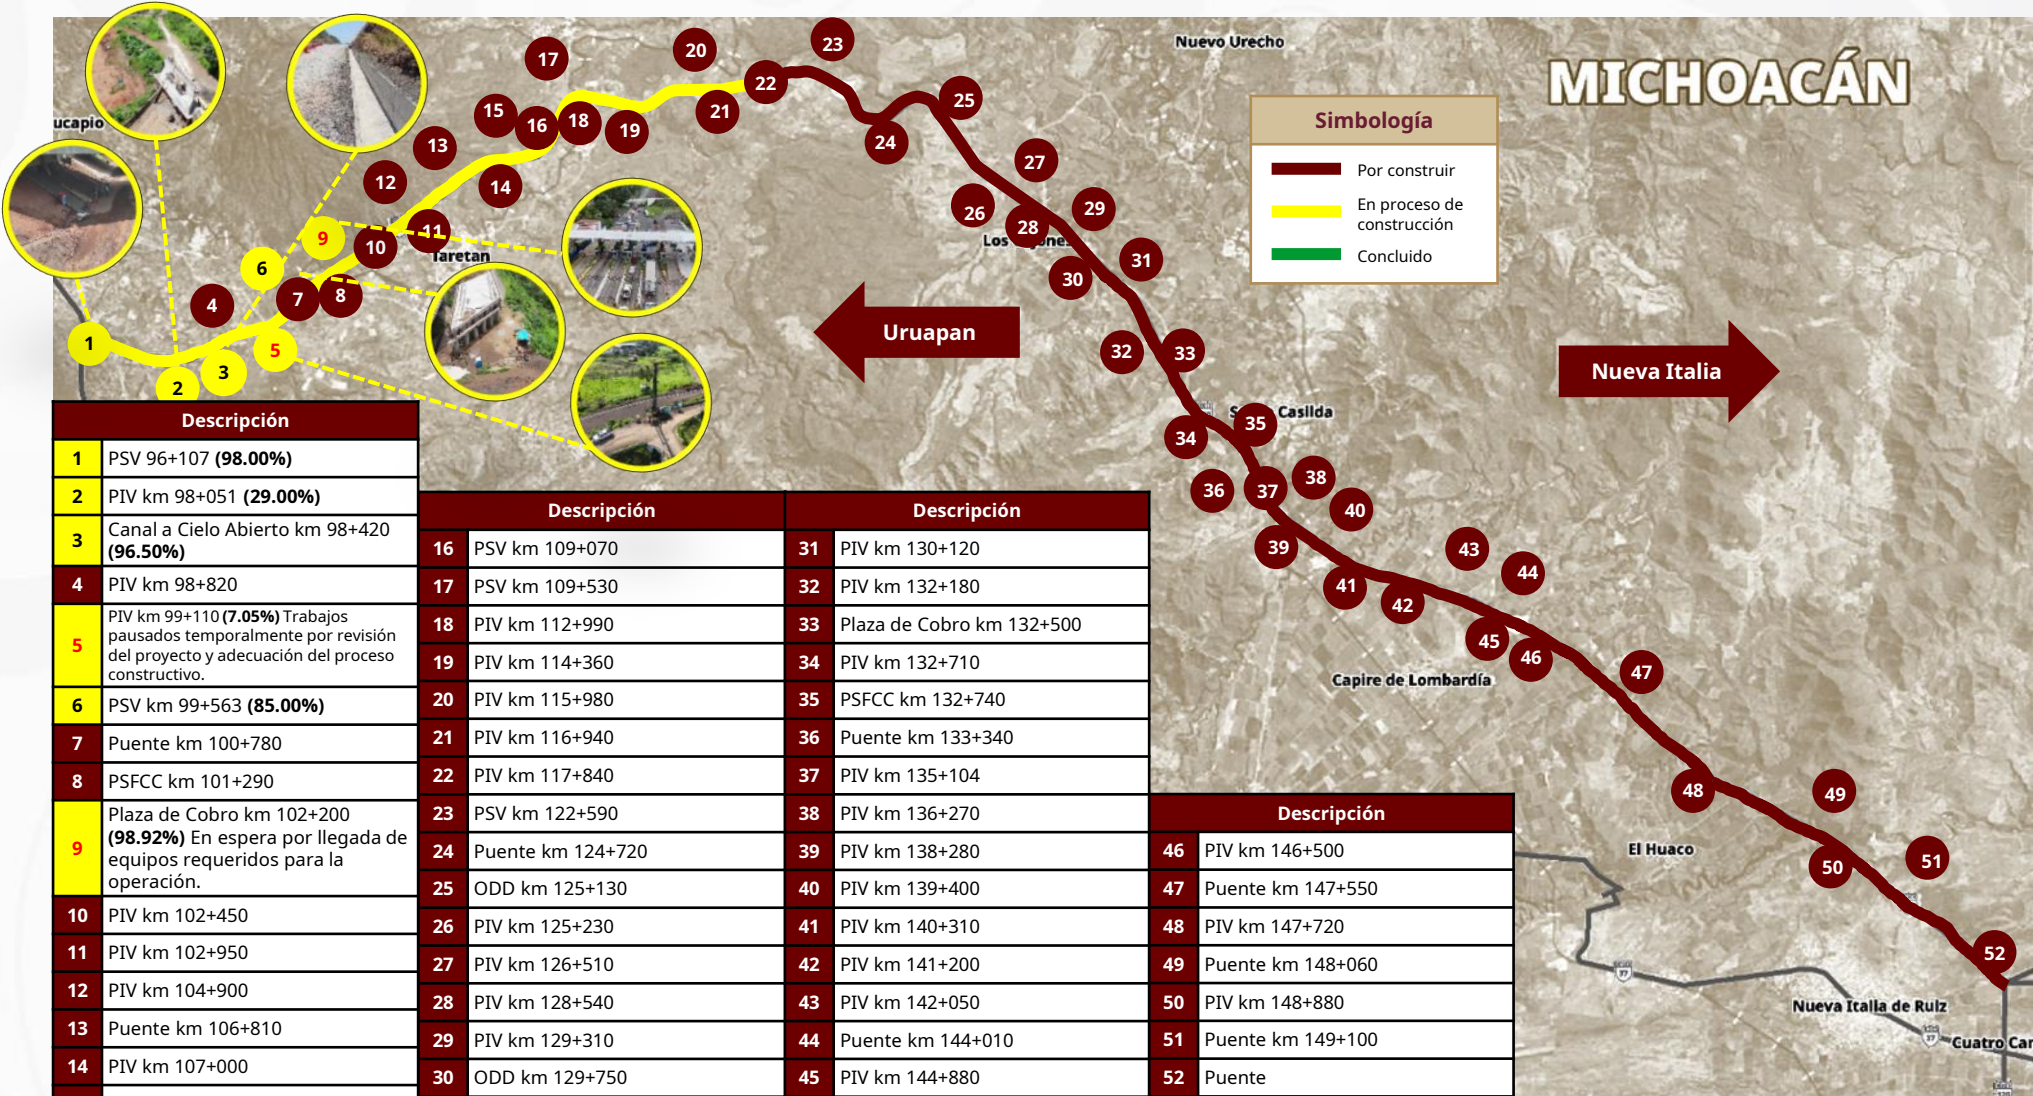


- Inversión: 7,049 mdp**
- Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km**
65 km (tronal)
2.09 km (estructuras)
2 plazas de cobro, 10 puente,
6 entronques, 54 cruces y
múltiples obras de drenaje.
- 21,147** empleos generados
7,049 Directos
14,098 Indirectos
- 1,800,000** habitantes
beneficiados
- 25 minutos** de ahorro
en tiempo
- Concesionaria :** PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	19/09/2025 al 25/09/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Subbase	65 km	7.20 km	57.80 km	.200 km	.200 km	
Subyacente	65 km	8.84 km	56.16 km	.200 km	.200 km	
PSV 98+051 Demoliciones	1	0	1	1	1	Demolición de apoyo C1
PSV 99+563 Parapeto metálico	2	1	1	1	1	Aplicación de pintura en parapeto metálico.

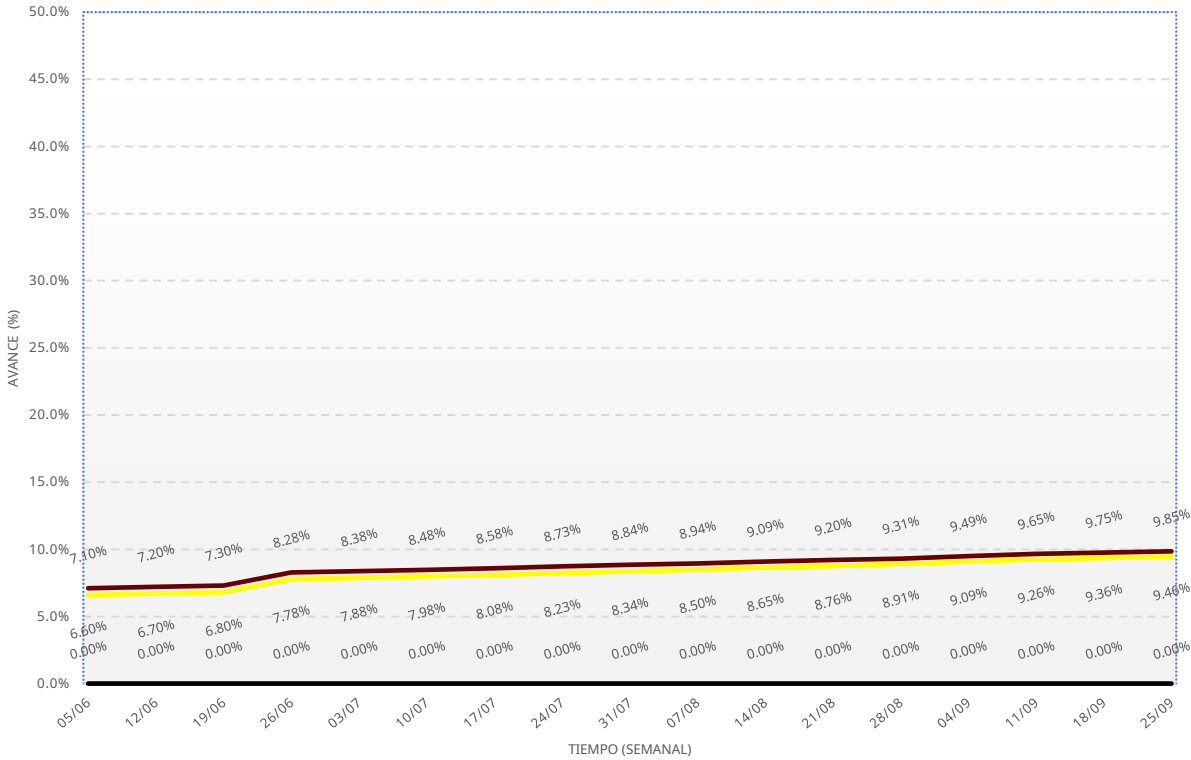

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 12 de septiembre al 18 de septiembre	Del 19 de septiembre al 25 de septiembre.
Fuerza de Trabajo (personas)	570	570
Maquinaria	230	240



2025
Año de
La Mujer
Indígena
