


# Chiapas

## Entronque San Cristóbal

### Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

- Avance físico:**
  - Programado: 0.00%
  - Semanal: 0.00%
  - Real: 25.17%
- Avances:**
  - En septiembre se prevé el reinicio de las obras para la conclusión del entronque.
  - El proyecto ejecutivo se encuentra autorizado y el derecho de vía necesario modificado.

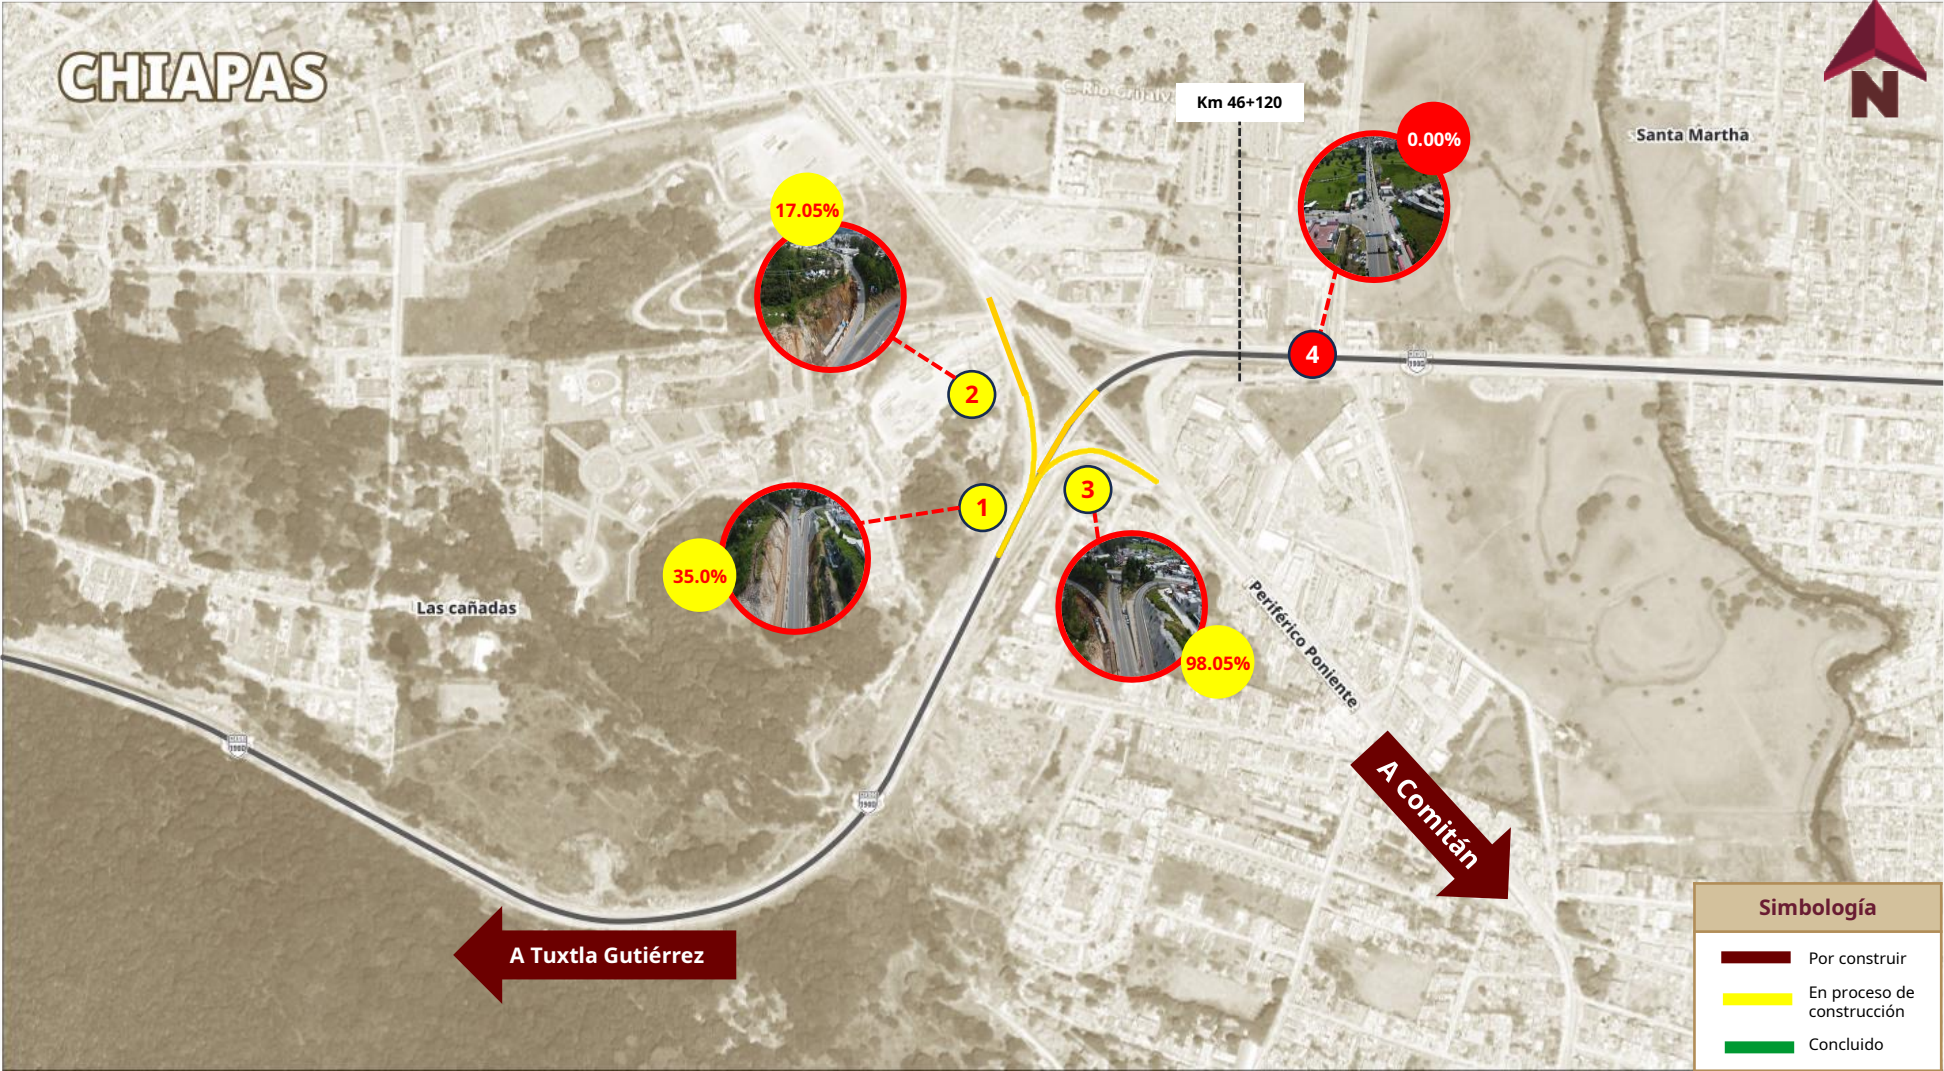

- **Inversión:** 44.96 mdp
- **Meta:** 1 Entronque
- **Avance físico:**
  - Real: 25.17%
  - Financiero: 22.96%
- **Inicio:**

**Término:** Por definir
- **135** empleos generados
- **200,000 mil** habitantes beneficiados

  - Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
  - Disminución de accidentes.
  - Se evitan vueltas prohibidas.

| Descripción |   | Observaciones   |
|-------------|---|---|
| 1           | Eje 50: 35.00%                          | Con fecha 30-Sep-2025, La SICT envió por correo electrónico el oficio No. No. 3.4.-2742, mediante el cual informa a la Concesionaria que se modifica la fecha de reinicio de los trabajos de construcción del Entronque, y queda condicionando hasta la autorización de las nuevas modificaciones que presente. |
| 2           | Eje 2: 17.05%                           |   |
| 3           | Eje 20: 98.05%                          |   |
| 4           | Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00% |   |
