

San Luis Potosí

La Pitahaya – Libramiento Oriente de S.L.P. y El Ramal Villa de Reyes

Avance físico

- Programado: **1.76%**
- Real: **1.66%**

***Avance financiero:**
*Actualmente se encuentra en conciliación la concesionaria e ingeniero independiente

Inversión: 8,331.12 mdp.
Incluye I.V.A.

Inicio: 14 de agosto 2025
Término: 14 de febrero 2028


Meta: 68.5 km. + 2.4 Km del Ramal
79 Estructuras; Puentes, PSV'S, PSFCC, PIV'S.
1 Plaza de Cobro, 5 Entronques, 165 ODT'S.

Concesionaria: META

8,331 Empleos directos generados
16,662 Empleos indirectos generados

128 000 habitantes beneficiados

20 minutos de ahorro en tiempo

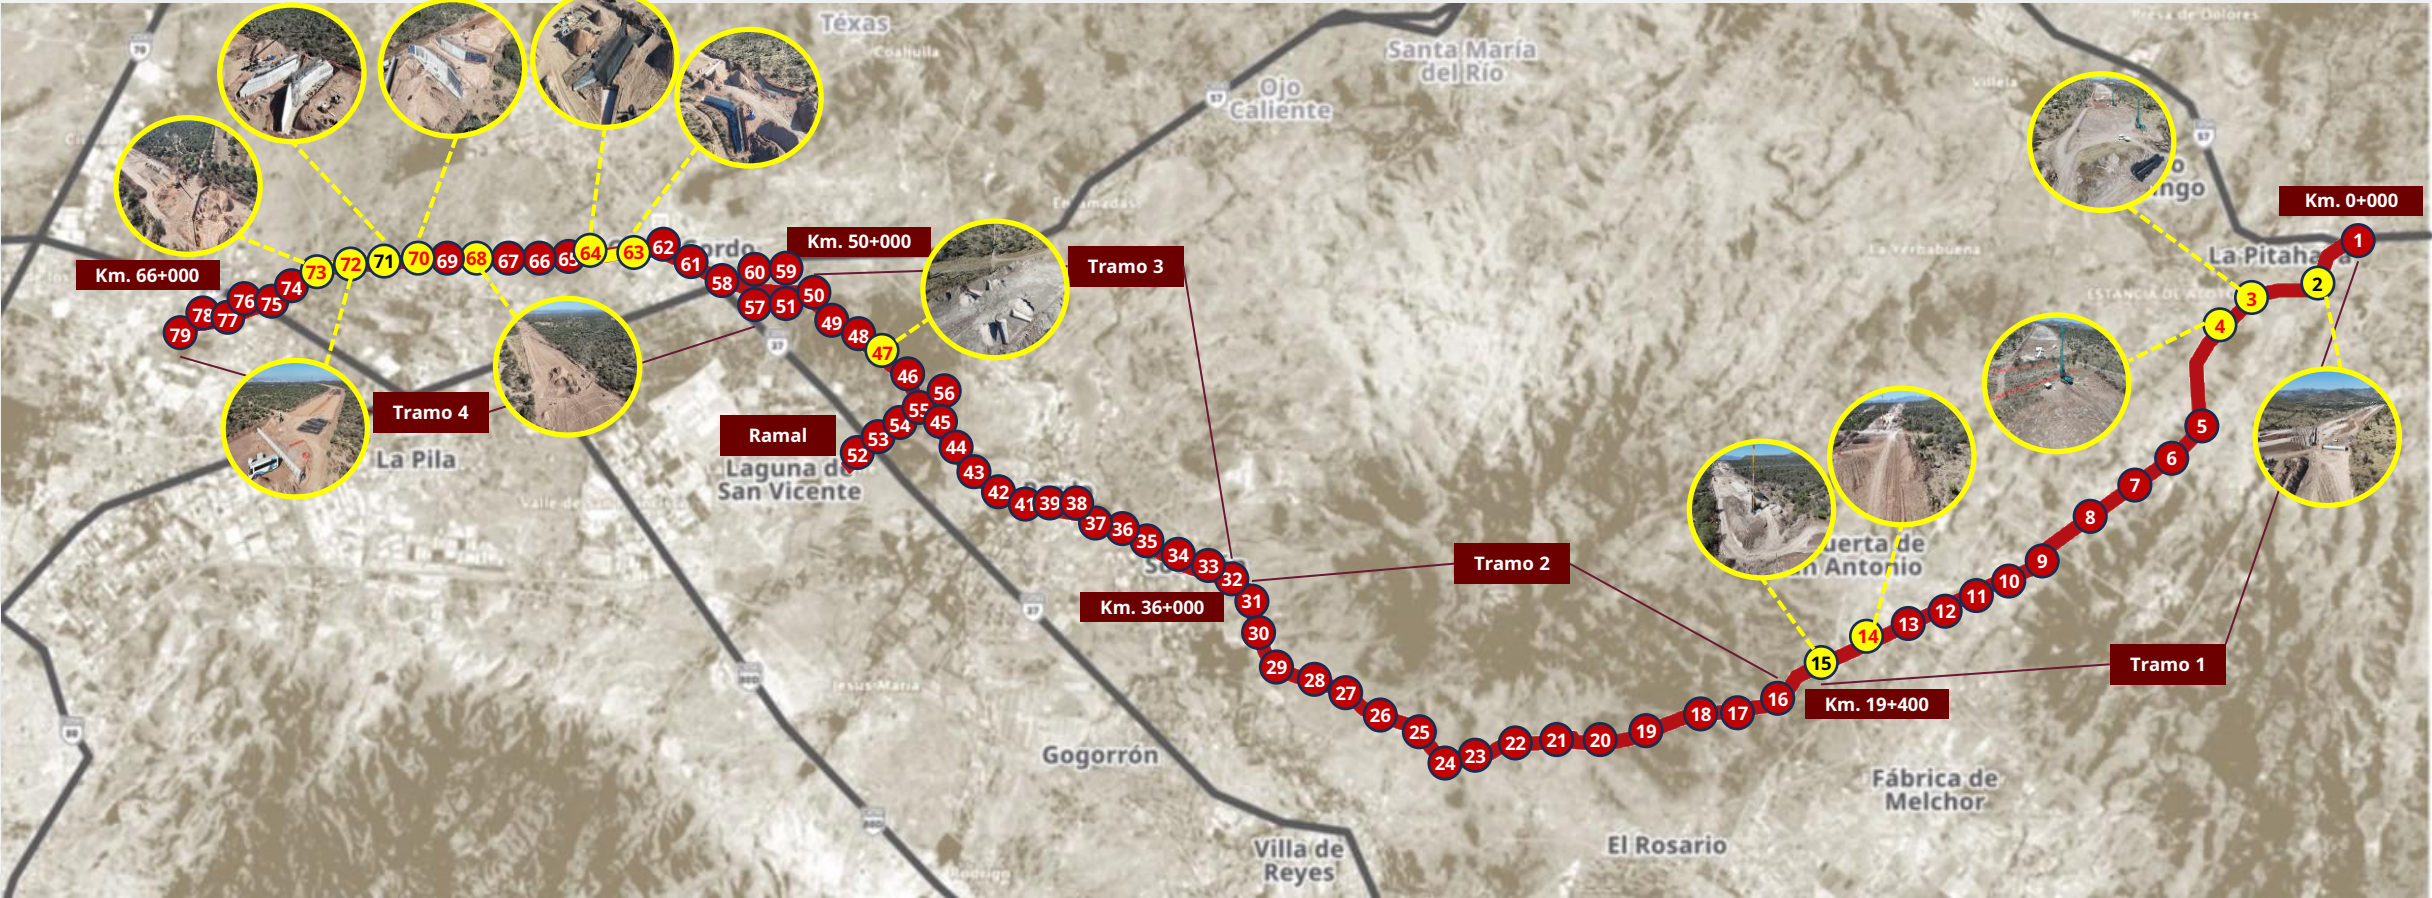

San Luis Potosí

La Pitahaya - Libramiento Oriente de S.L.P. y El Ramal Villa de Reyes



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Mapa troncal

Avance físico:

- Programado: **1.76%**
- Semanal: **0.24%**
- Real: **1.66%**

***Avance financiero:**

*Actualmente se encuentra en conciliación la concesionaria e ingeniero independiente



Inversión: 8,331.12 mdp.
Incluye I.V.A.



Inicio: 14 de agosto 2025
Término: 14 de febrero 2028



Meta: 66 km. + 2.4 Km. del Ramal, 79 Estructuras; Puentes, PSV'S, PSFCC, PIV'S.
1 Plaza de Cobro, 5 Entronques, 165 ODT'S.

Concesionaria: META




8,331 Empleos directos generados
16,662 Empleos indirectos generados



128 000 habitantes beneficiados



20 minutos de ahorro en tiempo

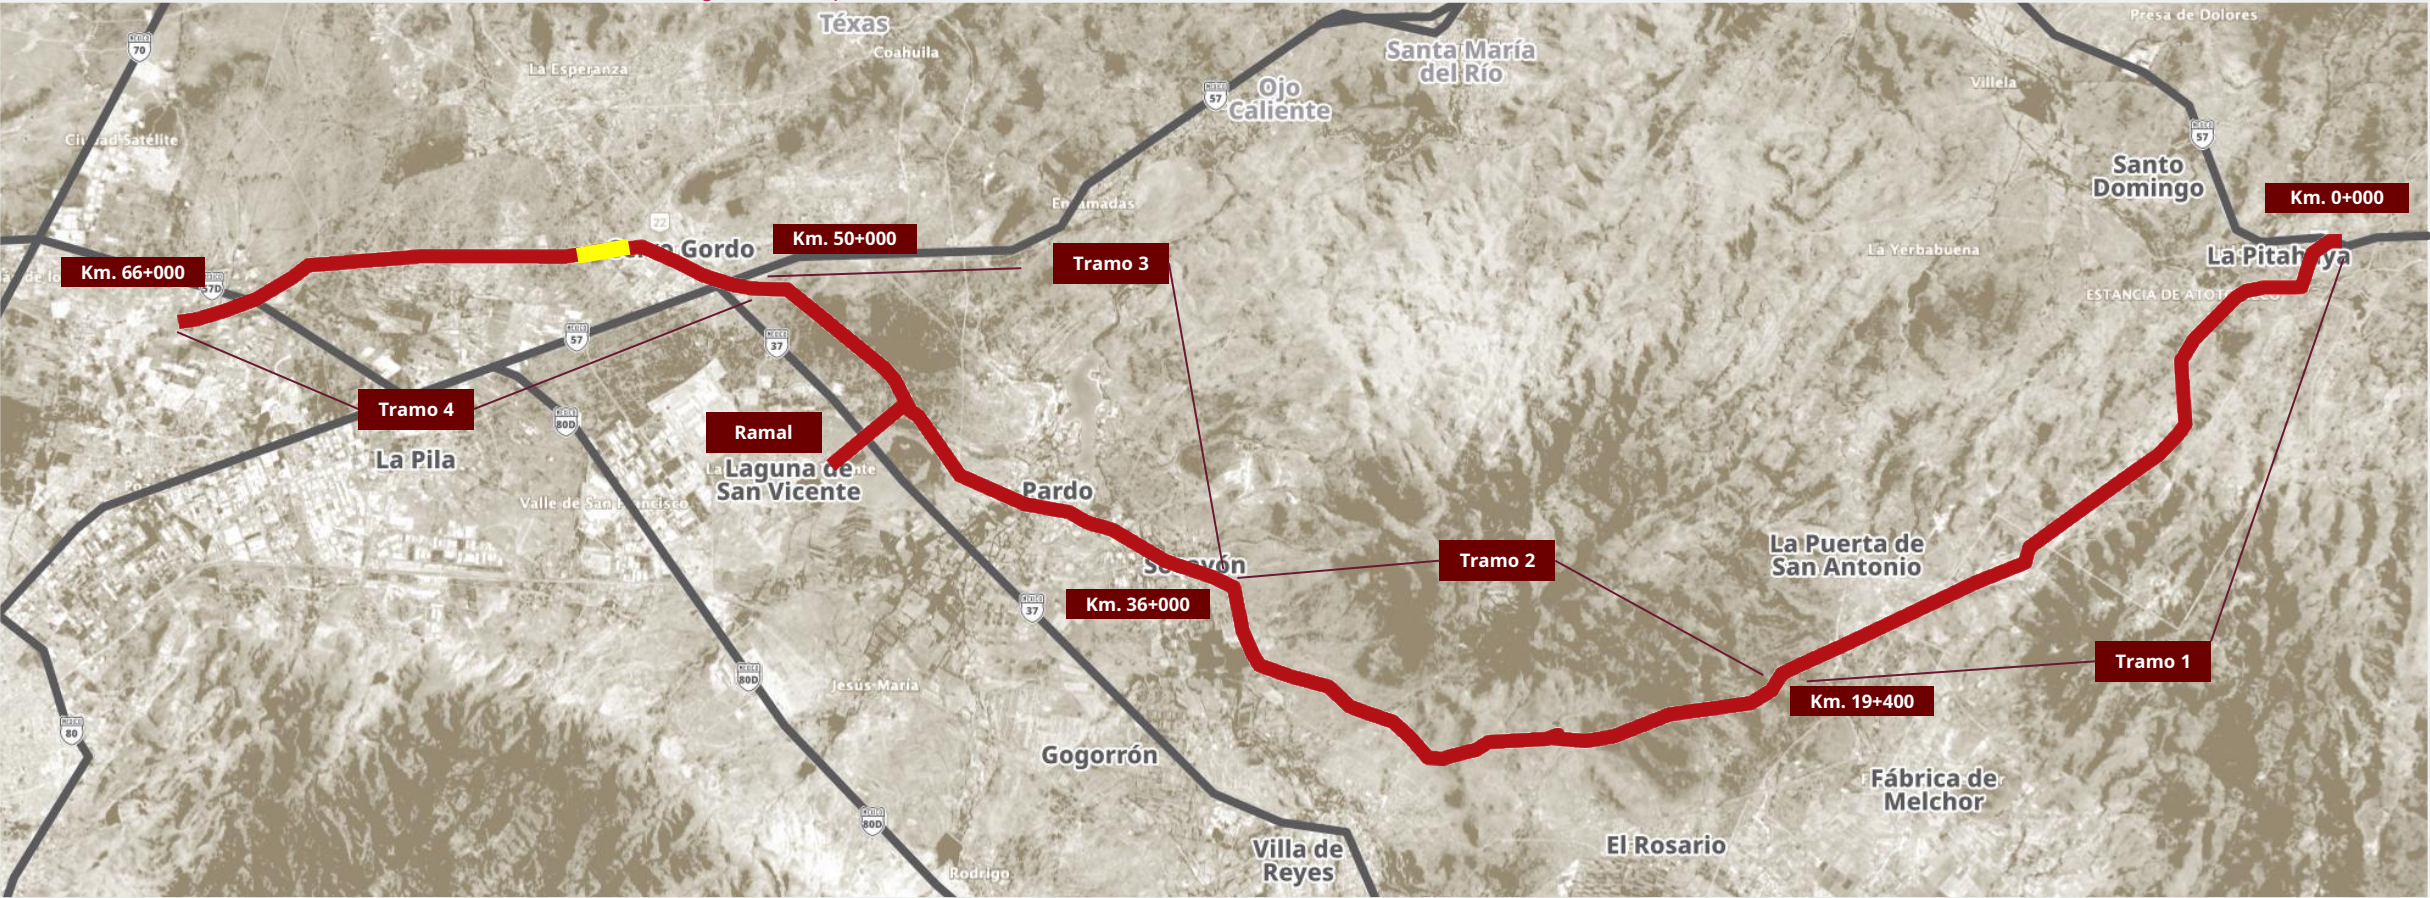

Estructuras Proyectadas por Tramo

Tramo 1

Descripción		
1	Ent. La Pitahaya Km. 0+500	
2	PSV Km. 2+096.73 2.33%	
3	Puente Km. 2+481 0.11%	
4	Ducto Km. 2+680 0.07%	
5	PIV Km. 9+289.75	
6	Ducto Km. 10+853	

Descripción		
7	PSFFCC Km. 12+780	
8	PIV Km. 12+930	
9	PSV Km. 14+043	
10	PIV Km. 14+810	
11	PSFFCC Km. 16+250	
12	PIV Km. 17+530	

Descripción		
13	Ducto Km. 18+426	
14	Puente Km. 18+610 0.35%	
15	Dob Caj Km. 18+820 6.00%	

Tramo 2

Descripción		
16	PSG Km.121+870	
17	PSV Km. 123+453	
18	Puente Km. 123+608	
19	PSV Km. 126+360	
20	PSV Km. 128+210	
21	Puente Km. 128+420	

Descripción		
22	Ducto Km. 129+005	
23	PSV Km. 130+725	
24	PSG Km. 131+530	
25	PSV Km. 132+820	
26	Ducto Km. 134+020	
27	PSV Km. 134+604	

Descripción		
28	Puente Km. 134+662	
29	PSG Km. 135+995	
30	PIV Km. 137+310	
31	Puente Carranco Km. 137+820	

Tramo 3

Descripción		
32	PIV Km. 36+719.53	
33	PIV Km. 37+739.99	
34	PSV Km. 38+242.30	
35	Puente Altamira Km. 39+520	
36	PSG Km. 39+750	
37	PIV Km. 40+349.53	
38	PIV Km. 41+119.44	
39	Ducto Km. 41+532.47	
40	PSG Km. 41+981.48	

Descripción		
41	PSV Km. 42+386	
42	PSG Km. 42+650	
43	Puente La Laja Km. 42+990	
44	PSV Km. 43+456.78	
45	PSG Km. 43+577.34	
46	PIV Km. 44+243.13	
47	PSG Km. 45+380 1.00%	
48	Ducto Km. 45+517	
49	PSG Km. 46+930	

Descripción		
50	PIV Km. 49+120	
51	PIV Km. 49+900	
52	PSV Km. 16+540	
53	PSV Km. 17+040	
54	PSV Km. 17+610	
55	PSV Km. 18+365	
56	PSV Km. 18+700	

Tramo 4

Descripción		
57	Ducto Km. 51+500	
58	Ducto Km. 10+333	
59	PSV Km. 10+500	
60	Ducto 20+580	
61	Ec Carr. 57 Km. 51+800	
62	PSV Km. 52+190	
63	PIV Km. 53+150.26 28.07%	
64	PSG Km. 54+424.37 35.00%	
65	PSV Km. 54+952.42	

Descripción		
66	PSV Km. 55+407	
67	PIV Km. 56+354.38	
68	PSV Km. 58+505 1.01%	
69	PSV Km. 59+030	
70	PSV Km. 60+579.85 36.00%	
71	PSV Km. 61+561.78 67.00%	
72	PSV Km. 62+398.36 8.01%	
73	PSV Km. 63+517.92 19.32%	
74	PSV Km. 64+800	

Descripción		
75	Ducto Km. 65+791.31	
76	Ec Lib Ote Km. 66+000	
77	PSV Km. 66+441.21	
78	PSV Km. 66+449.24	
79	PSV Km. 1+412	

Simbología

- Por construir
- En proceso de construcción
- Concluido

San Luis Potosí

La Pitahaya - Libramiento Oriente de S.L.P. y El Ramal Villa de Reyes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	02/01/26 al 08/01/26	Observaciones
Tramo I km. 0+000 al Km. 19+400		Tramo III Km. 36+000 al Km. 50+000		Tramo IV km. 50+000 al Km. 66+000	
Volúmenes de obra					
Terracerías					
Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales; incluye acarreo,	388.22	157.81	230.41	4.25	
Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto	733,873.06	261,966.92	471,906.14	11,341.87	
Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su clasificación, cuando el material se	2,860,090.52	78,996.00	2,781,094.52	6,979.85	
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en el cuerpo del terraplén	3,858,592.51	33,361.77	3,825,230.74	10,238.48	
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en el cuerpo del	3,710,618.07	56,114.13	3,654,503.94	9,029.66	Avance (%)
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto	330,950.70	1,013.80	329,936.90	518.50	
Obras de Drenaje					
Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación, con una	53,714.94	2,388.80	51,326.14	80.51	
Plantilla de material Granular, P.U.O.T	5,780.69	116.40	5,664.29	15.12	
Arrope y Relleno con material de calidad de subrasante, compactado al 95% de la AASHTO STD con	74,713.07	68.72	74,644.35	1.15	
Alcantarilla de concreto reforzado de f'c = 280 kg/cm2, en dirección normal de 152 cm de diámetro (se	7,394.04	300.71	7,093.33	22.50	
Concreto hidráulico de f'c= 100 kg/cm2 en plantilla, por unidad de obra terminada.	1,399.10	137.40	1,261.70	26.24	
Concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2, por unidad de obra terminada.	3,314.74	240.68	3,074.06	29.36	
Concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 en losa, por unidad de obra terminada.	13,274.04	158.45	13,115.59	26.26	
Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de fy = 4200 kg/cm2 P.U.O.T	356,544.18	38,557.76	317,986.42	2,432.51	
Malla electrosoldada 6x6 10-10, P.U.O.T	2,330.47	295.35	2,035.12	63.30	
Entronques					
Terracerías					
Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto del despalme se desperdicia en el	61,394.70	15,265.86	46,128.84	1,486.00	
Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su clasificación,	848,439.10	27,316.67	821,122.43	11,623.07	
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en el cuerpo del	325,337.10	26,126.06	299,211.04	13,729.30	

