


# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela

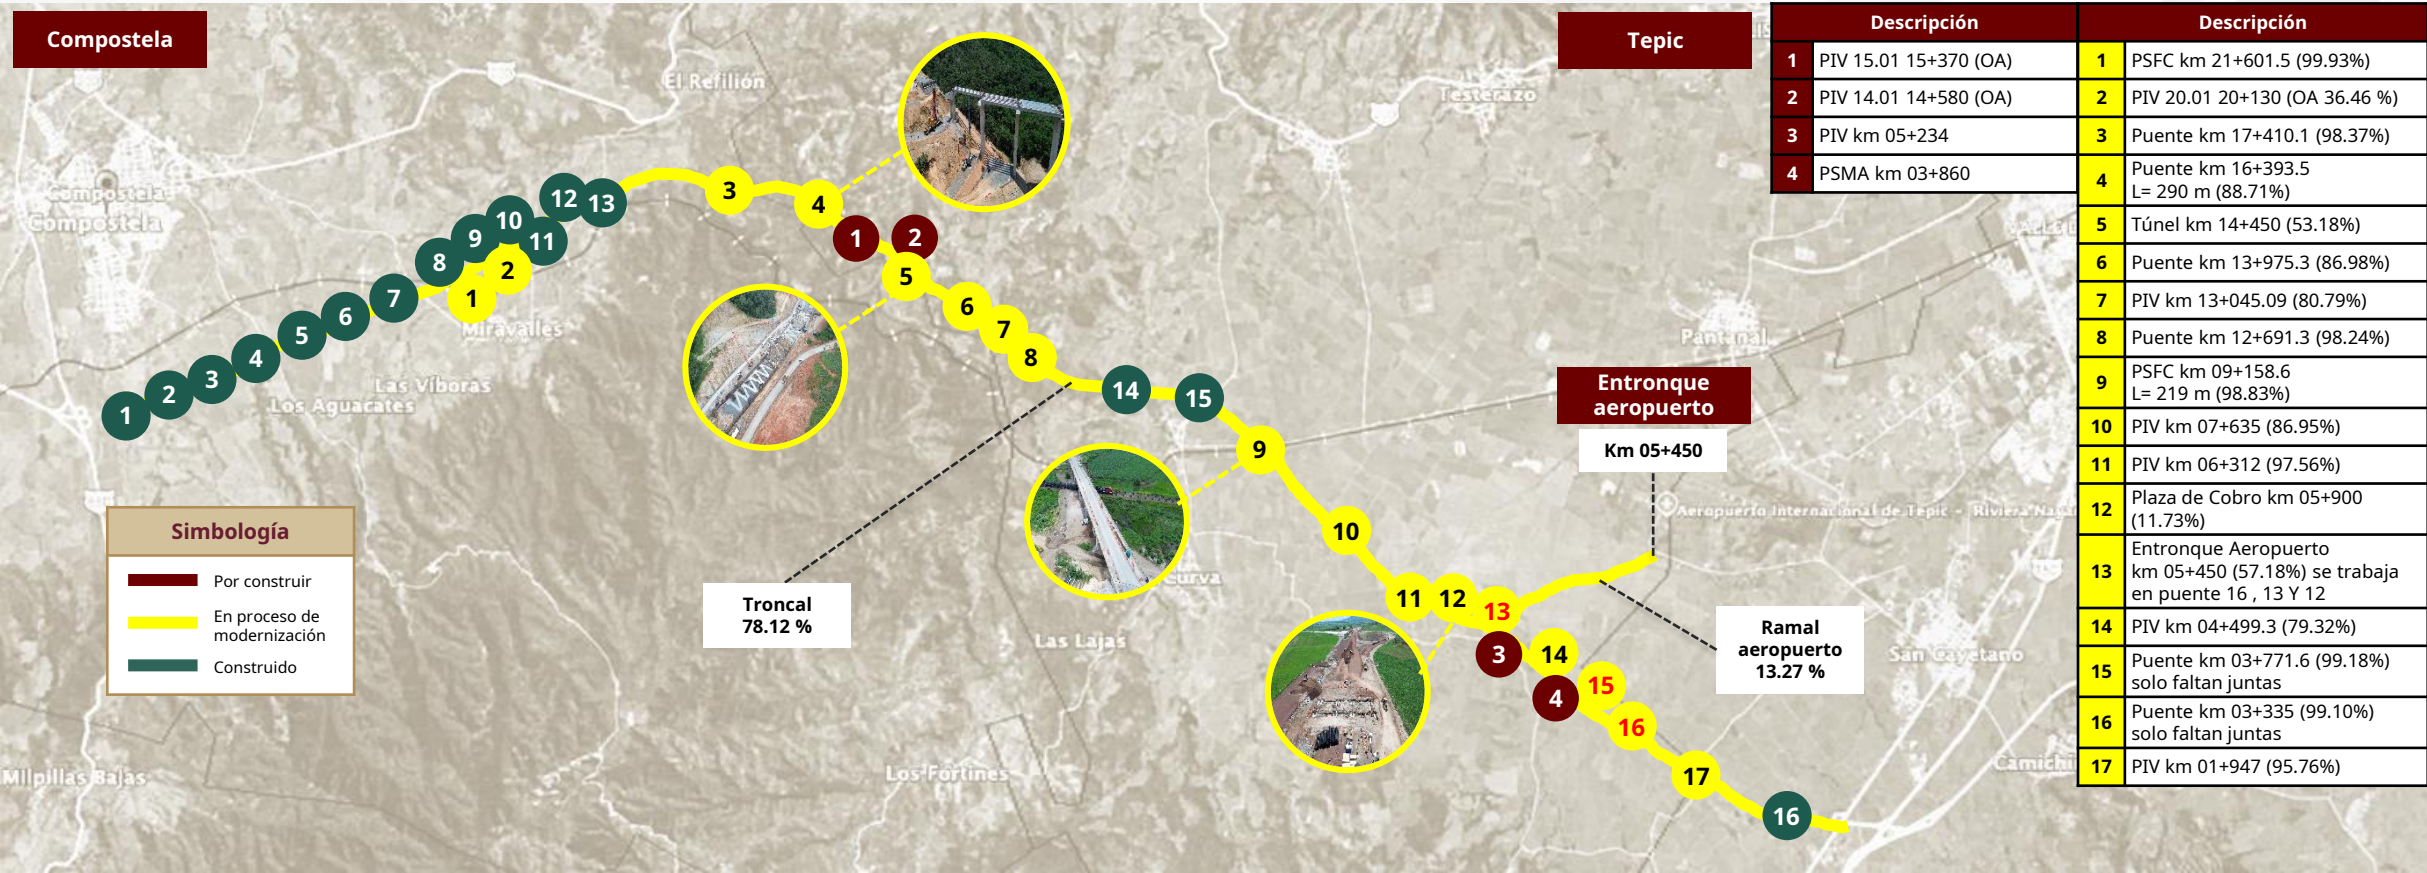

**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**

### Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 95.18 %
- Financiero: 88.28 %
- Semanal: 0.53 %

Concesionaria: FONADIN

**Inversión:** 2,473.43 mdp

- Meta:** 28 km
- 1 Plaza de cobro,
  - 10 Puentes,
  - 2 PSFC,
  - 1 Entronque (solo gazas)
  - 19 Cruces
  - Ramal Aeropuerto

**Inicio:** Marzo 2023  
**Término:** 31-Oct-2025

- 5,500** empleos generados
- 490 mil** habitantes beneficiados
- 35 minutos** de ahorro en tiempo

# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

### Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	25/07/25 al 31/07/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Puente 16.01 km 16+393.50						
Cortes (m³) Estabilizació n de taludes	2,443,497.56	2,342,772.63	100,724.93	700.00	6,800.00	
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	0.96	1.04	0.1	0.1	Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. En revisión fuerza de trabajo necesaria.

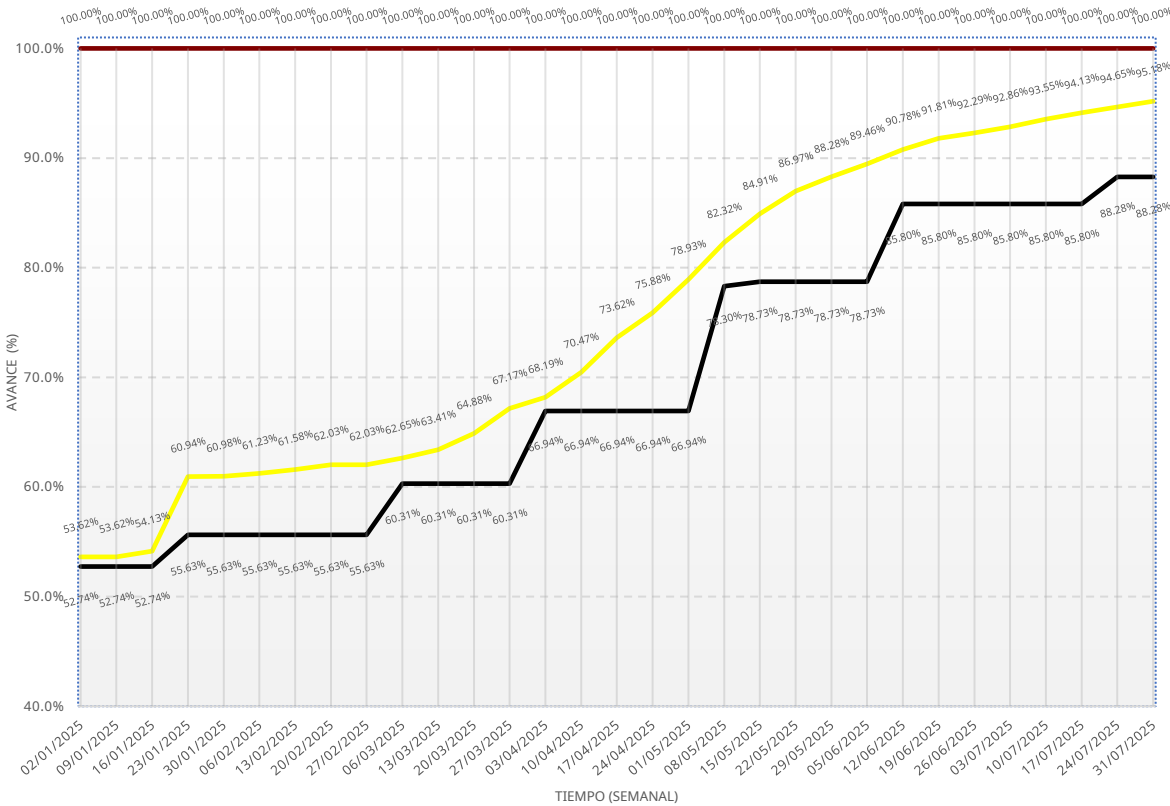

Avance Programado    Avance Físico    Avance Financiero

	18 de julio al 24 de julio	25 de julio al 31 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	480	480
Maquinaria	86	86
